



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش سالانه هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



السلام عليكم

فهرست مطالب

۳	مصوبه
۴	معرفی اعضای هیئت مدیره
۵	معرفی پالایشگاه
۹	نمای فرآیندهای پالایشگاه
۱۰	نقشه کلی پالایشگاه
۱۱	برنامه زمانبندی اولیه پروژه
۱۲	نمودار پیشرفت EPC پروژه
۱۳	نمودار پیشرفت پروژه در بخش اجرا
۱۴	گزارش وضعیت واحد تقطیر
۱۸	گزارش وضعیت واحد گاز مایع
۲۱	گزارش وضعیت واحد اینترکانکتینگ
۲۳	گزارش وضعیت ساختمان های صنعتی
۲۵	گزارش وضعیت ساختمان های غیر صنعتی
۲۷	گزارش وضعیت واحد مخازن ذخیره
۳۱	گزارش وضعیت واحد آب آتشنشانی
۳۳	گزارش وضعیت واحد فلر
۳۵	گزارش وضعیت واحد تصفیه آب ترش
۳۸	گزارش وضعیت واحد یوتیلیتی
۴۱	صورت مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مصوبه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد:

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد. هدف از تهیه این گزارش شفافیت در اطلاع رسانی و ایجاد شرایط مناسب‌تر می‌باشد که تصویری بهتر از وضعیت شرکت در همه ابعاد محترم ارائه گردد. اینک با پایان یافتن سال مالی ۱۴۰۰ گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تصویب تقدیم می‌گردد.

امضا	سمت	اعضا هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای محسن صفائی فراهانی
	نایب رئیس هیات مدیره	آقای غلامرضا صحرائیان
	مدیرعامل	آقای عبدالحمید مبصری

معرفی اعضای هیئت مدیره



غلامرضا صحرائیان

نایب رئیس هیئت مدیره

و

سهامدار




محسن صفائی فراهانی

رئیس هیئت مدیره

و

نماینده شرکت سنگ آهن مرکزی رباط

به عنوان عضو هیئت مدیره

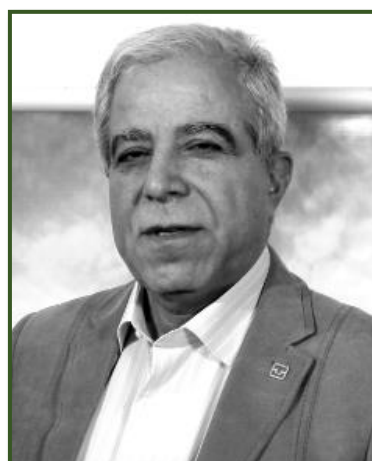

عبدالحمید مبصری



مدیر عامل

و

نماینده شرکت تناوب

به عنوان عضو هیئت مدیره


معرفی پالایشگاه

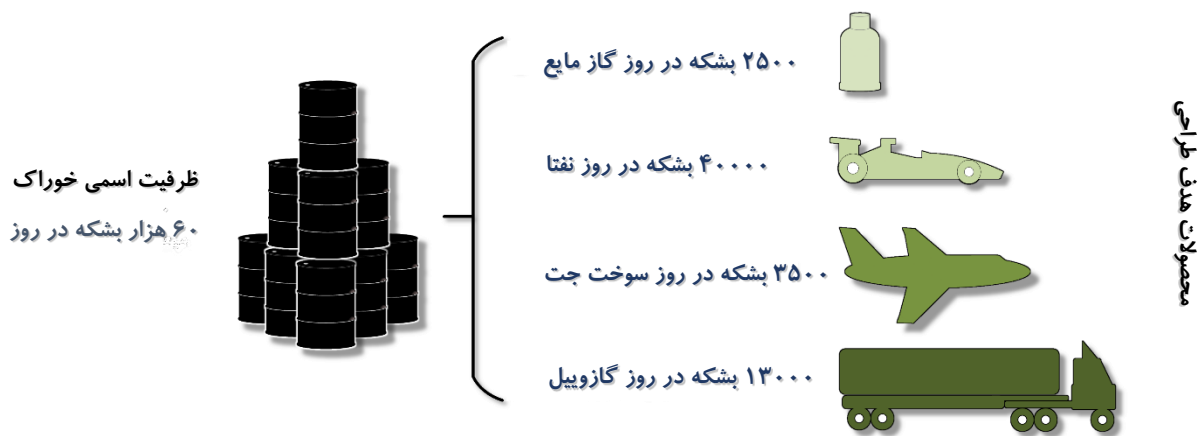

نیروگاه موتور گازی
ظرفیت مجموع ۳۰ مگاوات



ظرفیت تولید بخار
۶۰ تن در ساعت



ظرفیت دریافت آب از دریا ۸ هزار متر مکعب در روز
ظرفیت تولید آب شیرین ۱۰۰ متر مکعب در ساعت

این پالایشگاه متشکل از ۵ واحد فرآیندی، ۹ واحد یوتیلیتی و ۲ واحد آفسایت است که در زمینی به وسعت ۸۰ هکتار در منطقه آزاد پارس ۲ عسلویه واقع شده است.

۱۲ مخزن ذخیره سازی در منطقه یوتیلیتی و فرآیندی و ۱۶ مخزن ذخیره سازی در منطقه آفسایت جهت نگهداشت خوراک، محصولات میانی و نهایی پالایشگاه در نظر گرفته شده است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی، در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ به صورت شرکت سهامی خاص با هدف ساخت پالایشگاهی با ظرفیت تولید ۶۰,۰۰۰ بشکه در روز تأسیس شده است و با شماره ۴۶۵۹۵۳ در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

این طرح ابتدا در قالب طرح فراگیر پالایشی سیراف در کنار هشت پالایشگاه دیگر آغاز به کار کرد. شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف، فعالیت‌های اولیه مانند توافق اولیه برای تأمین زمین، خرید دانش فنی، انجام مهندسی پایه، تسطیح و آماده کردن زمین را در مرحله نخست و در مرحله بعد ایجاد تأسیسات یوتیلیتی نظیر تأمین آب و برق و... را به عهده داشت که پس از طی مرحله نخست هر کدام از پالایشگاه‌ها، زمین مربوط به پروژه خود را تحویل گرفتند و در همین مرحله یعنی از سال ۹۶، فعالیت‌های شرکت آدیش جنوبی برای احداث پالایشگاه آغاز شد و بعد از شروع فعالیت مهندسی تفصیلی، تلاش برای رسیدن پالایشگاه به مرحله اجرا چندین برابر شد.

در ادامه با توجه به سرعت پیشرفت پروژه، مدیران شرکت پیش بینی نمودند که در عمل شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف دیگر قادر نخواهد بود واحدهای جانبی پالایشگاه را ایجاد کند و از روی اجبار، این مجموعه از سال ۱۳۹۷ برنامه‌ریزی نمود که واحدهای جانبی را نیز خود احداث نماید. این شرکت در زمینه تأمین برق به دنبال سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه اختصاصی بود که مجوز آن از سمت سرمایه‌گذاران از وزارت نیرو دریافت شده است و خرید بخشی از تجهیزات آن انجام شده است تا در حاشیه پالایشگاه یک نیروگاه در قالب شرکتی جداگانه از پالایشگاه ساخته شود.

هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد تجهیزات اصلی پالایشگاه سفارش‌گذاری شده و پروژه پیشرفت ۷۲ درصدی داشته است و این شرکت امیدوار است در صورتی که با مشکل خاصی در ارتباط با دیگر سازمان‌ها روبه‌رو نشود، تا پایان سال ۱۴۰۱، فاز نخست خود را به بهره‌برداری برساند.

عمده فرآورده‌های تولیدی در فاز نخست، ۴۰ هزار بشکه نفتا، ۲۵۰۰ بشکه ال‌پی‌جی، ۳۵۰۰ بشکه نفت سفید و ۱۳۰۰۰ بشکه گازوئیل خواهد بود.

زمین پالایشگاه مابین فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی قرار گرفته است و از مزایای آن می‌توان دسترسی ارزان قیمت به خوراک (میعانات گازی)، معافیت ۱۰ ساله مالیات بر درآمد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و تخفیف در خوراک میعانات گازی به میزان ۵ درصد فوب خلیج فارس را نام برد.




جدول مشخصات پروژه	
تاریخ موافقت اصولی	۱۳۹۴/۰۳/۰۲ (۲۳-May-۲۰۱۵)
تحويل زمین	مرداد ماه ۱۳۹۷ (August 2018)
مبلغ مشارکت مدنی با بانک صنعت و معدن	مبلغ ۱۱.۷۹۰.۰۸۱ میلیون ریال (۳۵۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۱۰۱۲.۷۲۰/۴ میلیون ریال)
سهم الشرکه بانک	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار معادل ۷.۶۵۳.۰۰۰ میلیون ریال (۶۴.۹ درصد)
سهم الشرکه شریک	۱۰۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۸۴۵.۰۰۲/۵ میلیون ریال (نقدی) و ۱۶۷.۷۱۷/۹ میلیون ریال (غیرنقدی)
نرخ سود مشارکت مدنی	۶ درصد

جدول پیش بینی هزینه های پروژه		
وزن	مبلغ (میلیون دلار)	شرح
٪۱	۳.۷	مطالعات و فعالیتهای مقدماتی
٪۴	۱۴.۷۸	امور و تأسیسات زیربنایی
٪۸	۲۹.۵۷	لیسانس و مهندسی
٪۶۵	۲۴۰.۲۴	تدارکات و تهیه تجهیزات
٪۲۱	۷۷.۶۲	ساخت ، نصب و راه اندازی
٪۱	۳.۷	فعالیت های پیش بینی نشده
٪۱۰۰	۳۶۹.۶	جمع کل


پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی در طرح کلی شامل ۵ واحد فرآیند اصلی است. واحد تقطیر اتمسفری (CDU)، واحد تفکیک گاز مایع (LPG Recovery)، واحد تصفیه گاز مایع (LPG Treating) واحد تصفیه و تفکیک نفتا (NHT) و واحد تصفیه کروسین و گازوییل (MDH) که تصمیم گیری در خصوص احداث این واحد به پس از راه اندازی فاز نخست پروژه موکول گردیده است.

این واحدها جهت استمرار فعالیت عملیاتی خود نیاز به واحدهای پشتیبانی دیگری نظیر واحدهای آب، برق، بخار، مخازن ذخیره خوراک و محصولات و واحدهای تصفیه آب و گاز ترش داشته تا عملیات فرایندی روزانه آنها بدون وقفه ادامه یابد که به آنها واحدهای جانبی می گویند این واحدها همچنین شامل واحد آب خنک کن، واحد نیتروژن، واحد هوا، واحد تولید آب مقطر، واحد تولید هیدروژن، واحد Fire Water، پستهای برق، ساختمان چند منظوره، واحد تصفیه پساب، واحد Flare و واحد کاستیک می باشد.

نمای فرآیندهای پالایشگاه

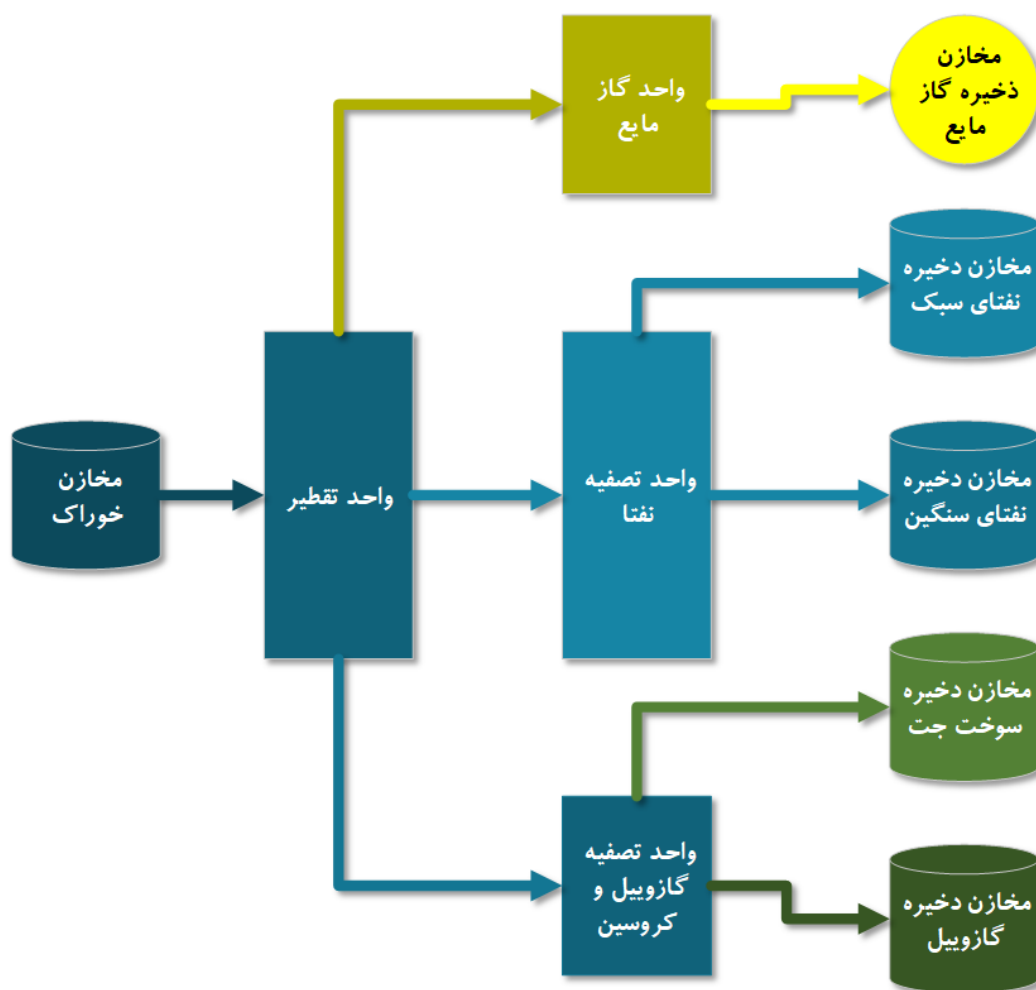

نقشه کلی پالایشگاه

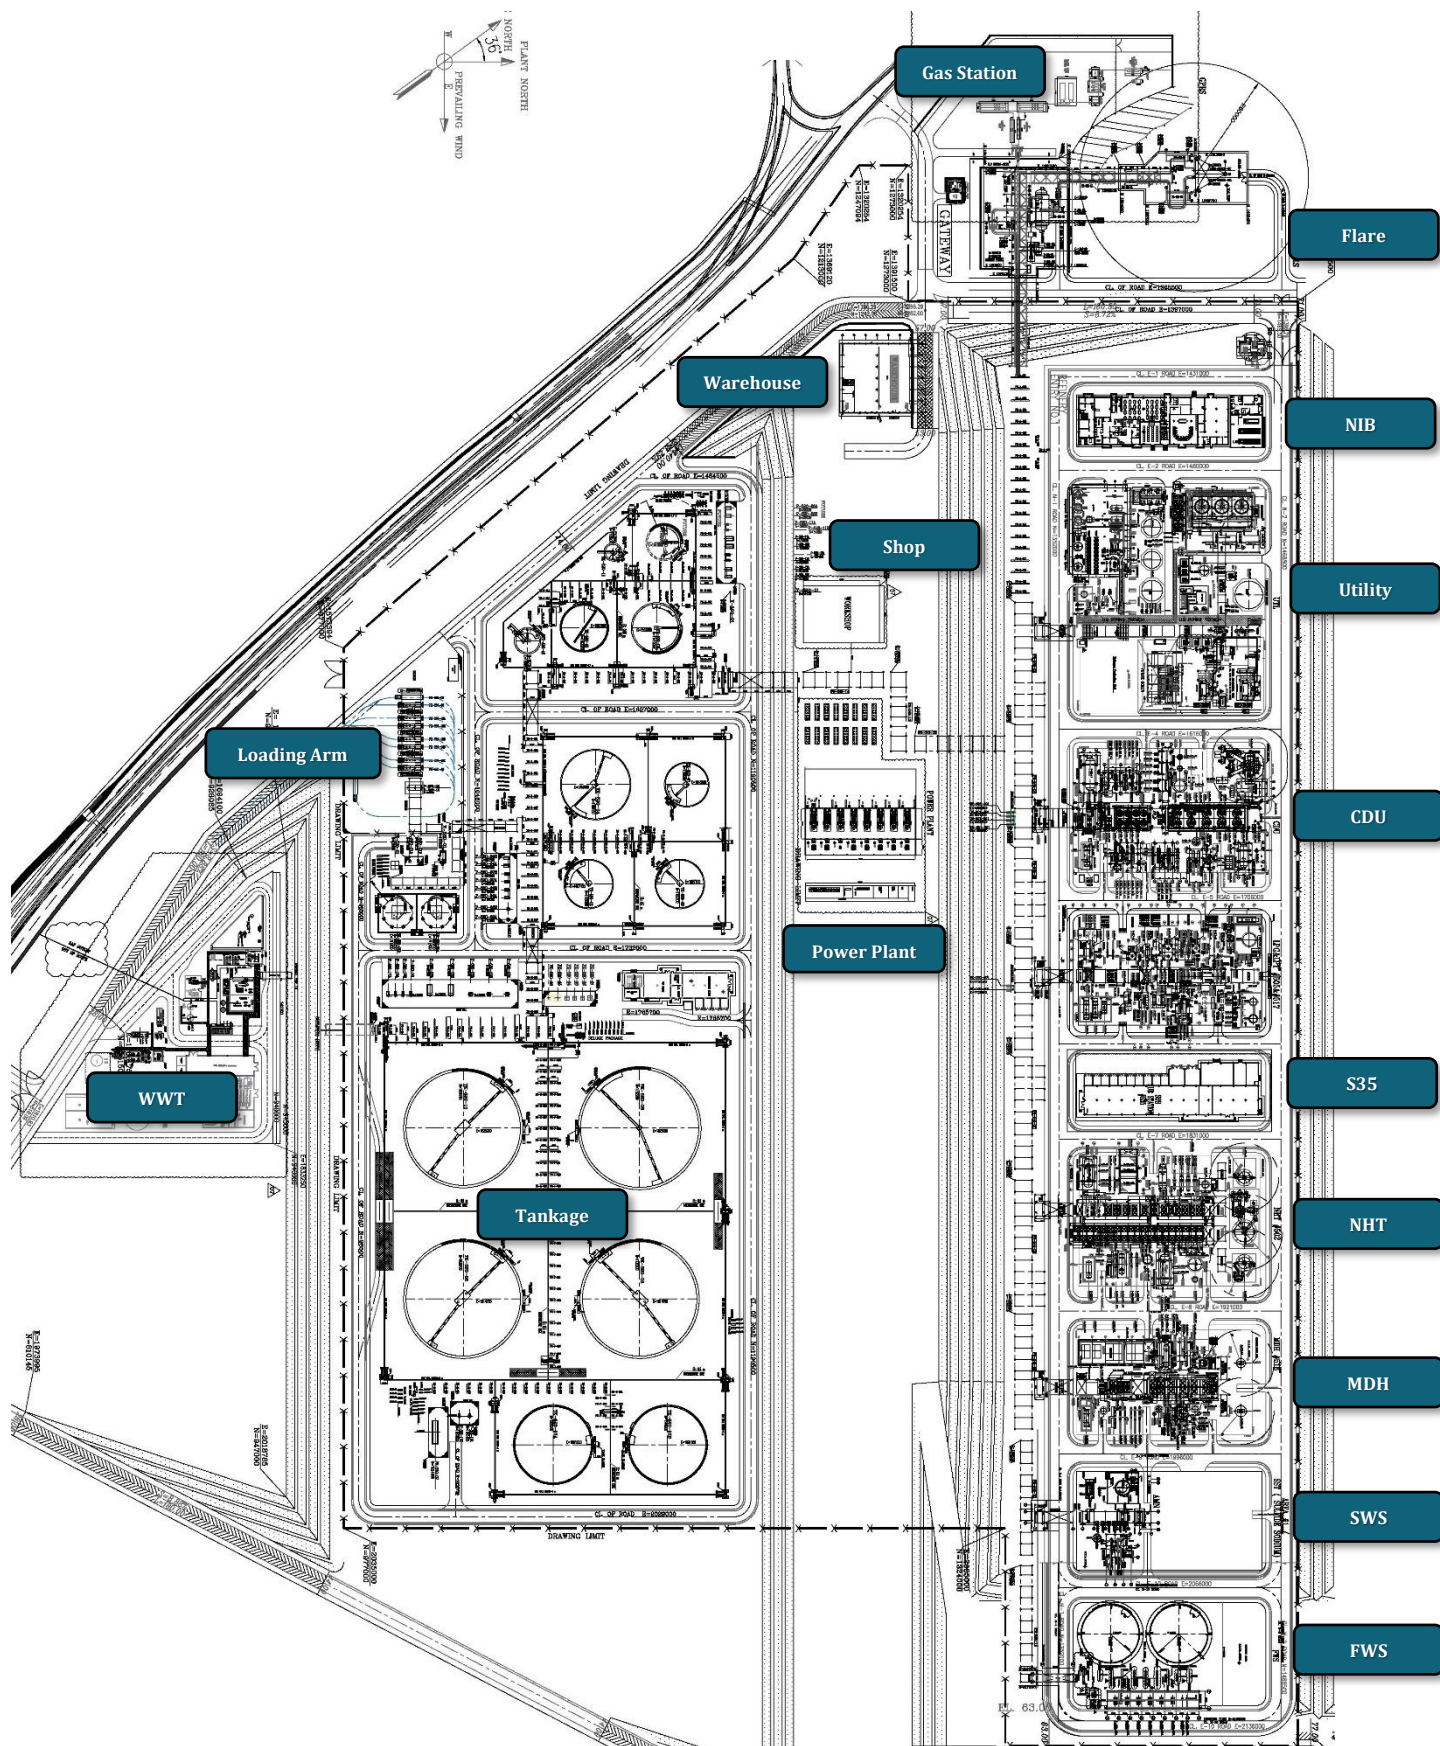


برنامه زمانبندی اولیه پروژه

ردیف	شرح	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	۱۰
۱	مطالعات مهندسی پایه	75 3 74 2 73 1	72 12 71 11 70 10 69 9 68 8 67 7 66 6 65 5 64 4 63 3 62 2 61 1	60 12 59 11 58 10 57 9 56 8 55 7 54 6 53 5 52 4 51 3 50 2 49 1	48 12 47 11 46 10 45 9 44 8 43 7 42 6 41 5 40 4 39 3 38 2 37 1	36 12 35 11 34 10 33 9 32 8 31 7 30 6 29 5 28 4 27 3 26 2 25 1	24 12 23 11 22 10 21 9 20 8 19 7 18 6 17 5 16 4 15 3 14 2 13 1	12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1	۱۰
۲	فعالیت های طراحی و مهندسی								۹
۳	ساخت، خرید و حمل ماشین آلات و تجهیزات								۸
۴	تحکیم، ستر و آماده سازی محوطه								۷
۵	اجرای عملیات سازه های مختلف								۶
۶	نصب تجهیزات و ماشین آلات								۵
۷	راه اندازی و تست سرد و گرم ماشین آلات								۴
۸	راه اندازی آذوقه ای								۳
۹	استخدام نیروی انسانی و آموزش کارکنان								۲
۱۰	پیاده برداری تجاری								۱


نمودار پیشرفت EPC پروژه

نمودار پیشرفت واقعی پروژه EPC - سال ۱۴۰۰

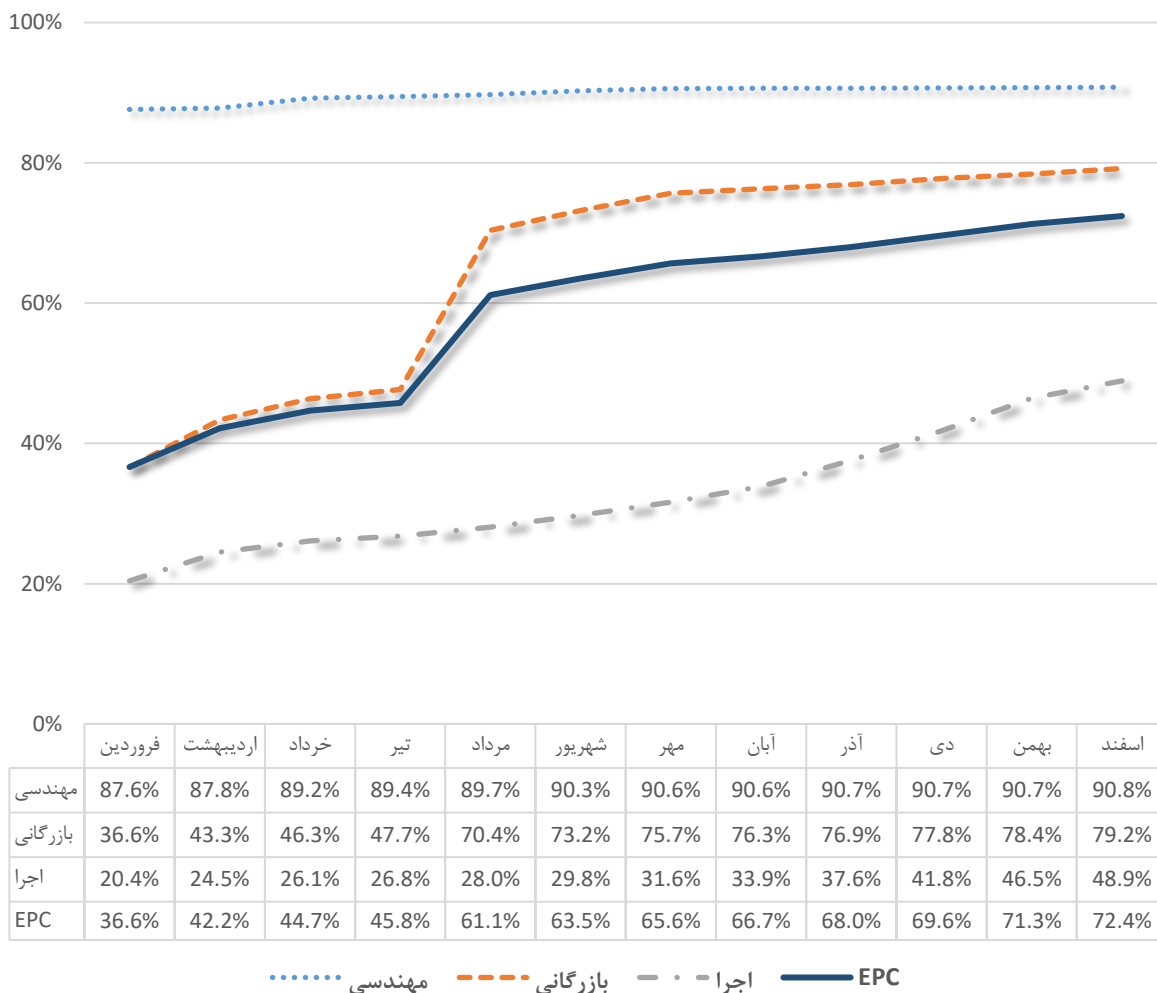

نمودار پیشرفت پروژه در بخش اجرا

نمودار پیشرفت واقعی و برنامه ای بخش اجرا - سال ۱۴۰۰

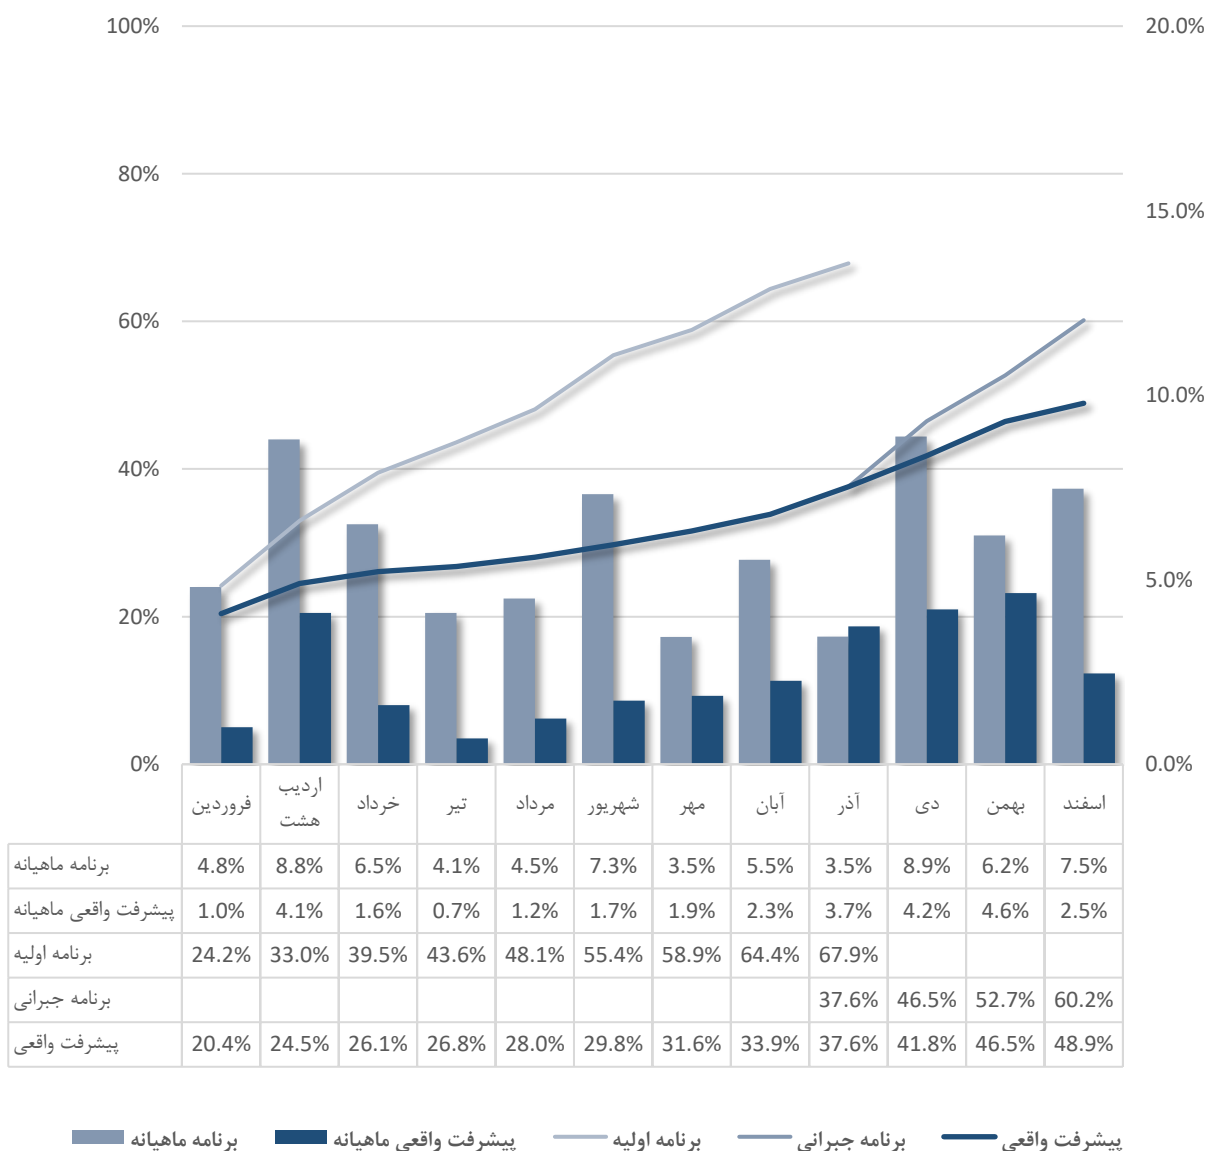

گزارش وضعیت وامد تقطیر (CDU)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریده های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریده های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال برج ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال درام ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال مبدل های حرارتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال ایرکولرها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال هیتر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج ها با پیشرفت ۸۰٪.
- تأمین و ارسال اکسسوری تجهیزات مکانیکی با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۸۵٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال شیرآلات ابزار دقیق با پیشرفت ۸۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال آنالایزرها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون عمیق تجهیزات سنگین با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۹۵٪.
- نصب مکانیکی ایرکولرها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی برج ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی درام ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی مبدل های حرارتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی و پایپینگ هیتر با پیشرفت ۱۰۰٪.

- نصب مکانیکی پمپ ها با پیشرفت ۷۸٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی با پیشرفت ۷۵٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۸۵٪.





گزارش وضعیت واحد گاز مایع (LPG/LPT/CDS)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریده های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریده های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۹۸٪.
- تأمین و ارسال برج ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال درام ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال مبدل های حرارتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۹۲٪.
- تأمین و ارسال پکیج ها با پیشرفت ۷۵٪.
- تأمین و ارسال اکسسوری تجهیزات مکانیکی با پیشرفت ۶۵٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۸۵٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال شیرآلات ابزار دقیق با پیشرفت ۶۵٪.
- تأمین و ارسال کابل های ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون عمیق تجهیزات سنگین با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۹۲٪.
- نصب مکانیکی برج ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی درام ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی مبدل های حرارتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی پمپ ها با پیشرفت ۲۵٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی با پیشرفت ۵۷٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۷۰٪.



گزارش وضعیت و امد اینترکانکتینگ (INT)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۷۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی با پیشرفت ۴۵٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۲۰٪.



گزارش وضعیت ساختمان های صنعتی (S35, S55)

مهندسی:


- نهایی شدن نقشه های فونداسیون و سازه های بتنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های معماری داخلی و خارجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تأسیسات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید ترانسفورماتورها و متریال بالک برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید سنسورها و متریال بالک ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال ترانسفورماتورها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال بالک برق و ابزار دقیق ساختمانی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال بالک برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۲۰٪.
- تأمین و ارسال سنسورها و تابلوی ابزار دقیق با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای سازه های بتنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای معماری داخلی با پیشرفت ۶۰٪.
- اجرای معماری خارجی با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمانی با پیشرفت ۳۰٪.
- اجرای تأسیسات تهویه با پیشرفت ۴۵٪.

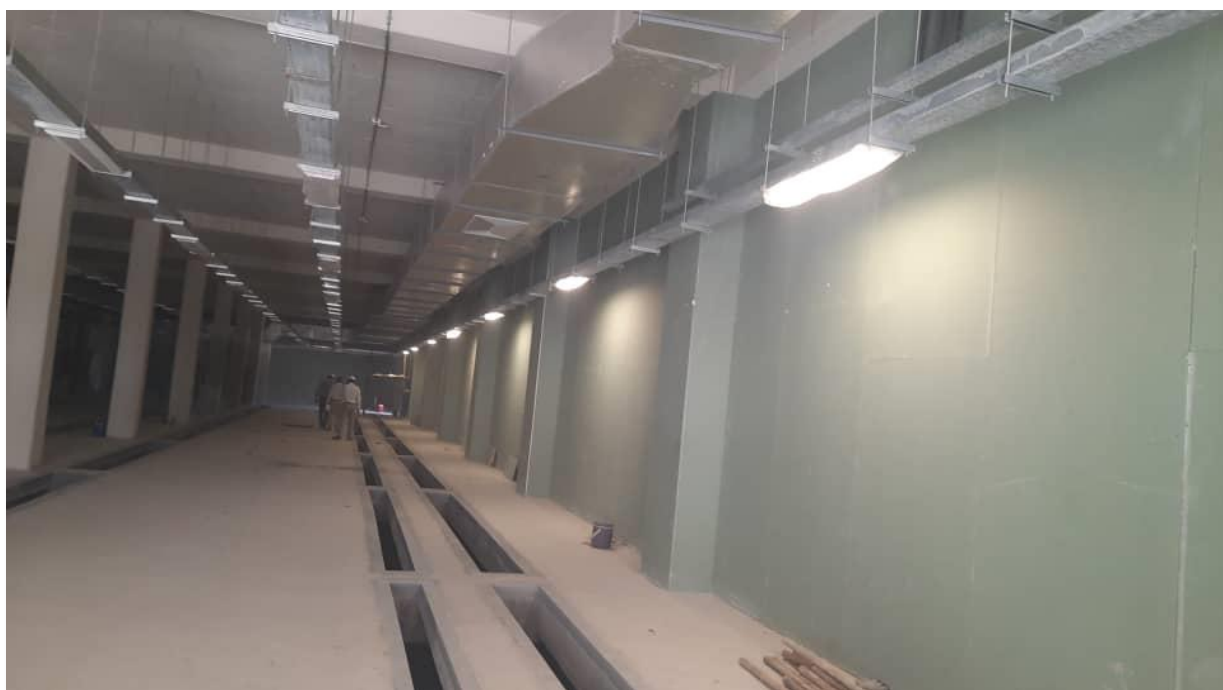

گزارش وضعیت ساختمان های غیر صنعتی

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فونداسیون و سازه های بتنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های معماری داخلی و خارجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تأسیسات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید ترانسفورماتور و متریال بالک برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید سنسورها و متریال بالک ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال ترانسفورماتور با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال بالک برق و ابزار دقیق ساختمانی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال بالک برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۲۰٪.
- تأمین و ارسال سنسورها و تابلوی ابزار دقیق با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای سازه های بتنی با پیشرفت ۹۵٪.
- اجرای معماری داخلی با پیشرفت ۲۰٪.
- اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمانی با پیشرفت ۱۵٪.



گزارش وضعیت و امد مخازن ذخیره (TNK)

مهندسی:


- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های جزئی ساخت مخازن ذخیره با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریده های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریده های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۵۵٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اسلیپر لوله ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های اسپیرو لوله ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال ورق های فولادی مورد نیاز اجرای مخازن ذخیره با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال اکسسوری مخازن با پیشرفت ۴۵٪.
- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال درام ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج ها با پیشرفت ۷۵٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۸۵٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال شیرآلات ابزار دقیق با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون مخازن با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۶۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۷۱٪.
- اجرای دیواره های بتنی با پیشرفت ۳۰٪.
- اجرای اسلپر لوله ها با پیشرفت ۲۵٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۷۰٪.
- اجرای مکانیکی مخازن خوراک با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای مکانیکی مخازن میانی با پیشرفت ۴۰٪.
- اجرای مکانیکی مخازن محصولات با پیشرفت ۵۰٪.
- اجرای مکانیکی مخازن کروی با پیشرفت ۹۲٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۴۵٪.

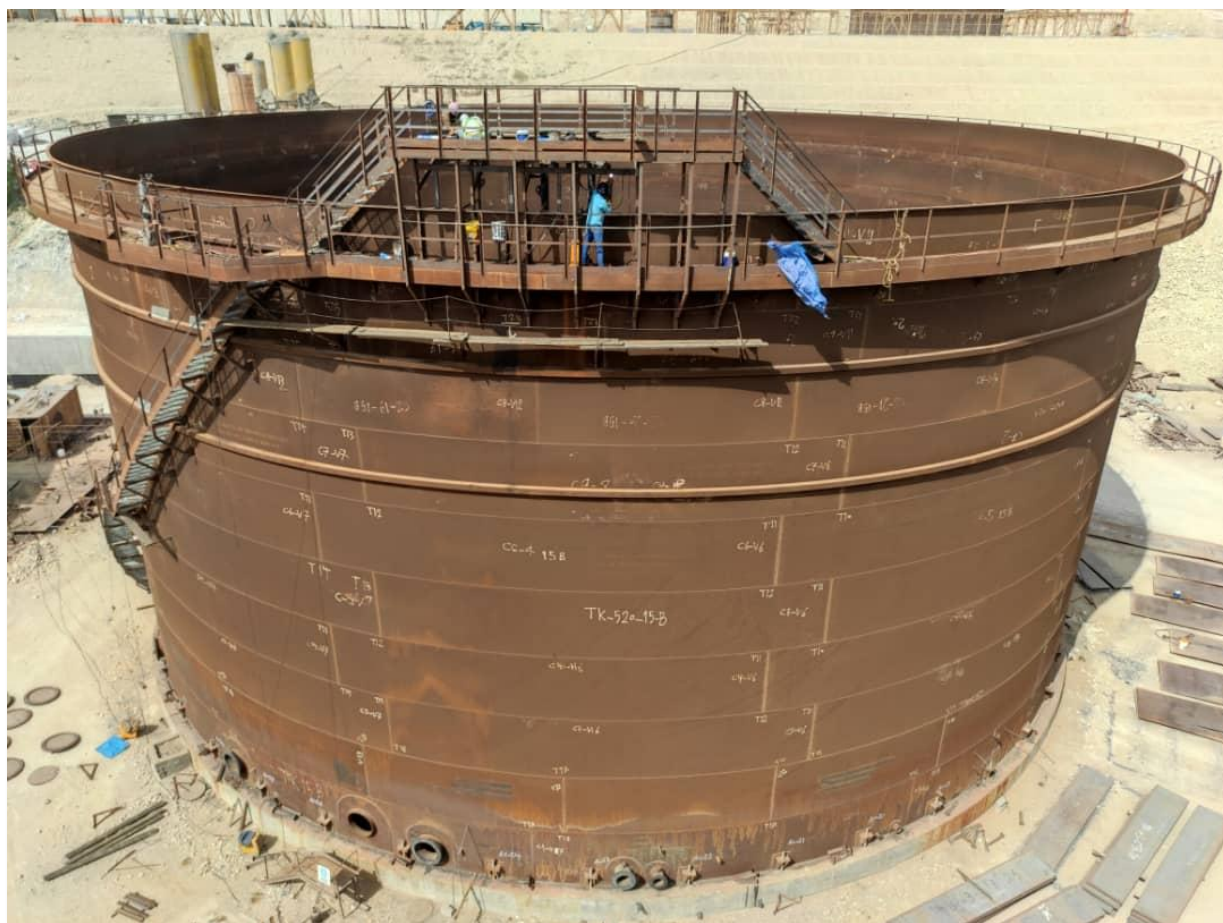



گزارش وضعیت و امد آب آتشنشانی (FWS)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریده های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پکیج تزریق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید پکیج تزریق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۹۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین ورق های فولادی و اکسسوری مخازن آب با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج تزریق با پیشرفت ۷۰٪.
- تأمین و ارسال متریا لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال متریا لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۶۵٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۲۰٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۸۵٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون عمیق تجهیزات سنگین با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۳۵٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۲۵٪.
- اجرای مکانیکی مخازن آب آتشنشانی با پیشرفت ۹۶٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۳۰٪.



گزارش وضعیت واحد فلر (FLS)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریده های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های استک فلر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید استک فلر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۸۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۸۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال تجهیزات استک فلر با پیشرفت ۷۵٪.
- تأمین و ارسال سازه های فلزی استک فلر با پیشرفت ۸۰٪.
- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال درام ها با پیشرفت ۷۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۶۵٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۲۰٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۸۵٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون عمیق تجهیزات سنگین با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۲۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۸۸٪.



گزارش وضعیت واحد تصفیه آب ترش (SWS)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۷۵٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۸۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۸۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۷۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۷۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال برج ها به سایت با پیشرفت ۵۵٪.
- تأمین و ارسال درام ها به سایت با پیشرفت ۷۵٪.
- تأمین و ارسال مبدل های حرارتی با پیشرفت ۶۰٪.
- تأمین و ارسال ایرکولرها با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج ها با پیشرفت ۷۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۸۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۶۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۲۵٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۸۵٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون عمیق تجهیزات سنگین با پیشرفت ۸۵٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۲۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۸۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۵۰٪.
- اجرای مکانیکی مخزن ذخیره آب با پیشرفت ۵۵٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰٪.





گزارش وضعیت وامد یوتیلیتی (UTL)

مهندسی :

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریده های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریده های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۹۵٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۹۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه بتنی برج خنک کاری با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۹۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۷۵٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۸۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۷۵٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۵۵٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۵۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۸۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۷۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۷۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال ورق های فولادی و اکسسوری های مخازن یوتیلیتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات مربوط به برج خنک کاری آب با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۶۵٪.
- تأمین و ارسال درام ها به سایت با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال مبدل های حرارتی با پیشرفت ۴۵٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۶۵٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات پکیج بویلر با پیشرفت ۳۵٪.
- تأمین و ارسال پکیج های تزریق با پیشرفت ۶۵٪.
- تأمین و ارسال پکیج تصفیه آب با پیشرفت ۴۵٪.
- تأمین و ارسال پکیج روغن زدای آب با پیشرفت ۴۵٪.
- تأمین و ارسال پکیج تولید هوای فشرده با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج نیتروژن مایع با پیشرفت ۶۵٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۶۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۴۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۲۰٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۸۵٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون مخازن ذخیره با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون پکیج بویلر با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای فونداسیون پکیج هوا با پیشرفت ۹۵٪.
- اجرای فونداسیون پکیج نیتروژن با پیشرفت ۸۰٪.
- اجرای سازه بتنی برج خنک کاری با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۴۵٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۲۵٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۸۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۳۰٪.

- اجرای مکانیکی مخازن یوتیلیتی با پیشرفت ۸۵٪.
- نصب مکانیکی درام ها با پیشرفت ۶۵٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۴۰٪.



صورت وضعیت مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
۱۷,۶۳۳,۰۴۸,۵۴۲,۶۵۱	۶۱,۲۹۲,۵۱۲,۸۸۲,۷۸۳	۵	دارایی‌های ثابت مشهود و در جریان تکمیل
۳۳,۰۱۷,۰۹۸,۰۹۷	۳۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷۶	۶	دارایی‌های نامشهود
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۷,۸۲۶,۰۶۵,۶۴۰,۷۴۸	۶۱,۴۸۵,۷۳۱,۷۷۴,۵۵۹		جمع دارایی‌های غیر جاری
دارایی‌های جاری			
۳۰,۴۷۹,۱۵۲,۲۵۴	۱۱,۸۹۳,۵۳۳,۹۷۲	۸	پیش پرداخت‌ها
۴,۴۹۲,۸۵۷,۴۸۰,۳۶۴	۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۵۴,۹۶۹,۸۹۲,۲۳۷	۳۲۱,۷۵۶,۵۹۷,۶۲۴	۱۰	موجودی نقد
۴,۶۷۸,۳۰۶,۵۲۴,۸۵۵	۹۴۲,۴۵۸,۹۲۷,۵۱۸		جمع دارایی‌های جاری
۲۲,۵۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳	۶۲,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷		جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	سرمایه
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع حقوق مالکانه
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲	۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴	۱۲	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت
۱۴,۷۴۹,۸۶۱,۷۵۵,۶۷۱	۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۱۱۴,۱۲۴	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۶,۷۴۰,۳۴۴,۶۷۲,۰۰۳	۴۸,۰۴۰,۲۸۴,۸۶۵,۷۶۸		جمع بدهی‌های غیر جاری
بدهی‌های جاری			
۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰	۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختنی
۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰	۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹		جمع بدهی‌های جاری
۱۷,۸۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳	۵۴,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷		جمع بدهی‌ها
۲۲,۵۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳	۶۲,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان پایور، پلاک ۱۹

۰۲۱-۲۶۲۹۴۰۷۱

