



SOUTHERN ADISH
GAS CONDENSATE REFINERY

برنامه زمانبندی فعالیتهای باقیمانده پروژه جهت
تصویب طی پوپک ۹۹۸۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ به
واحد برنامه ریزی دفتر مرکزی ارسال گردید

GAS

WATER

POWER

CALIBRATION OF TFM-600

PHASE 1 WEEKLY REPORT BASED ON MONTHLY ACTION PLAN

CUT OFF DATE: 1404/02/31

REPORT NO: 139

نیروی انسانی:



پیمانکاران			
تعداد کل	افسر ایمنی موجود	افسر ایمنی مورد نیاز	کمبود افسر ایمنی
۳۵۴	۶	۱۷	۱۱

آدیش			
تعداد کل	افسر ایمنی موجود	افسر ایمنی مورد نیاز	کمبود افسر ایمنی
۹۶	۲	۴	۲

اهم فعالیت های انجام شده طی هفته :

- صدور ۵۶۸ پرمیت (۵۶۰ پرمیت CONSTRUCTION و ۸ پرمیت راه اندازی)
- گاز سنجی روزانه یونیت های پیش راه اندازی و فضای بسته
- کشیدن نوار خطر در مناطق پر ریسک
- نصب و حفاظ و گارد کشی اطراف حفاری ها
- برگزاری کلاسهای آموزش
- الزام جمع آوری و تمیز کاری ضایعات و متریال بعد از کار پیمانکاران توسط نیروهای پیمانکار
- بازدید دوره ای از موقعیت های کاری پیمانکاران ، چک کردن پرمیتها
- تایید پرمیت های کاری به صورت روزانه بعد از بازرسی محل انجام عملیات
- پیگیری جهت ادامه تمیزکاری یونیت یوتیلیتی
- جمع آوری ضایعات و پسماندهای پشم شیشه های LPG
- پیگیری آبپاشی روزانه سایت

شماره صفحه	عنوان
2	نیروی انسانی پیمانکاران (مستقیم و غیر مستقیم)
3	HSE REPORT
4	اهم موانع و مشکلات پروژه (CONCERNS)
5	اهم کسری متریا
6	پیشرفت پروژه در یک نگاه
7	اکشن پلن - وضعیت پیشرفت اکشن پلن ماهیانه در یک نگاه
8	اکشن پلن - جدول و برنامه راه اندازی (BOXUP)
9	اکشن پلن - جدول و برنامه راه اندازی (FINAL ALIGNMENT)
10	اکشن پلن - جدول کلی و برنامه رفع بانچ
11	اکشن پلن - یونیت FWS-RI
12	اکشن پلن - یونیت GPRS
13	اکشن پلن - یونیت PGU
14	اکشن پلن - یونیت CWS
15	اکشن پلن - یونیت CAS
16	اکشن پلن - یونیت NIS
17	اکشن پلن - یونیت WSU
18	اکشن پلن - یونیت FGS
19	اکشن پلن - یونیت SPU
20	اکشن پلن - یونیت FLS
21	اکشن پلن - یونیت CDU
22	اکشن پلن - یونیت LPGT
23	اکشن پلن - یونیت SWS
24	اکشن پلن - یونیت INT
25	اکشن پلن - یونیت TNK
26	اکشن پلن - یونیت S-35
27	اکشن پلن - یونیت S-55
28	اکشن پلن - یونیت WWT
29	اکشن پلن - یونیت ROU
30	اکشن پلن - یونیت OFFSITE
31	اکشن پلن - یونیت NHT
32	اکشن پلن - سیویل و سایر فعالیت های باقیمانده
33	اکشن پلن - فعالیت های باقیمانده برق
35	اکشن پلن - فعالیت های باقیمانده ابزار دقیق
37	اکشن پلن - فعالیت های پایپینگ AG
38	اکشن پلن - گزارش ICAPS

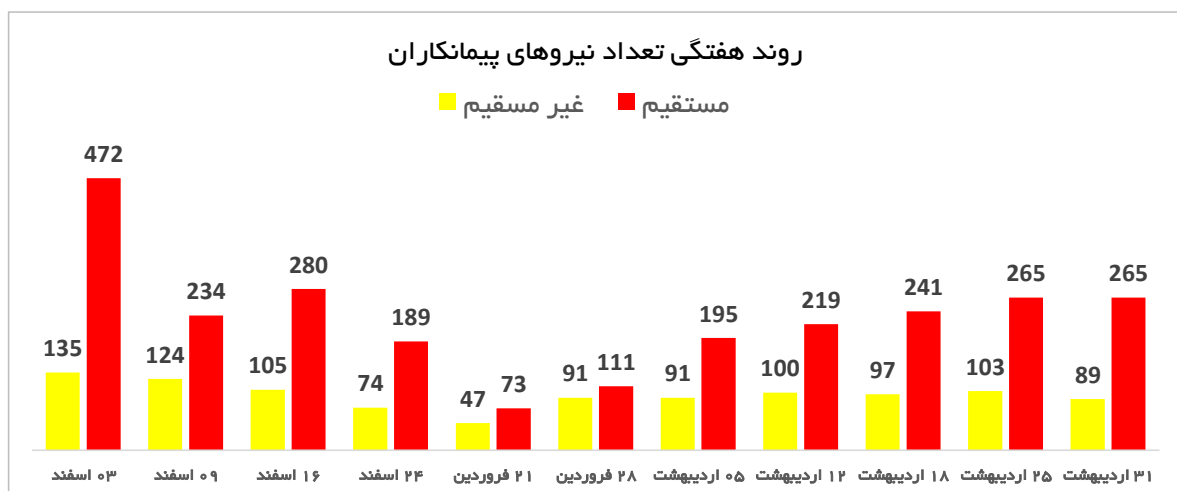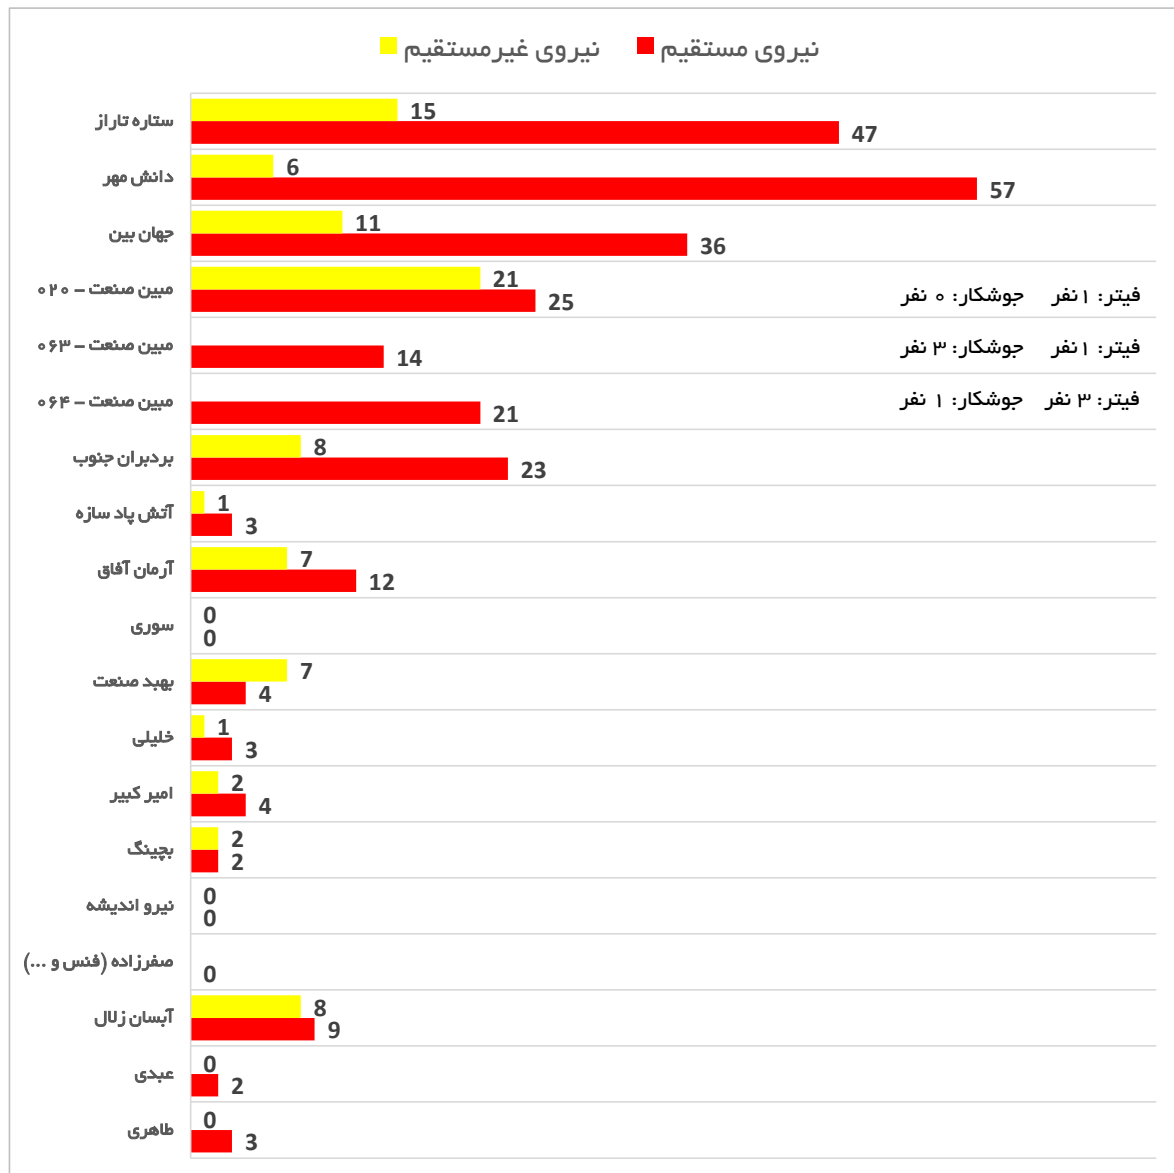

مشکلات قراردادی :

- فراخواندن وندور ایران تابلو برای برطرف کردن پانچ های S35
- شناسایی پیمانکار HVAC جهت تکمیل عملیات باقیمانده در ساختمان NIB و ساب 35 و 55
- تعیین و تکلیف قرارداد (یا دستورکار) سیل نمودن فونداسیون مخازن ناحیه TNK
- شناسایی و استقرار پیمانکار بخش پایپینگ راه اندازی جهت LEAK TEST و GROSS TEST و SERVICE TEST و ...
- تعیین تکلیف نیتروژن پرزینگ خطوط
- تعیین و تکلیف مسائل قراردادی و مالی پیمانکار آلام صنعت (ساخت باقیمانده گریپینگ دیچ ها)
- انتخاب پیمانکار جهت اجرای کابل کشی خط آب شیرین کن
- انتخاب پیمانکار جهت اجرای شبکه ساختمان NIB
- تعیین تکلیف تحویل موقت / قطعی قرارداد 006 پیمانکار ستاره نفت سپاهان (در انتظار تصمیمات دفتر مرکزی)
- تعیین تکلیف تحویل موقت قراردادهای 10 و 16 پیمانکار بهید صنعت (در انتظار تصمیمات دفتر مرکزی)
- تعیین تکلیف تحویل موقت قرارداد 50 پیمانکار بهید صنعت (طی نامه 2556 مورخ 1403/10/19 از سایت به دفتر مرکزی ارسال گردید)
- تعیین تکلیف تحویل قطعی قرارداد 35 پیمانکار جهان بین (در انتظار دریافت اسناد تکمیلی از پیمانکار و سپری شدن دوره یک ساله)
- تعیین تکلیف تحویل قطعی قرارداد 42 پیمانکار جهان بین (در انتظار تکمیل فرم ترک ادعا از طرف پیمانکار)
- تعیین تکلیف تحویل موقت قرارداد 46 پیمانکار جهان بین (در انتظار امضاء باکس مدیران ارشد)
- تعیین و تکلیف تحویل موقت قرارداد 41 پیمانکار پایا صنعت (در انتظار امضاء باکس مدیران ارشد)
- تعیین و تکلیف تحویل موقت قرارداد 39 پیمانکار پایا صنعت (به دفتر مرکزی ارسال شده است)
- تعیین و تکلیف تحویل موقت قرارداد 59 ، 61 ، 74 پیمانکار پایا صنعت (درخواست تحویل موقت به دفتر تهران ارسال شده است)
- تعیین و تکلیف تحویل قطعی پیمانکار چشمه ساران کلار (تحویل موقت در تیر ماه سال 1403 به دفتر مرکزی ارسال شده است)

اسناد فنی (مهندسی) :

- لزوم نهایی نمودن نقشه دیچ و دیوار حائل گیت شماره 2 (ورودی باسکول دائمی) - (مهندس صفری و مهندس گودرزی)
- لزوم نهایی نمودن نقشه های بل کانال TS-5 (ورودی گیت اصلی) - (مهندس صفری)
- لزوم ابلاغ نقشه های دیچ حداقل ساختمان نگهبانی تا کانال TS-5 - (مهندس صفری)
- ابلاغ نقشه سببیک در ساختمان ساختمان آب شیرین کن - (مهندس شاهانی)
- تعیین تکلیف طرح سیویل ورودی کارگاه عمران ساحل (کالورت یا ...) جهت اجرای خط لوله آب شیرین کن - (مهندس گودرزی)
- طراحی باقیمانده مسیر خط صادرات از انتهای کالورت 04 تا اسکله (دریافت دفترچه جواب گمانه زنی از آزمایشگاه اداره راه) - (مهندس گودرزی)
- تعیین و تکلیف لزوم انجام دوباره کاری های TRAY های V-501-01 و V-501-04 - (مهندس صفری / مهندس دهقانی)
- تعیین نقاط کانکشن تجهیزات ابزار دقیق بر روی کمپرسورهای واحد CAS (وندور هتکو) - - (مهندس شاهانی / مهندس توکی)
- عدم وجود برخی نقاط کانکشن نصب تجهیزات ابزار دقیق (مهندس شاهانی)

متریال (اهم کسری متریال یونیت UTL بدون احتساب کولینگ تاور)

- تامین نیتروژن جهت پرز نیتروژن مخازن گروی B , TK-530-01A (مقرر گردید جهان بین تامین و پرز را انجام دهد)
- کسری پنل سیستم F&G در اتاق کنترل ایستگاه گاز - 1402/05/21 (SACR-DE-GEN-IN-MRQ-5708)
- کسری تجهیزات PLC پنل کنترل HVAC ساختمان NIB- 1403/12/06 (E-REQ-IN-0012)
- کسری کابل ارت - 1403/05/07 (E-REQ-EL-0022)
- کسری تجهیزات ابزار دقیق - 1403/09/14 (SACR-AD-INT-93334) / صورتجلسه با هتکو مورخ 1403/12/05
- کسری بولت تجهیزات ابزار دقیق - در حال بررسی امکان جایگزینی - 1403/09/24 (SACR-AD-INT-95246)
- کسری مدرک MUCP و پنل های PDP-PK-522-21A, PK-522-21B-IPK-522-21B- 1403/07/28 (SACR-DE-GEN-EL-MRQ-5624)
- کسری مدرک وندور هتکو جهت نصب تجهیزات ابزار دقیق - 1404/02/05 (SACR-AD-INT-96694)
- تامین LCS مربوط به IP-521-02 - 1403/12/23 (E-REQ-EL-0028)
- کسری متریال HOOKUP - تیوب و فیتینگ - 1403/11/01 (E-REQ-IN-0010)
- کسری متریال جهت ساخت نشیمنگاه های سایلنسر های PR-522-01 یونیت UTL - 1403/12/03 (SACR-AD-INT-97822)
- کسری متریال استراکچر توربو آکسپندر - شلتر CB-561-01-T01 در یونیت UTL - 1403/09/11 (SACR-AD-INT-97022)
- کسری متریال جهت اصلاحات استراکچر های بویلر های A و B - 1403/12/21 (SACR-AD-INT-98539)
- تامین ساپورت SRT - 1402/09/09 (SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5564)
- کسری متریال استراکچر 07 & SH-522-06 - 1403/09/25 (SACR-AD-INT-95491)
- تامین فول کولینگ جهت اتصال کوئیک کولینگ های خط هوا ، آب و بخار به هدر اصلی - 1403/09/12 (SRQ-PI-0253-AG)
- تامین لوله ALLOYED - 1403/05/24 (SRQ-PI-0297-AG / PI-0162-AG)
- تامین اریفیس پلیت - 1403/10/11 (SACR-AD-INT-95985)
- کسری فیلتر المنت - 1403/08/22 (SACR-AD-INT-99548)
- تامین سمبل کانکشن ها - 1403/04/09 (SACR-AD-INT-95220)
- کسری ولو 28 اینچ مربوط به هات تپ شماره 2 خط خوراک (درخواست از سمت سایت صادر نشده)

سایر موارد

- لزوم تعیین و تکلیف استخدام نیروی حراست و اپراتور برای نیروگاه
- لزوم تعیین و تکلیف استخدام نیروی اپراتور برای ساب 35

اهم کسری متريال على الخصوص در بخش رفع پانچ

شماره درخواست يا پوپک متريال درخواستى
در قالب فايل اکسل در پوپک مربوط به


ضروريست تاريخ تهيه متريال
به سايت اعلام گردد

#	شرح	UOM	GPRS	PGU	CWS	CAS	NIS	WSU	FGS	SPU	FLS	CDU	SWS	LPGT CDS	INT	TNK	WWT	S35	S55	NIB	WSH	ONT	NHT	ALL	ETA
1	FLEXIBLE HOSE	NO			5		1	6	1	10		2		2		3	2						2	34	-
2	استراکچر	KG		350	1200		300			2100				1200	12900	1350	150				350	2300		22200	-
3	COUPLING	NO			N	N			N	N	N	N	2	N		N								320	-
4	استيم ترپ	NO																						13	-
5	SRT ساپورت	NO			16					6														22	-
6	AG ولوهاى	NO	1				1		1	4			1	2										10	-
7	UG ولو هاى	NO															2					2	2	6	-
8	فيلتر المنت	NO							8				2	11										21	-
9	BASKET FILTER	NO												1										1	-
10	COALESCER FILTER	NO												1										1	-
11	ACTIVATED CARBON	M3											0.5											0.5	-
12	GASKET	NO							2					3	3									8	-
13	ALUMINA BALL	M3												0.1										0.1	-
14	سمپل کانکشن	NO							N	1	2	6	N	28		N								37+N	-
15	FLEXIBLE JOINT	NO								8														8	-
16	استرينر	NO											2											2	-
17	اوريفيس	NO					1						1			1							1	3	-
18	وينچ	NO									1													1	-
19	لوله ALLOYED	M			N	N	N	N	N	N	N	N												7.6	-
20	لوله پايپينگ 30"	M																				577		577	-
21	لوله پايپينگ 28"	M																				698		698	-
22	لوله پايپينگ 8"	M																				692		692	-
23	سايد گلس	NO										23	N	17										40+N	-
24	FLAME ARRESTER	NO											1			1								2	-
25	گريس نيپل	-												N		N								N	-
26	CALIBRATION POT	NO														1								1	-
27	کسرى هاى پکيج PK-520-07	SET														1 SET								1	-
28	رزين هاى پوليشينگ	-																							-
29	تعميرات هافسل هاى مخازن	NO														2								2	-
30	TUBE	M																						1311	-
31	FITTING HOOKUP	NO																						1952	-
32	تجهيز ابزار دقيق و آناليزر	NO	6		10	18	8	2	1	19	2	13	11	20		6								116	1404/07/01
33	تجهيزات ريچکى	NO				2	1	9	3	1		4		17		3								40	-
34	کابل ارت	M																						35530	-
35	LCS	NO		1																				1	-
36	کابل هيترسينگ	M											N	N	N	N								3000	-
37	پنل هيتر ترپسينگ	NO												1	4	3								8	-
38	پنل برق	NO																3	3					6	-
39	پنل ابزار دقيق	NO		1				1								1	3	2	1	5		1	2	17	-
40	پنل تلکام	NO																4	1	1				6	-
41	ژنراتور	NO															1	1	1	1				4	-
42	ابزار دقيق JB	NO		1						2														3	-
43	POWER SUPPLY 110DC	NO																1						1	-
44	هدپوشن	NO																						2750	-
45	تجهيزات PLC پنل كنترل HVAC	NO																		24				24	-
46	کابل سکندرى ابزار دقيق	M														14000								14000	-
47	متریال برق و روشنایی ساختمانها S65, آب شيرين کن, حراست,	-																						-	-
48	پنل هاى PDP PK-522-21B PK-522-21A	NO			2																			2	-

محاسبات پیشرفت فاز یک

منحنی پیشرفت / پیشرفت به تفکیک یونیت ها / پیشرفت به تفکیک دیسیپلین ها

- منحنی پیشرفت - فاز یک

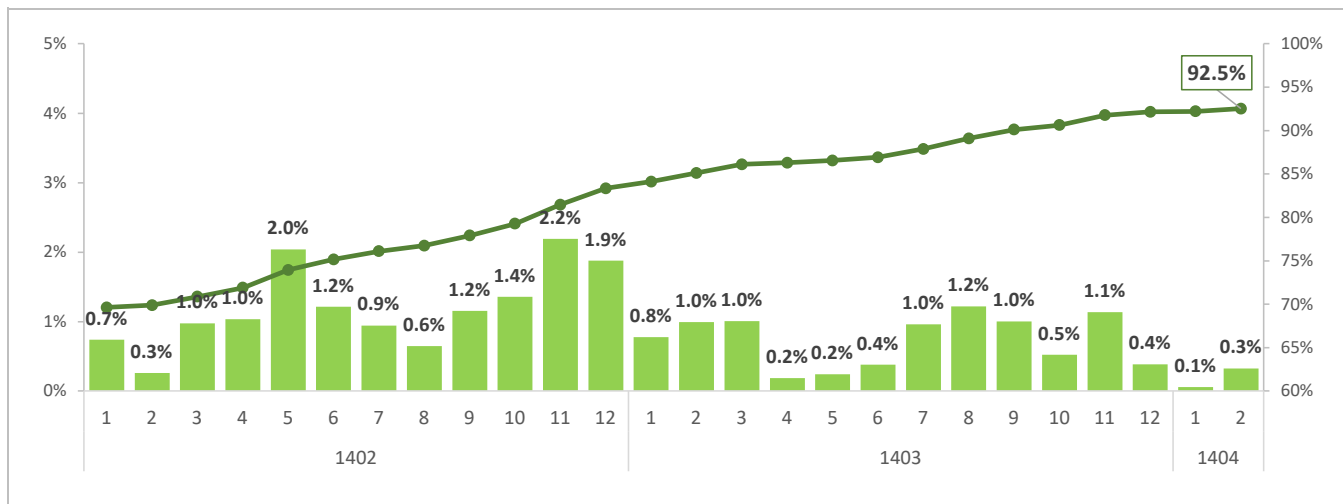

- پیشرفت فاز 1 - به تفکیک یونیت ها

یونیت	توضیحات	درصد وزنی	پیشرفت
CDU	CONDENSATE DISTILLATION	10.3%	98%
LPG	LIQUIFY PETROLEUM GAS	6.9%	97%
TNK	TANK FARM	26.0%	97%
INT	INTERCONNECTING	14.7%	90%
FWS	FIRE WATER	2.1%	97%
UTL	UTILITY	7.7%	99%
WWT	WASTE WATER TREATMENT	0.9%	81%
FLS	FLARE SYSTEM	2.6%	97%
SWS	SOUR WATER STRIPPER	2.3%	97%
PGU	POWER GENERATOR	1.7%	98%
GPR	GAS PRODUCTION	0.9%	98%
ROU	DESALINATION	1.0%	60.7%
EXP	EXPORT LINE	2.2%	23.4%
FLU	FEED LINE	0.4%	85.8%
S35	SUBSTATION 35	2.4%	95%
S55	SUBSTATION 55	0.9%	89%
NIB	NON INDUSTRIAL BLD	4.8%	98%
OIB	OTHER BUILDING	1.8%	93%
PCM	PRECOMMISSIONING	1.0%	34%
COM	COMMISSIONING	1.0%	11%
PLF	PUNCH LIST FIXING	0.2%	82.9%
SP/MO	SITE PREPARATION	8.2%	100%

- پیشرفت فاز 1 - به تفکیک دیسیپلین ها

دیسیپلین	توضیحات	درصد وزنی	پیشرفت
CV / AR	CIVIL	28.5%	93%
ST	STRUCTURE	4.4%	99%
ME	MECHANICAL	5.5%	97%
EL	ELECTRICAL	6%	88%
IN	INSTRUMENT	4%	78%
HV	HVAC	0.4%	95%
SA	SAFETY	0.5%	61%
TE	TELECOM	0.7%	8%
PI-UG	PIPING UG	3.6%	100%
PI-AG	PIPING AG	23%	97%
PA	PAINT	2.8%	95%
TNK	TANK	9.8%	100%
SP/MO	SITE PREPARATION	8.2%	100%
COM	PRECOM & COM.	2.2%	27.5%

اکشن پلن فاز 1- اردیبهشت ماه 1404

وضعیت کلی

#	یونیت	درصد وزنی	پیشرفت تجمعی تا ماه قبل	پیشرفت برنامه ای این ماه	پیشرفت واقعی این ماه	انحراف این ماه از پلن	درصد تحقق این ماه	توضیحات
	—	۱۰۰%	۹۲.۲۳%	۰.۵۰%	۰.۳۴%	۰.۱۶%	۶۸%	
۱	CAS	۱.۱%	۹۴.۸%	۰.۰۰%	۰.۰۰۳%	۰.۰۰%	۹۲%	
۲	CWS	۲.۰%	۹۷.۴%	۰.۰۰%	۰.۰۰۳%	۰.۰۰%	۷۹%	
۳	NIS	۱.۰%	۹۵.۸%	۰.۰۰%	۰.۰۰۳%	۰.۰۰%	۸۸%	
۴	WSU	۱.۴%	۹۵.۶%	۰.۰۰%	۰.۰۰۳%	۰.۰۰%	۹۰%	
۵	FGS	۰.۹%	۹۴.۲%	۰.۰۰%	۰.۰۰۳%	۰.۰۰%	۹۶%	
۶	SPU	۱.۸%	۹۳.۲%	۰.۰۰%	۰.۰۰۵%	۰.۰۰%	۹۴%	
۷	FWS	۲.۱%	۹۶.۱%	۰.۰۰%	۰.۰۰۳%	۰.۰۰%	۹۸%	
۹	GPRS	۰.۹%	۹۷.۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰۱%	۰.۰۰%	۷۱%	
۱۰	FLS	۲.۷%	۹۵.۶%	۰.۰۱%	۰.۰۰۶%	۰.۰۰%	۹۷%	
۱۱	PGU	۱.۸%	۹۵.۴%	۰.۰۱%	۰.۰۰۵%	۰.۰۰%	۹۰%	
۱۲	CDU	۱۰.۶%	۹۶.۵%	۰.۰۱%	۰.۰۱۱%	۰.۰۰%	۹۳%	
۱۳	LPGT	۷.۲%	۹۴.۱%	۰.۰۱%	۰.۰۱۴%	۰.۰۰%	۹۷%	
۱۴	INT	۱۴.۷%	۹۰.۲%	۰.۰۲%	۰.۰۱۲%	۰.۰۱%	۵۵%	
۱۵	SWS	۲.۳%	۹۴.۷%	۰.۰۰%	۰.۰۰۴%	۰.۰۰%	۹۸%	
۱۶	TNK	۲۶.۳%	۹۶.۳%	۰.۰۳%	۰.۰۱۸%	۰.۰۱%	۶۷%	
۱۷	ROU	۱.۰%	۳۹.۹%	۰.۲۷%	۰.۱۹۵%	۰.۰۸%	۷۱%	
۱۸	WWT	۰.۹%	۷۵.۶%	۰.۰۶%	۰.۰۲۴%	۰.۰۳%	۴۱%	
۱۹	EXP	۲.۲%	۲۲.۶%	۰.۰۴%	۰.۰۱۶%	۰.۰۲%	۴۵%	
۲۰	FLU	۰.۴%	۸۵.۸%	۰.۰۰%	۰.۰۰۰%	۰.۰۰%	NO PLAN	
۲۱	S35	۲.۵%	۹۱.۱%	۰.۰۱%	۰.۰۰۴%	۰.۰۱%	۳۷%	
۲۲	S55	۱.۰%	۸۱.۱%	۰.۰۰%	۰.۰۰۱%	۰.۰۰%	۹۶%	

#	دیسپلین	درصد وزنی	پیشرفت تجمعی تا ماه قبل	پیشرفت برنامه ای این ماه	پیشرفت واقعی این ماه	انحراف این ماه از پلن	درصد تحقق این ماه	توضیحات
	—	۱۰۰%	۹۲.۲۳%	۰.۵۰%	۰.۳۴%	۰.۱۶%	۶۸%	
۱	رفع پانچ	۰.۲%	۷۹.۴%	۰.۰۱%	۰.۰۰۱%	۰.۰۰%	۸۵%	
۲	ICAPS	۱.۰%	۳۳.۲%	۰.۰۲%	۰.۰۰۱%	۰.۰۱%	۵۹%	
۳	راه اندازی	۱.۰%	۸.۶%	۰.۰۲%	۰.۰۰۱%	۰.۰۰%	۷۴%	
۴	مکانیک / مخازن / تاسیسات	۱۵.۸%	۹۷.۶%	۰.۲۲%	۰.۱۸%	۰.۰۴%	۸۰%	
۵	سیویل / معماری	۲۸.۵%	۹۲.۷%	۰.۰۸%	۰.۰۰۵%	۰.۰۳%	۶۳%	
۶	استراکچر فلزی	۴.۴%	۹۹.۱%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	NO PLAN	
۷	پایپینگ AG	۲۳.۱%	۹۶.۴%	۰.۰۸%	۰.۰۰۲%	۰.۰۵%	۳۰%	
۸	رنگ / عایق / فایبرپروف	۲.۸%	۹۴.۷%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۱۰۰%	
۹	الکتریکال	۶.۳%	۸۷.۶%	۰.۰۳%	۰.۰۰۲%	۰.۰۲%	۴۸%	
۱۰	ابزار دقیق	۳.۶%	۷۷.۸%	۰.۰۴%	۰.۰۰۴%	۰.۰۰%	۹۵%	
۱۱	تلکام	۰.۷%	۸.۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	NO PLAN	
۱۲	تجهیز کارگاه و آماده سازی بستر	۸.۲%	۱۰۰.۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	NO PLAN	


ردیف	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 60%	واحد	تا پایان ماه گذشته			برج نیتروژن		این ماه		1404			
			تجمعی ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تاکنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	حجم کل	انجام شده	پلن ماه	انجام شده	1	2	3	4
			مجموع	باکس آپ تجهیزات	57%	7%	4%		61%	60%	QTY	381	218	163	110	81	25	15	
1	LPGT	باکس آپ تجهیزات واحد LPG	70%	10%	10%	80%	100%	QTY	50	35	15	20	0	5	5				
2	SWS	باکس آپ تجهیزات واحد SWS	36%	21%	21%	57%	100%	QTY	14	5	9	3	0	3	3				
3	TNK	باکس آپ تجهیزات واحد TNK	0%	68%	28%	28%	41%	QTY	25	0	25	4	0	17	7				
4	CDU	باکس آپ تجهیزات واحد CDU	73%	0%	0%	73%	NO PLAN	QTY	60	44	16	31	31	0	0				
5	FGS	باکس آپ تجهیزات واحد FGS	75%	0%	0%	75%	NO PLAN	QTY	8	6	2	5	5	0	0				
6	WSU	باکس آپ تجهیزات واحد WSU	88%	0%	0%	88%	NO PLAN	QTY	17	15	2	0	0	0	0				
7	NIS	باکس آپ تجهیزات واحد NIS	97%	0%	0%	97%	NO PLAN	QTY	36	35	1	31	31	0	0				
8	SPU	باکس آپ تجهیزات واحد SPU	80%	0%	0%	80%	NO PLAN	QTY	41	33	8	5	5	0	0				
9	FLS	باکس آپ تجهیزات واحد FLS	48%	0%	0%	48%	NO PLAN	QTY	5	4	1	3	1	0	0				
10	CWS	باکس آپ تجهیزات واحد CWS	70%	0%	0%	70%	NO PLAN	QTY	10	7	3	-	-	0	0				
11	GPR	باکس آپ تجهیزات واحد GPR	80%	0%	0%	80%	NO PLAN	QTY	10	8	2	8	8	0	0				
12	ROU	باکس آپ تجهیزات واحد ROU	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	79	0	79	-	-	0	0				
13	FWS	باکس آپ تجهیزات واحد FWS	100%	0%	0%	100%	DONE	QTY	7	7	0	-	-	0	0				
14	CAS	باکس آپ تجهیزات واحد CAS	100%	0%	0%	100%	DONE	QTY	19	19	0	12	12	0	0				

ردیف	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 67%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1404					
			تجمعی ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	1	2	3	4	5	6
مجموع		فاینال الاینمنت تجهیزات	44%	15%	10%	54%	67%	QTY	140	61	79	21	14						
1	LPGT	LPGT/CDS فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	0%	28%	24%	24%	86%	QTY	25	0	25	7	6						
2	SWS	SWS فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	0%	13%	13%	13%	100%	QTY	8	0	8	1	1						
3	TNK	TNK فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	0%	46%	25%	25%	54%	QTY	28	0	28	13	7						
4	CDU	CDU فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	86%	0%	0%	86%	NO PLAN	QTY	28	24	4	0	0						
5	CAS	CAS فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	2	0	2	0	0						
6	CWS	CWS فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	13%	0%	0%	13%	NO PLAN	QTY	8	1	7	0	0						
7	SPU	SPU فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	62%	0%	0%	62%	NO PLAN	QTY	13	8	5	0	0						
8	WSU	WSU فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	100%	0%	0%	100%	DONE	QTY	14	14	0	0	0						
9	FLS	FLS فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	100%	0%	0%	100%	DONE	QTY	4	4	0	0	0						
10	FGS	FGS فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	100%	0%	0%	100%	DONE	QTY	2	2	0	0	0						
11	FWS	FWS فاینال الاینمنت تجهیزات واحد	100%	0%	0%	100%	DONE	QTY	8	8	0	0	0						

وضعیت کلی رفع پانچ - به تفکیک پیمانکاران

ردیف	پیمانکار	واحد	تا پایان ماه گذشته				پن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	هولد			
-	-	UOM	23,396	19,959	3,437	1,178	950	759	-
1	جهان بین	NO.	4,709	4,428	281	144	137	132	پانچ های راه اندازی و وابسته به راه اندازی
		NO.	1,186	788	398	284	114	63	
2	مبین صنعت	NO.	7,517	6,587	930	229	197	179	پانچ های راه اندازی و وابسته به راه اندازی
		NO.	7	0	7	7	0	0	
3	ستاره تاراز	NO.	3,015	2,356	659	301	152	152	
4	آرمان آفاق	NO.	2,242	2,104	138	6	32	23	پانچ های راه اندازی و وابسته به راه اندازی
		NO.	40	40	0	0	0	0	
5	خلیلی	NO.	1,935	1,771	164	1	112	96	
6	بهبود صنعت	NO.	402	341	61	25	32	25	
7	دانش مهر	NO.	849	744	105	0	84	45	نیاز به پانچ برداری از یونیت های PROCESS
8	نیرو اندیشه	NO.	220	173	47	1	0	0	پانچ های راه اندازی و وابسته به راه اندازی
		NO.	3	0	3	3	0	0	
9	طاهری	NO.	113	80	33	0	33	28	
10	بردبران	NO.	89	69	20	0	20	0	
11	تابان تندیس	NO.	136	34	102	0	0	0	
12	راژان	NO.	3	0	3	0	0	0	
13	QC	NO.	315	75	240	3	0	0	
14	ستاره نفت	NO.	10	1	9	0	0	0	
15	صفرزاده	NO.	25	15	10	0	10	3	
16	سوری	NO.	86	80	6	0	6	0	
17	NO	NO.	165	2	163	155	9	1	
18	آویشن	NO.	25	0	25	4	0	0	
19	اوپال	NO.	6	0	6	0	0	0	
20	آپسان زلال	NO.	6	0	6	6	0	0	
21	آلام صنعت	NO.	6	4	2	2	0	0	
22	مهندسی	NO.	18	18	0	0	0	0	
23	پایا صنعت	NO.	203	203	0	0	0	0	
24	مرادی(PLC)	NO.	14	0	14	2	12	12	
25	آتش پاد	NO.	43	43	0	0	0	0	
26	وندور	NO.	4	0	4	4	0	0	
27	سامان	NO.	3	2	1	1	0	0	
28	باقری	NO.	1	1	0	0	0	0	

نمودار مقایسه کل پانچ و انجام شده

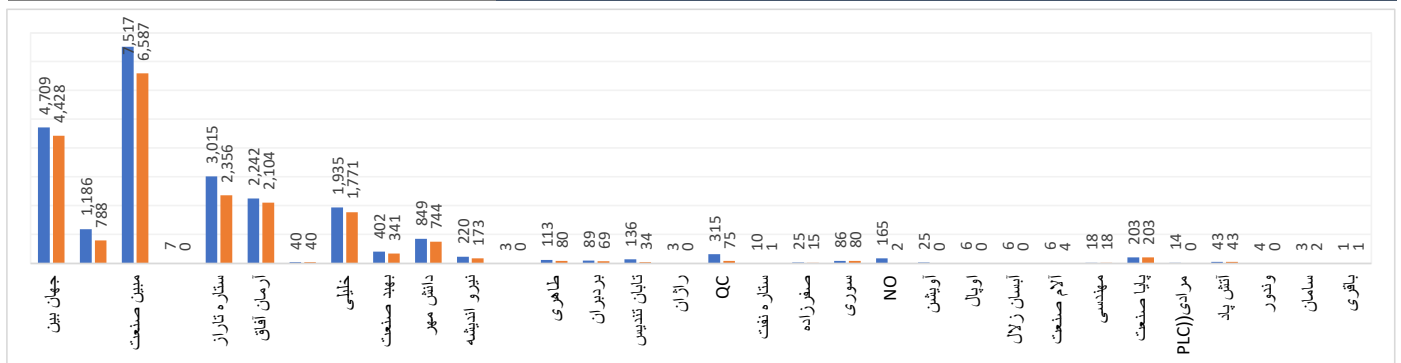

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	97%	0.02%	0.01%
PUNCH LIST CLEARANCE	98%	1.0%	1.2%
COMMISSIONING	50%	7.2%	7.2%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE																					
ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
FWS/FW-RING			98%	2%	1.2%	100%	79%	UOM	916	902	14	14	11	0	0	0	0	0	0	0	
1	آرمان آفاق	اجرای مکانیکال	99%	1%	1%	100%	100%	NO.	142	140	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
2	بهبد صنعت	اجرای مکانیکال	0%	100%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	NO	تمیز کاری	0%	100%	100%	100%	100%	NO.	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
4	طاهری	جرثقیل های سقفی	47%	53%	47%	94%	89%	NO.	17	8	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0	

COMMISSIONING													
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
	FWS/FW-RING	50%	7%	7%	57%	100%	UOM	-	-	-	-	-	
1	BOXUP	100%	0%	0%	100%	0%	NO.	7	7	0	0	0	نیاز به پرز نیترژن ندارند
2	FINAL ALIGNMENT	100%	0%	0%	100%	0%	NO.	8	8	0	0	0	با تأیید مدیریت جهت تسریع در راه اندازی فاینال الایمنت قبل از FREE RUN انجام شده است
3	BLOWING / FLUSHING	0%	100%	100%	100%	100%	IM	14,106	0	14,106	14,106	14,106	-
4	GROSS TEST	100%	0%	0%	100%	0%	IM	14,106	14,106	0	0	0	-
5	SERVICE TEST	100%	0%	0%	100%	0%	IM	14,106	14,106	0	0	0	-
6	CHEMICAL LOADING	0%	0%	0%	0%	0%	M3	1	0	1	0	0	پیمانکار ندارد / عدم تأمین مواد شیمیایی(BIOCIDE) جهت جلوگیری از رشد جلبک ، باکتری و میکرو ارگانیسمهای مضر درون مخزن
7	MRT	0%	50%	50%	50%	100%	NO.	8	0	8	4	4	4 عدد پمپ نیاز به برق پایدار
8	OTP	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	8	0	8	0	0	نیاز به برق پایدار
9	LOOP CHECK	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	29	0	29	0	0	نیاز به برق پایدار
10	FREE RUN	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	نیاز به برق پایدار

CONCERNS

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	98%	0.0%	0.0%
PUNCH LIST CLEARANCE	95%	3.0%	3.0%
COMMISSIONING	77%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE																					
ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	توضیحات	
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
GPRS			95%	3%	3%	98%	100%	UOM	402	382	20	12	12	8	0	4	3	1	0	0	
1	مرادی (PLC)	اجرای ابزار دقیق	0%	86%	86%	86%	100%	NO.	14	0	14	12	12	2	0	1	1	0	0	0	
2	NO	اجرای ابزار دقیق	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	4	0	3	1	0	0	0	PLC
3	NO	اجرای سیویل	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	دستگیره درب
4	سامان	QC form	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

COMMISSIONING													
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
	GPRS	77%	0%	0%	77%	-	UOM	-	-	-	-	-	
1	BOXUP	80%	0%	0%	80%	0%	NO.	10	8	2	0	0	برژ نیتروژن: کل (8) و انجام شده (8) 2 عدد BOXUP مربوط به BATH HEATER میباشد ، بعد از گاز دار شدن یونیت و CURING انجام خواهد شد
2	BLOWING / FLUSHING	100%	0%	0%	100%	0%	IM	1,554	1,554	0	0	0	
3	GROSS TEST	100%	0%	0%	100%	0%	IM	1,554	1,554	0	0	0	
4	LEAK TEST	100%	0%	0%	100%	0%	IM	1,554	1,554	0	0	0	
5	LOOP CHECK	47%	0%	0%	47%	0%	NO.	51	24	27	0	0	آیتم های باقی مانده مربوط به سیستم F&G میباشد که هولد تامین برق پایدار است (C35)
6	GAS IN	10%	0%	0%	10%	0%	IM	1,554	160	1,394	0	0	

CONCERNS																
تعداد هولد : 2 - یکی از CPUها در حالت خطا قرارا داردو بعدا نسبت به رفع آن اقدام میشود (1 پانچ) - به دلیل ریداندانسی نبودن ورودی و خروجی ها و کامپیوترها قابلیت انجام ندارد (1 پانچ)																
تعداد هولد : 4 - نیاز به پسورد و لایسنس (3 پانچ) - نصب تجهیزات و کنترل پنل سیستم اعلان حریق اتاق کنترل(1پانچ) پیمانکار ندارد																
تعداد هولد : 1 - رفع عیب درب های اتاق کنترل و نصب و رفع یراق آلات مربوطه(1 پانچ/SRQ-CV-0607) - تعداد کسری 2 عدد میباشد.																
تعداد هولد : 1 - عدم حضور پیمانکار در سایت (1 پانچ)																
توضیحات 1 : تجهیز FLOW INDICATOR / ACTUATOR نیاز به تعمیرات دارد و مورد تأیید منطقه 10 عملیاتی نمی باشد																
توضیحات 2 : فلومتر TFM-600 برای کالیبره به دفتر مرکزی ارسال شده است و به سایت برگشت نشده است																

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	98%	0.3%	0.3%
PUNCH LIST CLEARANCE	77%	7.6%	5.1%
COMMISSIONING	0%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

SUPPLY OF POWER - 2 MW

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	توضیحات	1404								
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون				1	2	3	4	5	6	7	8	9
PGU		-	-	-	-	39%	-	-									
1	اجرای کابل - برقی 2MW	100%	0%	0%	100%	DONE	-	پس کشتی کابل از WWT تا PGU									
2	اجرای مفصل کابل - برقی 2MW	100%	0%	0%	100%	DONE	-	اجرای مفصل کابل 3x120 در WWT									
3	اجرای HIPOT کابل - برقی 2MW	100%	0%	0%	100%	DONE	-	PGU									
6	کانکشن کابل - برقی 2MW	0%	100%	100%	100%	100%	-	PGU									
4	تکمیل شبکه ارت و تست میزان مقاومت	95%	5%	5%	100%	100%	-	PGU									
5	انجام تست کابلهای کنترل و اجرای سریندی	0%	100%	100%	100%	100%	-	PGU									
6	فانکشن تست تابلو 33 کیلو ولت بیت تمبک و PGU	0%	100%	100%	100%	100%		تمبک / PGU									
7	دسترسی به SETTING TABLE	100%	0%	0%	100%	DONE	-	PROTECTION RELAY های تابلوهای 33 کیلو ولت									
8	دسترسی به SETTING TABLE	0%	100%	0%	0%	0%	-	محقق نشده است - PGU									
9	تکمیل شبکه ارت و تست میزان مقاومت	98%	2%	2%	100%	100%	-	PROTECTION RELAY های تابلوهای 11 کیلو ولت									
10	اجرای سرکابلهای 11 و 6 کیلو ولت و انجام تست HIPOT	70%	30%	25%	95%	83%	-	S35									
11	منبع تغذیه (20A - 110VDC)	0%	100%	0%	0%	0%	-	S35									
12	دسترسی به SETTING TABLE	0%	100%	0%	0%	0%	-	در انتظار تامین - S35									
								محقق نشده است - S35									
								PROTECTION RELAY های تابلوهای 0.4 و 6 کیلو ولت									

PUNCH LIST CLEARANCE

ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
PGU			77%	8%	5%	82%	66%	UOM	433	320	113	33	21	16	0	4	0	12	0	0	
1	آرمان آفاق	اجرای استراکچر	50%	50%	25%	75%	50%	NO.	4	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	آرمان آفاق	اجرای پایپینگ	83%	17%	17%	100%	100%	NO.	24	20	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
3	بهبود صنعت	QC form	0%	100%	100%	100%	100%	NO.	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
4	بهبود صنعت	اجرای استراکچر	0%	100%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	بهبود صنعت	اجرای برقی	81%	19%	6%	88%	33%	NO.	16	13	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	بهبود صنعت	اجرای معماری	60%	40%	0%	60%	0%	NO.	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	بهبود صنعت	ایمنی	0%	100%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	بهبود صنعت	تکمیل مدارک	0%	100%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	نیرو اندیشه	QC form	99%	0%	0%	99%	0%	NO.	144	143	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	نیرو اندیشه	اجرای ابزار دقیق	11%	0%	0%	11%	0%	NO.	18	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	نیرو اندیشه	اجرای برقی	25%	0%	0%	25%	0%	NO.	24	6	18	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
12	نیرو اندیشه	اجرای مکانیکال	63%	0%	0%	63%	0%	NO.	32	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	نیرو اندیشه	راه اندازی	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	3	0	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	
14	NO	QC form	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	8	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	0	
15	NO	اجرای برقی	0%	100%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	NO	اجرای معماری	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	
17	سوری	QC form	0%	100%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	ستاره تاراز	اجرای ابزار دقیق	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	طاهری	QC form	94%	6%	0%	94%	0%	NO.	16	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	طاهری	جرثقیل های سقفی	39%	61%	57%	96%	93%	NO.	23	9	14	14	13	0	0	0	0	0	0	0	

COMMISSIONING

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
PGU		0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
	برقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	تمیز کردن پانل ها	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
2	تست پنلهای LV (CHP-PLC-سیگنال ابزاردقیق)	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
3	اتصال همه کابل های LV	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
4	نگ نامبر کابل	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
5	ارنج کابلها در داخل و خارج از پانل ها	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
	ترانسفورماتورها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	تمیز کردن ترانسفورماتورها	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
7	گردش روغن	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
8	تست HIGH POT	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
9	تعویض سیلیکاژل	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
	ژنراتور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	نظافت تمام پنل ها و JBها	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
11	اتصال همه کابل های MV	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
12	اتصال ارت NGR	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
13	تست و راه اندازی پیش گرمکن ژنراتور	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
14	نصب سوییچ فشار مخزن هوا	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	

CONCERNS

ردیف 11 جدول پانچ: تعداد هولد: 1 - نصب تگ کابل ها پس از تامین توسط کارفرما(1 پانچ)
ردیف 13-16 جدول پانچ: تعداد هولد: 13 - اجرای لکه گیری گچ و رنگ(3 پانچ) - تامین گاز (Page 13) - مدرک QC FORM (8 پانچ) - پیمانکار ندارند

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONT %	ACTUAL THIS MONT %
CONSTRUCTION	99%	0.09%	0.0%
PUNCH LIST CLEARANCE	85%	5.9%	5.4%
COMMISSIONING	18%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

CONSTRUCTION - RECONSTRUCTION OF CWS AFTER FIRE

ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CWS			-	-	-	-	7%	UOM	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	آرمان آفاق	انتقال ضایعات سوخته	60%	40%	40%	100%	100%	%	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

PUNCH LIST CLEARANCE

ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendo	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
CWS			85%	6%	5%	91%	92%	UOM	627	534	93	38	34	50	0	11	33	1	0	5	0
1	آرمان آفاق	اجرای پایپینگ	0%	100%	100%	100%	100%	NO.	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	جهان بین	اجرای مکانیکال	93%	2%	2%	94%	100%	NO.	54	50	4	1	1	3	0	1	2	0	0	0	
3	جهان بین	راه اندازی	65%	3%	0%	65%	0%	NO.	34	22	12	1	0	11	0	7	4	0	0	0	
4	خلیلی	اجرای رنگ	89%	11%	7%	96%	63%	NO.	74	66	8	8	5	0	0	0	0	0	0	0	
5	مبین صنعت	اجرای پایپینگ	92%	4%	4%	95%	100%	NO.	85	78	7	3	3	4	0	0	4	0	0	0	
6	مبین صنعت	اجرای رنگ	87%	13%	13%	100%	100%	NO.	79	69	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
7	مبین صنعت	اجرای عایق	91%	9%	9%	100%	100%	NO.	11	10	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
8	مبین صنعت	استیم ترپ	33%	67%	67%	100%	100%	NO.	3	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
9	مبین صنعت	جوش آبیندی	40%	60%	60%	100%	100%	NO.	5	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
10	مبین صنعت	سایپورت	46%	0%	0%	46%	0%	NO.	24	11	13	0	0	13	0	1	12	0	0	0	
11	NO	اجرای مکانیکال	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	6	0	6	0	0	6	0	0	0	1	0	5	
12	ستاره تاراز	اجرای ابزار دقیق	69%	10%	10%	79%	100%	NO.	84	58	26	8	8	13	0	2	11	0	0	0	

COMMISSIONING

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
		CWS	18%	0%	18%			-	-	-			
1	BOXUP	70%	0%	0%	70%	0%	NO.	10	7	3	0	0	نیاز به پرژ نیروژن ندارد
2	FINAL ALIGNMENT	13%	0%	0%	13%	0%	NO.	8	1	7	0	0	با تأیید مدیریت جهت تسریع در راه اندازی فاینال ایلمنت قبل از FREE RUN در حال انجام می باشد
3	BLOWING / FLUSHING	0%	0%	0%	0%	0%	IM	5,576	0	5,576	0	0	پیمانکار ندارد
4	GROSS TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	5,576	0	5,576	0	0	پیمانکار ندارد
5	SERVICE TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	5,619	0	5,619	0	0	پیمانکار ندارد
6	LEAK TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	12	0	12	0	0	پیمانکار ندارد
7	STEAM OUT	0%	0%	0%	0%	0%	IM	1,014	0	1,014	0	0	پیمانکار ندارد
8	WATER CIRCULATION	0%	0%	0%	0%	0%	IM	2,226	0	0	0	0	نیاز به برقی پایدار
9	CHEMICAL LOADING	0%	0%	0%	0%	0%	M3	14	0	14	0	0	پیمانکار ندارد
10	MRT	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	19	0	19	0	0	نیاز به برقی پایدار
11	OTP	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	19	0	19	0	0	نیاز به برقی پایدار
12	LOOP CHECK	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	63	0	63	0	0	نیاز به برقی پایدار
13	FREE RUN	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	14	0	14	0	0	نیاز به برقی پایدار

CONCERNS

- ردیف 2 جدول پانچ:
ردیف 5 جدول پانچ:
ردیف 10 جدول پانچ:
ردیف 11 جدول پانچ:
ردیف 12 جدول پانچ:
- تعداد هولد : 3 - نصب 2 عدد سایلنسر منوط به تامین مترايل استراکچر نشیمنگاه (2 پانچ/SACR-AD-INT-97822) - رفع نشی دیوار کولینگ(1 پانچ)
تعداد هولد : 4 - کسری COUPLING (4 پانچ/SRQ-PI-0253)
تعداد هولد : 13 - کسری ساپورت های SRT (9 پانچ/SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5564) - تعداد کسری 16 عدد) - در انتظار تایید TQ-528 بابت اضافه شدن ساپورت (1 پانچ) پس از نصب استراکچر ساپورت نصب میشود (3 پانچ)
تعداد هولد : 6 - تهیه ASBUILT برای PK-522-22 به دلیل عدم انطباق کار انجام شده با P&ID و ISO (1 پانچ)- تامین BORESCOPE (5 پانچ)
تعداد هولد : 13 - به دلیل برخورد تجهیز با لوله امکان نصب نیست(1 پانچ) - کسری ردیوسر(1 پانچ/SRQ-IN-0010) - مغایرت بین سوراخ های ترموول و تیپنگ (1 پانچ)
کسری تجهیز (10 پانچ/SACR-AD-INT-93334) AT-522-005,006,007,FI522-030A,LT-522-301A,B,PDT-522-301A,B,PT-522-00307A,B
- کسری FLEXIBLE HOSE تعداد 5 عدد میباشد (E-REQ-ME-0020)
بررسی وضعیت 3 دستگاه الکتروموتور و گریکس کولینگ تاور : تست میگر انجام شد، جهت بررسی 1 عدد الکتروموتور و گریکس به شاپ تعمیرات در عسلویه ارسال گردید
عایق پوشش پکیج های B,C,PK-522-22A (اجرای شلتر) ضرورت دارد
- توضیحات 1 :
توضیحات 2 :
توضیحات 3 :
توضیحات 3 :

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	98%	0.2%	0.0%
PUNCH LIST CLEARANCE	89%	5.6%	5.5%
COMMISSIONING	20%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE																					
ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پنل ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پنل ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پنل ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
CAS			89%	6%	6%	94%	98%	UOM	608	531	77	34	33	43	0	3	29	0	9	2	0
1	جهان بین	اجرای ابزار دقیق	80%	0%	0%	80%	0%	NO.	5	4	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2	جهان بین	اجرای پایپینگ	75%	0%	0%	75%	0%	NO.	4	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
3	جهان بین	راه اندازی	81%	0%	0%	81%	0%	NO.	43	35	8	0	0	8	0	0	0	0	8	0	
4	خلیلی	اجرای رنگ	92%	8%	8%	100%	100%	NO.	39	36	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
5	مبین صنعت	اجرای ابزار دقیق	0%	100%	100%	100%	100%	NO.	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
6	مبین صنعت	اجرای پایپینگ	94%	0%	0%	94%	0%	NO.	35	33	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	
7	مبین صنعت	اجرای رنگ	94%	6%	6%	100%	100%	NO.	33	31	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
8	مبین صنعت	نصب ولو کنترلی	94%	0%	0%	94%	0%	NO.	18	17	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
9	NO	اجرای مکانیکال	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
10	ستاره تاراز	اجرای ابزار دقیق	76%	10%	10%	86%	100%	NO.	198	151	47	19	19	28	0	0	28	0	0	0	
11	طاهری	چرئقیل های سقفی	0%	100%	88%	88%	88%	NO.	8	0	8	8	7	0	0	0	0	0	0	0	

COMMISSIONING													
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
CAS		20%	0%	0%	20%	-	UOM	-	-	-	-	-	
1	BOXUP	100%	0%	0%	100%	0%	NO.	19	19	0	0	0	پرژ نیروژن: کل (12) و انجام شده (12)
2	FINAL ALIGNMENT	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	0	0	نیاز به حضور وندور
3	BLOWING / FLUSHING	0%	0%	0%	0%	0%	IM	1,020	0	1,020	0	0	پیمانکار ندارد
4	GROSS TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	2,505	0	2,505	0	0	پیمانکار ندارد
5	SERVICE TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	2,562	0	2,562	0	0	پیمانکار ندارد
6	LEAK TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	3	0	3	0	0	پیمانکار ندارد
7	CHEMICAL LOADING	0%	0%	0%	0%	0%	M3	3	0	3	0	0	پیمانکار ندارد
8	MRT	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	3	0	3	0	0	نیاز به برق پایدار
9	OTP	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	3	0	3	0	0	نیاز به برق پایدار
10	LOOP CHECK	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	112	0	112	0	0	نیاز به برق پایدار
11	FREE RUN	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	0	0	نیاز به برق پایدار

CONCERNS															
تعداد هولد : 1 - نیاز به حضور وندور هتکو جهت نصب تجهیز PT-524-501A (1 پانچ/صورتجلسه هتکو 1403-12-05)															
تعداد هولد : 1 - ریجکت شدن ولو PSV-524-001A (1 پانچ)															
تعداد هولد : 2 - کسری COUPLING (1 پانچ/SRQ-PI-0253) - شیر برق ولو SDV-524-003 خراب است (1 پانچ)															
تعداد هولد : 1 - ریجکت شدن سلونوئید ولو SDV-524-003 (1 پانچ)															
تعداد هولد : 2 - تامین BORESCOPE (2 پانچ)															
تعداد هولد : 28 - کسری ردیوسر جهت آنالایزر (2 پانچ/E-REQ-IN-0010) - کسری تجهیزات ابزاردقیق (25 پانچ/صورتجلسه هتکو 1403-12-05)															
کسری کانکتور جهت اتصال LINE به رگولاتور (1 پانچ/SRQ-EL-0136)															

توضیحات : 1

با استناد به ایمیل شماره SACR-AD-INT-98881 و طبق اعلام واحد بازرگانی تهران، مدیر عامل شرکت هتکو به علت موضوعات تقلیل ضمانت نامه و طلب ادعایی آن شرکت کلیه امور مربوط به آدیش را هولد نموده است

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	98%	0.16%	0.0%
PUNCH LIST CLEARANCE	86%	8.9%	7.0%
COMMISSIONING	19%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE																					
ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
			NIS						676	582	94										
1	جهان بین	اجرای پایپینگ	56%	33%	22%	78%	67%	NO.	9	5	4	3	2	1	0	0	0	1	0	0	
2	جهان بین	راه اندازی	96%	0%	0%	96%	0%	NO.	48	46	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
3	خلیلی	اجرای رنگ	98%	2%	2%	100%	100%	NO.	50	49	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
4	مبین صنعت	اجرای استراکچر	0%	100%	100%	100%	100%	NO.	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
5	مبین صنعت	اجرای پایپینگ	84%	9%	7%	91%	78%	NO.	99	83	16	9	7	7	0	5	2	0	0	0	
6	مبین صنعت	اجرای رنگ	95%	5%	5%	100%	100%	NO.	20	19	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	مبین صنعت	اجرای عایق	87%	13%	0%	87%	0%	NO.	15	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	مبین صنعت	سایپورت	39%	52%	9%	48%	17%	NO.	23	9	14	12	2	2	0	2	0	0	0	0	
9	مبین صنعت	نصب ولو غیر کنترلی	75%	25%	25%	100%	100%	NO.	8	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
10	مبین صنعت	نصب ولو کنترلی	98%	0%	0%	98%	0%	NO.	44	43	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
11	ستاره تاراز	اجرای ابزار دقیق	61%	26%	26%	87%	100%	NO.	114	69	45	30	30	14	5	1	2	0	6	0	
12	ستاره تاراز	اجرای پایپینگ	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	ستاره تاراز	نصب اوریفیس	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMMISSIONING													
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
	NIS	19%	0%	0%	19%	-	UOM	-	-	-	-	-	
1	BOXUP	97%	0%	0%	97%	0%	NO.	36	35	1	0	0	پرژ نیترژن: کل (32) و انجام شده (31)
2	BLOWING / FLUSHING	0%	0%	0%	0%	0%	IM	2,774	0	2,774	0	0	پیمانکار ندارد
2	GROSS TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	3,438	0	3,438	0	0	پیمانکار ندارد
3	SERVICE TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	675	0	675	0	0	پیمانکار ندارد
4	STEAM OUT	0%	0%	0%	0%	0%	IM	120	0	120	0	0	پیمانکار ندارد
5	CHEMICAL LOADING	0%	0%	0%	0%	0%	M3	3	0	3	0	0	پیمانکار ندارد
6	LOOP CHECK	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	234	0	234	0	0	نیاز به برق پایدار

CONCERNS																
تعداد هولد : 1 - تعداد 1 عدد PSV به دلیل عدم کالیبره هولد میباشد PSV-561-1391 (1 پانچ)																
تعداد هولد : 7 - کسری FLEXIBLE HOSE (2 پانچ/ E-REQ-ME-0020) پس از اجرای فونداسیون ساپورت توسط سیویل (1 پانچ)																
نصب ردیوسر و فلنج مربوط به کسری ولو PV-561-1323 (4 پانچ/ SACR-AD-INT-79656)																
تعداد هولد : 2 - تکمیل ساپورت پس از تامین و نصب ولو PV-561-1323 (1 پانچ) - پس از تایید TQ بابت اضافه شدن ساپورت (1 پانچ)																
تعداد هولد : 1 - کسری کنترل ولو PV-561-1323 (1 پانچ/ SACR-AD-INT-79656)																
تعداد هولد : 14 - تگ تجهیز در مدارک نمیشد AP-561-1322/PI-561-501/PT-561-901,902 (4 پانچ)																
کسری تجهیزات ابزار دقیق TE-561-1301,1302,1303,1321,1322/PDT-561-1300 (6 پانچ/ صورتجلسه هتکو 1403-12-05)																
تجهیز در کالیبراسیون ریجکت شده است TT-561-203 (1 پانچ) - تجهیز دیتا شیت ندارد FT-561-1321 (1 پانچ)																
در انتظار مشخص شدن محل نصب تجهیز توسط وندور هتکو TE-561-1300A,B (2 پانچ)																

PUNCH LIST CLEARANCE

COMMISSIONING

CONCERNS

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	98%	0.2%	0.0%
PUNCH LIST CLEARANCE	94%	3.6%	3.3%
COMMISSIONING	11%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE

ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
FGS			94%	4%	3%	97%	93%	UOM	390	365	25	14	13	11	0	0	11	0	0	0	0
1	دانش مهر	اجرای سیویل	67%	33%	0%	67%	0%	NO.	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	جهان بین	اجرای مکانیکال	75%	0%	0%	75%	0%	NO.	8	6	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	
3	جهان بین	نصب سمپل	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
4	خلیلی	اجرای رنگ	92%	8%	8%	100%	100%	NO.	49	45	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
5	مبین صنعت	اجرای پایپینگ	91%	3%	3%	94%	100%	NO.	32	29	3	1	1	2	0	0	2	0	0	0	
6	مبین صنعت	اجرای رنگ	96%	4%	4%	100%	100%	NO.	49	47	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
7	مبین صنعت	اجرای عایق	93%	7%	7%	100%	100%	NO.	15	14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
8	مبین صنعت	بولت و گسکت	97%	3%	3%	100%	100%	NO.	62	60	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
9	مبین صنعت	سایپورت	86%	14%	14%	100%	100%	NO.	7	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
10	مبین صنعت	نصب ولو کنترلی	95%	0%	0%	95%	0%	NO.	21	20	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
11	ستاره تاراز	اجرای ابزار دقیق	84%	4%	4%	89%	100%	NO.	45	38	7	2	2	5	0	0	5	0	0	0	

COMMISSIONING

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
FGS		11%	0%	0%	11%	-	UOM	-	-	-	-	-	
1	BOXUP	75%	0%	0%	75%	0%	NO.	8	6	2	0	0	پرژ نیترژن: کل (5) و انجام شده (5)
2	FINAL ALIGNMENT	100%	0%	0%	100%	0%	NO.	2	2	0	0	0	با تأیید مدیریت جهت تسریع در راه اندازی فاینال الایمنت قبل از FREE RUN انجام شده است.
3	BLOWING / FLUSHING	0%	0%	0%	0%	0%	IM	3,917	0	3,917	0	0	
4	GROSS TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	906	0	906	0	0	پیمانکار ندارد
5	SERVICE TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	869	0	869	0	0	پیمانکار ندارد
6	LEAK TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	3,083	0	3,083	0	0	پیمانکار ندارد
7	STEAM OUT	0%	0%	0%	0%	0%	IM	671	0	671	0	0	نیاز به برق پایدار
8	MRT	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	0	0	نیاز به برق پایدار
9	OTP	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	0	0	نیاز به برق پایدار
10	LOOP CHECK	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	90	0	90	0	0	نیاز به برق پایدار
11	FREE RUN	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	0	0	نیاز به برق پایدار

CONCERNS

- ردیف 2 جدول پنچ: تعداد هولد : 2 - کسری فیلتر المنت(1 پانچ/93748-SACR-AD-INT)- کسری فیلتر المنت تعداد 8 عدد میباشد
- کسری FLEXIBLE HOSE (1 پانچ/0020-E-REQ-ME) تعداد هولد : 1 - کسری سمپل کانکشن (1 پانچ/95220-SACR-AD-INT) - تعداد در حال برآورد میباشد
- ردیف 3 جدول پنچ: تعداد هولد : 2 - کسری کپلینگ (2 پانچ/0253-SRQ-PI) تعداد هولد : 2 - کسری کنترل ولو (1 پانچ/88051-SACR-AD-INT) FV-523-004
- ردیف 5 جدول پنچ: تعداد هولد : 1 - کسری فیلتر المنت(1 پانچ/93748-SACR-AD-INT)- کسری فیلتر المنت تعداد 8 عدد میباشد
- ردیف 10 جدول پنچ: تعداد هولد : 5 - کسری ردیوسر(5 پانچ/0010-E-REQ-IN) تعداد هولد : 5 - کسری فیلتر المنت(1 پانچ/93748-SACR-AD-INT)- کسری فیلتر المنت تعداد 8 عدد میباشد
- ردیف 11 جدول پنچ: تعداد هولد : 5 - کسری فیلتر المنت(1 پانچ/93748-SACR-AD-INT)- کسری فیلتر المنت تعداد 8 عدد میباشد

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	99%	0.10%	0.0%
PUNCH LIST CLEARANCE	87%	7.4%	7.0%
COMMISSIONING	16%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE

ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
	SPU		87%	7.4%	7%	94%	92%	UOM	2,086	1,814	272	157	145	74	4	26	40	0	0	4	
1	آرمان آفاق	اجرای پایپینگ	0%	100%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	جهان بین	اجرای پایپینگ	67%	0%	0%	67%	0%	NO.	6	4	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	
3	جهان بین	اجرای عایق	80%	20%	20%	100%	100%	NO.	10	8	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
4	جهان بین	اجرای مکانیکال	99%	0%	0%	99%	0%	NO.	159	157	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	
5	جهان بین	راه اندازی	83%	4%	4%	87%	100%	NO.	103	86	17	4	4	13	0	12	1	0	0	0	
6	جهان بین	نصب ولو کنترلی	33%	0%	0%	33%	0%	NO.	3	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	
7	خلیلی	اجرای رنگ	85%	15%	15%	100%	100%	NO.	199	169	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	
8	مبین صنعت	اجرای پایپینگ	86%	8%	7%	93%	91%	NO.	284	244	40	22	20	14	0	4	10	0	0	0	
9	مبین صنعت	اجرای رنگ	88%	12%	12%	100%	100%	NO.	161	142	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	
10	مبین صنعت	اجرای عایق	84%	16%	16%	100%	100%	NO.	114	96	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	
11	مبین صنعت	استیم ترپ	12%	36%	36%	48%	100%	NO.	25	3	22	9	9	13	0	0	13	0	0	0	
12	مبین صنعت	بولت و گسکت	99%	0%	0%	99%	0%	NO.	177	176	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
13	مبین صنعت	سایپورت	68%	8%	8%	76%	100%	NO.	25	17	8	2	2	6	0	0	6	0	0	0	
14	مبین صنعت	نصب اوریفیس	95%	0%	0%	95%	0%	NO.	20	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	مبین صنعت	نصب ولو غیر کنترلی	80%	15%	5%	85%	33%	NO.	20	16	4	3	1	1	0	0	1	0	0	0	
16	مبین صنعت	نصب ولو کنترلی	99%	0%	0%	99%	0%	NO.	157	156	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
17	NO	اجرای پایپینگ	0%	100%	0%	0%	0%	NO.	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	NO	اجرای مکانیکال	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	
19	QC	تکمیل مدارک	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	ستاره تاراز	اجرای ابزار دقیق	77%	14%	14%	91%	100%	NO.	274	211	63	38	38	15	4	9	2	0	0	0	
21	ستاره تاراز	اجرای برقی	0%	100%	100%	100%	100%	NO.	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	

COMMISSIONING

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
	SPU	16%	0%	0%	16%	-	UOM	-	-	-	-	-	
1	BOXUP	80%	0%	0%	80%	0%	NO.	41	33	8	0	0	پرژ نیترژن: کل (5) و انجام شده (5)
2	FINAL ALIGNMENT	62%	0%	0%	62%	0%	NO.	13	8	5	0	0	با تأیید مدیریت جهت تسریع در راه اندازی فاینال الایمنت قبل از FREE RUN در حال انجام می باشد
3	BLOWING / FLUSHING	0%	0%	0%	0%	0%	IM	1,760	0	1,760	0	0	پیمانکار ندارد
4	GROSS TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	20,884	0	20,884	0	0	پیمانکار ندارد
5	SERVICE TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	36,023	0	36,023	0	0	پیمانکار ندارد
6	LEAK TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	1,266	0	1,266	0	0	پیمانکار ندارد
7	STEAM OUT	0%	0%	0%	0%	0%	IM	6,898	0	6,898	0	0	پیمانکار ندارد
8	CHEMICAL LOADING	0%	0%	0%	0%	0%	M3	4	0	4	0	0	پیمانکار ندارد
9	MRT	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	22	0	22	0	0	نیاز به برق پایدار
10	OTP	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	22	0	22	0	0	نیاز به برق پایدار
11	LOOP CHECK	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	539	0	539	0	0	نیاز به برق پایدار
12	FREE RUN	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	13	0	13	0	0	نیاز به برق پایدار

CONCERNS

تعداد هولد : 2 - کسری FLEXIBLE HOSE (2 پانچ/E-REQ-ME-0020) - تعداد کسری 10 عدد میباشد.	ردیف 2 جدول پانچ:
تعداد هولد : 2 - پس از تامین کسری استراکچر شلتر 07 & SH-522-06 انجام میشود (2 پانچ/SACR-AD-INT-95491) - لوبریکیشن پکیج FD فن ها	ردیف 4 جدول پانچ:
تعداد هولد : 2 - کسری 2 عدد ولو B, PVRV-521-001A (2 پانچ/SACR-AD-INT-92923)	ردیف 6 جدول پانچ:
تعداد هولد : 14 - اتصال لاین پس از نصب آنالایزر (1 پانچ/SACR-AD-INT-93334) - کسری COUPLING (3 پانچ/SRQ-PI-0253)	ردیف 8 جدول پانچ:
کسری FLEXIBLE JOINT (3 پانچ/SACR-AD-INT-72995) - تعداد کسری 8 عدد - پس از نصب برنر لایت متصل میشود (1 پانچ)	ردیف 11 جدول پانچ:
کسری سمپل کانکشن و فعالیت های وابسته (4 عدد/SACR-AD-INT-95220) - اتصال لاین پس از تامین ولو (1 پانچ) - کسری متریال (1 پانچ/RENESTATE)	ردیف 12 جدول پانچ:
تعداد هولد : 13 - کسری استیم ترپ (13 پانچ/SRQ-PI-0269-AG/SACR-AD-INT-88051)	ردیف 13 جدول پانچ:
تعداد هولد : 1 - اجرای بولت و گسکت پس از تامین کسری سایپورت (1 پانچ/SACR-AD-INT-95491)	ردیف 15 جدول پانچ:
تعداد هولد : 6 - کسری سایپورتهای SRT (5 پانچ/SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5564) - تعداد کسری 6 عدد	ردیف 16 جدول پانچ:
کسری استراکچر مربوط به سایپورت SRV در Boiler A/B (1 پانچ/SACR-AD-INT-98539)	ردیف 18 جدول پانچ:
تعداد هولد : 1 - کسری ولو PCV-521-010 (1 پانچ/SACR-AD-INT-88051)	ردیف 20 جدول پانچ:
تعداد هولد : 1 - ولو UV-521-102 گیر مکانیکی دارد و در کالبره ریجکت شده است (1 پانچ)	
تعداد هولد : 4 - تامین BORESCOPE (4 پانچ)	
تعداد هولد : 15 - تجهیز به دلیل برخورد با لاین امکان نصب ندارد (1 پانچ) - تیبینگ نصب نیست (2 پانچ) - نگ تجهیز در مدارک نمایشد (4 پانچ)	
مغایرت پاییبگ و ابزار دقیق (4 پانچ) - تیپ فلنج و نرمول متفاوت است (1 پانچ) - بلابند فلنج نصب نیست (1 پانچ) - کسری ردیوسر (2 پانچ/E-REQ-IN-0010)	

توضیحات 1 : تخصیص تیم متخصص راه اندازی یونیت SPU : یک تیم تخصصی، راهبری و راه اندازی به مدیریت معرفی شده و در حال بررسی میباشد

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	97%	0.2%	0.2%
PUNCH LIST CLEARANCE	91%	5.4%	5.3%
COMMISSIONING	19%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE

ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
FLS			91%	5%	5%	96%	98%	UOM	836	762	74	45	44	9	0	4	3	2	0	0	
1	آلام صنعت	اجرای استراکچر	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
2	بردبران	اجرای سیویل	0%	100%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	جهان بین	اجرای استراکچر	40%	60%	60%	100%	100%	NO.	10	4	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	
4	جهان بین	اجرای پایپینگ	94%	5%	5%	99%	100%	NO.	129	121	8	7	7	1	0	0	1	0	0	0	
5	جهان بین	اجرای رنگ	98%	2%	2%	100%	100%	NO.	50	49	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	جهان بین	اجرای عایق	98%	2%	2%	100%	100%	NO.	42	41	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	جهان بین	اجرای مکانیکال	96%	4%	4%	100%	100%	NO.	28	27	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
8	جهان بین	استیم ترپ	67%	33%	33%	100%	100%	NO.	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	جهان بین	بولت و گسکت	100%	0%	0%	100%	100%	NO.	238	237	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
10	جهان بین	سایورت	86%	7%	7%	93%	100%	NO.	14	12	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	
11	خلیلی	اجرای رنگ	74%	26%	26%	100%	100%	NO.	47	35	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	
13	اوبال	QC form	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	ستاره تاراز	اجرای ابزار دقیق	62%	14%	14%	76%	100%	NO.	94	58	36	13	13	4	0	2	2	0	0	0	

COMMISSIONING

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
	FLS	19%	0%	0%	19%	-	UOM	-	-	-	-	-	
1	BOXUP	80%	0%	0%	80%	0%	NO.	5	4	1	0	0	پُر نیترژن: کل (3) و انجام شده (1)
2	FINAL ALIGNMENT	100%	0%	0%	100%	0%	NO.	4	4	0	0	0	با تأیید مدیریت جهت تسریع در راه اندازی فاینال الایمنت قبل از FREE RUN در حال انجام می باشد
3	BLOWING / FLUSHING	0%	0%	0%	0%	0%	IM	43,139	0	43,139	0	0	پیمانکار ندارد
4	GROSS TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	11,360	0	11,360	0	0	پیمانکار ندارد
5	SERVICE TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	10,796	0	10,796	0	0	پیمانکار ندارد
6	LEAK TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	31,807	0	31,807	0	0	پیمانکار ندارد
7	STEAM OUT	0%	0%	0%	0%	0%	IM	6,513	0	6,513	0	0	نیاز به برق پایدار
8	MRT	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	نیاز به برق پایدار
9	OTP	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	نیاز به برق پایدار
10	LOOP CHECK	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	104	0	104	0	0	نیاز به برق پایدار
11	FREE RUN	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	نیاز به برق پایدار

CONCERNS

- ردیف 1 جدول پانچ: تعداد هولد : 2 - عدم حضور پیمانکار آلام صنعت (2 پانچ)
- ردیف 4 جدول پانچ: تعداد هولد : 1 - کسری COUPLING (1 پانچ/SRQ-PI-0253)
- ردیف 10 جدول پانچ: تعداد هولد : 1 - جهت نصب سایورت، استراکچر باید فیکس شود (1 پانچ)
- ردیف 14 جدول پانچ: تعداد هولد : 4 - کسری تجهیز ابزاردقیق LT-525-001,LZT-525-002 (2 پانچ/SACR-AD-INT-93334)
- نصب تجهیز پس از تکمیل فنس PG-525-020 (1 پانچ)- مغایرت پایپینگ و ابزار دقیق (1 پانچ)

توضیحات 1 : وینچ مربوط به استک فلر کسری میباشد

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	98%	0.1%	0.1%
PUNCH LIST CLEARANCE	90%	1.8%	1.7%
COMMISSIONING	10%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE

ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLE	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
CDU			90%	2%	2%	92%	93%	UOM	4,228	3,801	427	74	69	171	4	88	58	11	10	0	
1		بهبود صنعت	50%	50%	50%	100%	100%	NO.	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
2		اجرای استراکچر	70%	15%	11%	81%	75%	NO.	27	19	8	4	3	4	0	0	0	0	4	0	
3		اجرای پایپینگ	88%	8%	8%	96%	100%	NO.	25	22	3	2	2	1	0	1	0	0	0	0	
4		اجرای مکانیکال	97%	0%	0%	97%	0%	NO.	165	160	5	0	0	5	0	1	2	0	2	0	
5		بولت و گسکت	94%	0%	0%	94%	0%	NO.	50	47	3	0	0	3	0	1	0	0	2	0	
6		تمیز کاری	99%	1%	1%	100%	100%	NO.	139	138	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
7		راه اندازی	85%	1%	1%	86%	67%	NO.	256	218	38	3	2	35	0	33	0	0	2	0	
8		نصب سمبل	33%	17%	17%	50%	100%	NO.	6	2	4	1	1	3	0	2	1	0	0	0	
9		اجرای رنگ	98%	2%	1%	99%	70%	NO.	497	487	10	10	7	0	0	0	0	0	0	0	
10		اجرای ابزار دقیق	50%	50%	50%	100%	100%	NO.	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11		اجرای استراکچر	0%	67%	67%	67%	100%	NO.	3	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
12		اجرای پایپینگ	59%	12%	12%	71%	100%	NO.	197	116	81	24	24	12	0	0	12	0	0	0	
13		اجرای رنگ	99%	1%	1%	100%	100%	NO.	416	410	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	
14		اجرای عایق	95%	2%	2%	98%	100%	NO.	261	249	12	6	6	0	0	0	0	0	0	0	
15		بولت و گسکت	94%	1%	1%	95%	100%	NO.	420	396	24	4	4	13	0	13	0	0	0	0	
16		تمیز کاری	99%	1%	1%	100%	100%	NO.	177	176	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
17		جوش آبیندی	81%	0%	0%	81%	0%	NO.	103	83	20	0	0	20	0	0	20	0	0	0	
18		سایلدگلس	44%	0%	0%	44%	0%	NO.	39	17	22	0	0	22	0	0	22	0	0	0	
19		نصب سمبل	78%	0%	0%	78%	0%	NO.	9	7	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
20	NO	اجرای پایپینگ	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
21	NO	اجرای عایق	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	7	0	7	0	0	7	0	0	0	7	0	0	
22	اوپال	QC form	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	QC	تکمیل مدارک	1%	0%	0%	1%	0%	NO.	78	1	77	0	0	3	0	0	0	3	0	0	
24	ستاره تاراز	اجرای ابزار دقیق	91%	1%	1%	92%	100%	NO.	794	725	69	8	8	41	4	37	0	0	0	0	
25	ستاره تاراز	اجرای برق	23%	0%	0%	23%	0%	NO.	31	7	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMMISSIONING

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
CDU		10%	0%	0%	10%	-	UOM	-	-	-	-	-	
1	BOXUP	73%	0%	0%	73%	0%	NO.	60	44	16	0	0	پرژ نیترژن: کل (31) و انجام شده (31)
2	FINAL ALIGNMENT	86%	0%	0%	86%	0%	NO.	28	24	4	0	0	
3	BLOWING / FLUSHING	0%	0%	0%	0%	0%	IM	105,333	0	105,333	0	0	پیمانکار ندارد
4	GROSS TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	31,933	0	31,933	0	0	پیمانکار ندارد
5	SERVICE TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	45,028	0	45,028	0	0	پیمانکار ندارد
6	LEAK TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	78,834	0	78,834	0	0	پیمانکار ندارد
7	STEAM OUT	0%	0%	0%	0%	0%	IM	17,833	0	17,833	0	0	پیمانکار ندارد
8	WATER CIRCULATION	0%	0%	0%	0%	0%	IM	63,289	0	63,289	0	0	پیمانکار ندارد
9	CHEMICAL LOADING	0%	0%	0%	0%	0%	M3	4	0	4	0	0	پیمانکار ندارد
10	MRT	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	34	0	34	0	0	نیاز به برق پایدار
11	OTP	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	34	0	34	0	0	نیاز به برق پایدار
12	LOOP CHECK	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	900	0	900	0	0	نیاز به برق پایدار
13	FREE RUN	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	48	0	48	0	0	نیاز به برق پایدار

CONCERNS

تعداد هولد : 4 - در انتظار جواب وندور در مورد اینترنال وسل های 04 , V-501-01 (4 پانچ)	ردیف 2 جدول پانچ:
تعداد هولد : 1 - اتصال لاین پس از تامین کسری سمبل کانکشن (1 پانچ)	ردیف 3 جدول پانچ:
تعداد هولد : 5 - در انتظار جواب وندور در مورد اینترنال وسل های 04 , V-501-01 (2 پانچ)	ردیف 4 جدول پانچ:
تامین NAME PLATE با تگ E-501-04E (1 پانچ/خرید محلی) - کسری سمبل کانکشن و فعالیت وابسته به آن (2 پانچ/SACR-AD-INT-95220)	ردیف 5 جدول پانچ:
تعداد هولد : 3 - در انتظار جواب وندور در مورد اینترنال وسل های 04 , V-501-01 (2 پانچ) - ولو در کالیبره ریجکت شده است (1 پانچ) PSV-501-001B	ردیف 8 جدول پانچ:
تعداد هولد : 3 - کسری سمبل کانکشن (3 پانچ/SACR-AD-INT-95220)	ردیف 12 جدول پانچ:
تعداد هولد : 12 - کسری سمبل کانکشن (2 پانچ/SACR-AD-INT-95220)-کسری لوله ALLOYED (1 پانچ/SRQ-PI-0162-AG)	ردیف 15 جدول پانچ:
کسری COUPLING (9 پانچ/SRQ-PI-0253)	ردیف 17 جدول پانچ:
تعداد هولد : 13 - نصب بولت و گسکت پس از تامین ساید گلس (13 پانچ)	ردیف 18 جدول پانچ:
تعداد هولد : 20 - به دلیل کسری لوله ALLOYED جوش آبیندی هولد میباشد (20 پانچ)	ردیف 19 جدول پانچ:
تعداد هولد : 22 - کسری ساید گلس (22 پانچ/SACR-AD-INT-88051)	ردیف 20 جدول پانچ:
تعداد هولد : 1 - کسری سمبل کانکشن (1 پانچ/SACR-AD-INT-95220)	ردیف 21 جدول پانچ:
تعداد هولد : 1 - هندویل با چکر پلیت برخورد دارد (1 پانچ)	ردیف 23 جدول پانچ:
تعداد هولد : 7 - اجرای باکس عایقی برای ولوهای TRIM LINE (7 پانچ) - پیمانکار ندارد	ردیف 24 جدول پانچ:
تعداد هولد : 3 - تهیه ASBUILT (3 پانچ)	توضیحات 1 :
تعداد هولد : 41 - تگ تجهیز در مدارک نمیشود CC-501-002,PG-501-022,PT-501-123,TT-501-305 (4 پانچ)	
مغایرت پایپینگ و ابزار دقیق (36 پانچ)- در انتظار کالیبره شدن TSV-501-004 (1 پانچ)	
کسری FLEXIBLE HOSE تعداد 2 عدد میباشد (E-REQ-ME-0020)	

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	97%	0.1%	0.0%
PUNCH LIST CLEARANCE	84%	2.1%	2.0%
COMMISSIONING	6%	3.9%	3.4%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE

ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendo	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
	LPGT/CDS		84%	2%	2%	86%	93%	UOM	3,925	3,298	987	90	77	215	7	129	70	4	5	0	
1	آرمان آفاق	اجرای پاییبگ	93%	7%	7%	100%	100%	NO.	15	14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	بهبذ صنعت	اجرای برق	53%	33%	47%	100%	140%	NO.	15	8	7	5	7	0	0	0	0	0	0	0	
3	دانش مهر	اجرای سیویل	67%	33%	0%	67%	0%	NO.	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	جهان بین	مجموع رف پانچ	82%	3%	3%	84%	86%	NO.	884	721	163	29	25	134	0	97	32	0	5	0	
5	خلیلی	اجرای رنگ	95%	5%	2%	97%	47%	NO.	391	372	19	19	9	0	0	0	0	0	0	0	
6	مبین صنعت	مجموع رف پانچ	88%	0%	0%	88%	100%	NO.	1,620	1,423	197	8	8	61	2	24	35	0	0	0	
7	NO	اجرای استراکچر	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8	NO	اجرای سیویل	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	
9	اوبال	QC form	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	QC	تکمیل مدارک	1%	0%	0%	1%	0%	NO.	70	1	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	راژان	تکمیل مدارک	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	ستاره تراز	اجرای ابزار دقیق	87%	4%	4%	91%	100%	NO.	612	530	82	26	26	16	5	8	3	0	0	0	
13	ستاره تراز	اجرای برق	44%	0%	0%	44%	0%	NO.	16	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	ستاره تراز	اجرای پاییبگ	0%	50%	50%	50%	100%	NO.	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	تاپان تندیس	QC form	19%	0%	0%	19%	0%	NO.	73	14	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	تاپان تندیس	تکمیل مدارک	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMMISSIONING

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
	LPGT/CDS	5%	4%	3%	8%	92%	UOM	-	-	-	-	-	
1	BOXUP	70%	10%	10%	80%	100%	NO.	50	35	15	5	5	پرژ نیترژن: کل (20) و انجام شده (0)
2	FINAL ALIGNMENT	0%	28%	24%	24%	86%	NO.	25	0	25	7	6	
3	BLOWING / FLUSHING	0%	0%	0%	0%	0%	IM	37,840	0	37,840	0	0	پیمانکار ندارد
4	GROSS TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	15,352	0	15,352	0	0	پیمانکار ندارد
5	SERVICE TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	23,800	0	23,800	0	0	پیمانکار ندارد
6	LEAK TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	38,292	0	38,292	0	0	پیمانکار ندارد
7	STEAM OUT	0%	0%	0%	0%	0%	IM	17,833	0	17,833	0	0	پیمانکار ندارد
8	WATER CIRCULATION	0%	0%	0%	0%	0%	IM	18,491	0	18,491	0	0	پیمانکار ندارد
9	CHEMICAL LOADING	0%	0%	0%	0%	0%	M3	285	0	285	0	0	پیمانکار ندارد
10	MRT	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	36	0	36	0	0	نیاز به برق پایدار
11	OTP	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	36	0	36	0	0	نیاز به برق پایدار
12	LOOP CHECK	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	948	0	948	0	0	نیاز به برق پایدار
13	FREE RUN	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	26	0	26	0	0	نیاز به برق پایدار

CONCERNS

تعداد هولد : 2 - کسری کابل ارت (2 پانچ / SACR-AD-INT-88203)	ردیف 2 جدول پانچ:
تعداد هولد : 134 - تجهیز PG در کالیبره ریجکت شده است PG-555-009A,B,PG-517-406A (3 پانچ)	ردیف 4 جدول پانچ:
کسری تجهیز PG-555-003A,B,004A,B,008A,B,009A,B (8 پانچ / SACR-AD-INT-93334)	
کسری تجهیز PG-517-067B (1 پانچ/ SACR-AD-INT-93334) - کسری NAME PLATE مربوط به V-555-01 (1 پانچ)	
کسری سمپل کانکشن و فعالیتهای وابسته به کسری سمپل کانکشن (7 پانچ/ SACR-AD-INT-95220) - کسری گریس نیپل (1 پانچ/ خرید محلی)	
کسری فیلتر المنت و فعالیتهای وابسته به کسری فیلتر المنت (5 پانچ/ SACR-AD-INT-93748) - کسری فیلتر المنت تعداد 11 عدد میباشد	
هولد DAMAGE FLANGE (1 پانچ) - فعالیت وابسته به کسری فیلتر المنت (2 پانچ) - هولد پاسخ وندور (1 پانچ)	
وابسته به کسری فیلتر المنت (2 پانچ) - هولد پاسخ وندور (1 پانچ) - کسری سمپل کانکشن و فعالیت های وابسته (15 پانچ / SACR-AD-INT-95220)	
تعداد هولد : 61 - کسری سمپل کانکشن و فعالیت های وابسته (13 پانچ/ کسری COUPLING (7 پانچ/ SRQ-PI-0253)	ردیف 6 جدول پانچ:
کسری ساید گس (1 پانچ / SACR-AD-INT-88051) - ادامه مسیر فیوچر میباشد و باید بلایند شود (4 پانچ) - نیاز به FLANGE (2 پانچ)	
تفاوت بین ACTUATOR و BODY (1 پانچ) - فعالیتهای وابسته به کسری سمپل کانکشن (2 پانچ/ SACR-AD-INT-95220)	
فعالیهتهای وابسته به کسری ولو , BDV-517-031,018 (4 پانچ/ SACR-AD-INT-95491) - فعالیتهای وابسته به کسری ساید گس (5 پانچ)	
در انتظار جواب مهندسی در مورد ISO (1 پانچ/ شماره ایمیل 98280) - کسری ولو BDV-517-031,UV-555-001 (2 پانچ / SACR-AD-INT-88051)	
سری ساید گس (14 پانچ/ SACR-AD-INT-88051) - کسری سایدگس تعداد 17 عدد میباشد	
ولو در کالیبره ریجکت شده است LV-517-024,FV-517-007,SDV-517-030 (3 پانچ)	
تعداد هولد : 1 - فیکس کردن پله استراکچر (1 پانچ) - عدم تعیین پیمانکار	ردیف 7 جدول پانچ:
تعداد هولد : 3 - تکمیل فعالیت سیویل (3 پانچ) - عدم تعیین پیمانکار	ردیف 8 جدول پانچ:
تعداد هولد: 16 - مغایرت پاییبگ و ابزار دقیق (7 پانچ) - کسری ردیوسر (3 پانچ / SACR-AD-INT-96720/SRQ-IN-0010)	ردیف 12 جدول پانچ:
تجهیز در کالیبره ریجکت شده است PG-505-003 (1 پانچ) - تجهیز دیتا شیت ندارد FT-517-010 (1 پانچ) - نگ تجهیز در مدارک نمیباشد (4 پانچ)	
کسری FLEXIBLE HOSE تعداد 2 عدد میباشد (E-REQ-ME-0020)	توضیحات : 1

PUNCH LIST CLEARANCE

COMMISSIONING

CONCERNS

کسری FLEXIBLE (1 یانچ / SACR-AD-INT-98724)

هولڈ اجرای ترمیم لاین (1 پانچ / SRQ-PI-0303-AG SACR-AD-INT-99183)

تعداد هولڈ : 5 - وابستہ بہ کسری ساید گلس (4 پانچ)

تعداد هولڈ : 10 - کسی ساند گیس (10 بانچ / SACR-AD-INT-88051)

تعداد هولڈ : 1 - کسری استرینر (1 پانچ / SACR-AD-INT-88051) - کسری استرینر تعداد 2 عدد میباشد

تعداد هولڈ : 1 - اورفیس در بازسی ریجکت شدہ است FE-509-016 (1 پانچ)

تعداد هولڈ : 7 - کسری سمپل کانکشن و وابستہ بہ آن (7 پانچ / SACR-AD-INT-95220)

تعداد هولڈ : 1 - کسری گلوب ولو 2" (1 پانچ / SRQ-PI-303AG-99183)

تعداد هولد : 2 - کسری ولو PVS-509-011 (2 پانچ / SACR-AD-INT-92923) - طبق اعلام مهندس شاهانی تا اواخر 1404 قابلیت تامین ندارد

تعداد هولد : 13 - کسری کولینگ (10 پانچ / SACR-AD-INT-96720/SRQ-IN-0010) - تگ تجهیز در مدارک نمیشد LG-509-013

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	90%	0.1%	0.1%
PUNCH LIST CLEARANCE	97%	1.2%	0.9%
COMMISSIONING	0%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE

ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
INT			97%	1%	1%	98%	75%	UOM	942	884	58	11	8	5	0	1	0	4	0	0	
1	آرمان آفاق	اجرای پایپینگ	94%	0%	0%	94%	0%	NO.	102	96	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	آرمان آفاق	اجرای رنگ	92%	4%	4%	96%	100%	NO.	26	24	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
3	آرمان آفاق	اجرای سیویل	99%	0%	0%	99%	0%	NO.	160	159	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	آرمان آفاق	بولت و گسکت	97%	0%	0%	97%	0%	NO.	78	76	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	آرمان آفاق	تکمیل مدارک	89%	9%	9%	99%	100%	NO.	74	66	8	7	7	0	0	0	0	0	0	0	
6	آرمان آفاق	تمیز کاری	96%	0%	0%	96%	0%	NO.	50	48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	آرمان آفاق	سایپورت	95%	0%	0%	95%	0%	NO.	39	37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	آرمان آفاق	نصب ولو غیر کنترلی	89%	0%	0%	89%	0%	NO.	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	بردبران	اجرای سیویل	67%	33%	0%	67%	0%	NO.	9	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	دانش مهر	اجرای سیویل	13%	0%	0%	13%	0%	NO.	24	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	مبین صنعت	اجرای پایپینگ	99%	0%	0%	99%	0%	NO.	88	87	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
12	مبین صنعت	اجرای عایق	94%	0%	0%	94%	0%	NO.	34	32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	مبین صنعت	سایپورت	83%	0%	0%	83%	0%	NO.	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	NO	اجرای استراکچر	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	
15	NO	سایپورت	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
16	ستاره تاراز	اجرای برقی	60%	0%	0%	60%	0%	NO.	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMMISSIONING

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
	INT	0%	0%	0%	0%	-	UOM	-	-	-	-	-	
1	BLOWING / FLUSHING	0%	0%	0%	0%	0%	IM	123,020	0	123,020	0	0	
2	GROSS TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	167,221	0	167,221	0	0	پیمانکار ندارد
3	SERVICE TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	169,811	0	169,811	0	0	پیمانکار ندارد
4	LEAK TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	114,055	0	114,055	0	0	پیمانکار ندارد

CONCERNS

ردیف 11 جدول پانچ: تعداد هولد : 1 - در انتظار تکمیل لاینهای مقابل-فیوچر میباشد (1 پانچ)

ردیف 14 جدول پانچ: تعداد هولد : 3 - تکمیل استراکچر (3 پانچ) - عدم تعیین پیمانکار

ردیف 15 جدول پانچ: تعداد هولد : 1 - تکمیل سایپورت (1 پانچ) - عدم تعیین پیمانکار

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	97%	0.06%	0.05%
PUNCH LIST CLEARANCE	77%	5.9%	4.2%
COMMISSIONING	0%	5.8%	2.9%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

CONSTRUCTION												
ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			توضیحات
			تجمی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	
1	بهد صنعت	اجرای کاتودیک	72%	0%	0%	72%	0%	NO.	-	-	-	

PUNCH LIST CLEARANCE																					
ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
	TNK		77%	6%	4%	81%	72%	UOM	4,632	3,561	1,071	276	189	306	16	229	58	2	1	0	
1	آرمان آفاق	مجموع رفع پانچ	87%	1%	1%	88%	100%	NO.	482	419	63	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
2	بردبران	اجرای سیویل	82%	18%	0%	82%	0%	NO.	66	54	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	بهد صنعت	اجرای برق	10%	24%	24%	34%	100%	NO.	41	4	37	10	10	25	0	0	25	0	0	0	
4	دانش مهر	مجموع رفع پانچ	89%	11%	7%	95%	57%	NO.	690	611	79	79	45	0	0	0	0	0	0	0	
5	جهان بین	اجرای ابزار دقیق	91%	1%	1%	92%	100%	NO.	90	82	8	1	1	7	0	6	1	0	0	0	
6	جهان بین	اجرای استراکچر	82%	18%	18%	100%	100%	NO.	39	32	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	
7	جهان بین	اجرای پایپینگ	87%	7%	7%	93%	100%	NO.	30	26	4	2	2	2	0	1	1	0	0	0	
8	جهان بین	اجرای عایق	0%	100%	100%	100%	100%	NO.	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	جهان بین	اجرای مکانیکال	88%	8%	8%	96%	100%	NO.	282	248	34	22	22	12	2	2	8	0	0	0	
10	جهان بین	بولت و گسکت	24%	73%	73%	97%	100%	NO.	37	9	28	27	27	1	0	1	0	0	0	0	
11	جهان بین	تمیز کاری	83%	15%	15%	98%	100%	NO.	86	71	15	13	13	2	0	2	0	0	0	0	
12	جهان بین	راه اندازی	42%	31%	15%	56%	48%	NO.	255	106	149	79	38	70	0	60	9	0	1	0	
13	خلیلی	اجرای رنگ	82%	5%	5%	87%	100%	NO.	311	254	57	16	16	1	0	1	0	0	0	0	
14	مبین صنعت	مجموع رفع پانچ	80%	0%	0%	80%	100%	NO.	1,510	1,212	298	1	1	30	0	17	13	0	0	0	
15	NO	اجرای استراکچر	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
16	NO	اجرای پایپینگ	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	
17	NO	اجرای رنگ	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
18	QC	تکمیل مدارک	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	ستاره نفت	تکمیل مدارک	10%	0%	0%	10%	0%	NO.	10	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	ستاره تاراز	اجرای ابزار دقیق	41%	0%	0%	41%	100%	NO.	318	129	189	1	1	151	14	136	1	0	0	0	
21	ستاره تاراز	اجرای پایپینگ	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	تاپان تندیس	QC form	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMMISSIONING													
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
	TNK	0%	6%	3%	3%	51%	UOM	-	-	-	-	-	
1	BOXUP	0%	68%	28%	28%	41%	NO.	25	0	25	17	7	پرژ نیترژن: کل (4) و انجام شده (0)
2	FINAL ALIGNMENT	0%	46%	25%	25%	54%	NO.	28	0	28	13	7	
3	BLOWING / FLUSHING	0%	0%	0%	0%	0%	IM	242,455	0	242,455	0	0	پیمانکار ندارد
4	GROSS TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	148,359	0	148,359	0	0	پیمانکار ندارد
5	SERVICE TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	229,583	0	229,583	0	0	پیمانکار ندارد
6	LEAK TEST	0%	0%	0%	0%	0%	IM	126,595	0	126,595	0	0	پیمانکار ندارد
7	STEAM OUT	0%	0%	0%	0%	0%	IM	6,666	0	6,666	0	0	پیمانکار ندارد
8	CHEMICAL LOADING	0%	0%	0%	0%	0%	M3	14	0	14	0	0	پیمانکار ندارد
9	MRT	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	50	0	50	0	0	نیاز به برق پایدار
10	OTP	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	50	0	50	0	0	نیاز به برق پایدار
11	LOOP CHECK	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	850	0	850	0	0	نیاز به برق پایدار
12	FREE RUN	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	42	0	42	0	0	نیاز به برق پایدار

CONCERNS		
ردیف 3 جدول پانچ:	تعداد هولد: 25 -	کسری کابل ارت (25 پانچ / SACR-AD-INT-88203)
ردیف 5 جدول پانچ:	تعداد هولد: 7 -	پس از اجرای فنس (6 پانچ) - کسری تجهیز 003 , PG-002 (1 پانچ)
ردیف 7 جدول پانچ:	تعداد هولد: 2 -	پس از اجرای فنس (1 پانچ) - کسری اسپول (1 پانچ)
ردیف 9 جدول پانچ:	تعداد هولد: 12 -	کسری گریس نیپل (4 پانچ/خرید محلی) - کسری سمپل کانکشن (2 پانچ/SACR-AD-INT-95220)
		هولد سندبلاست مخازن کروی (2 پانچ) - کسری CALIBRATION POT مربوط به 530-01 PK (1 پانچ/SRQ-ME-0172-REV01)
		کسری های پکیج 1PK-520-07 (1 پانچ/SACR-AD-L-05671) - هولد مدرک جانمایی سمپل کولر (2 پانچ)
ردیف 10 جدول پانچ:	تعداد هولد: 1 -	پس از سند بلاست مخازن کروی (1 پانچ)
ردیف 11 جدول پانچ:	تعداد هولد: 2 -	پس از سند بلاست مخازن کروی (2 پانچ)
ردیف 13 جدول پانچ:	تعداد هولد: 1 -	ادامه مسیر فیوچر میباشد (1 پانچ)
ردیف 14 جدول پانچ:	تعداد هولد: 30 -	کسری کولپینگ (9 پانچ / SRQ-PI-0253) - ادامه مسیر فیوچر میباشد (10 پانچ)
		نصب ساپورت پس از اجرای پیوینگ (2 پانچ) - کسری استراکچر 530-01,PR-522-01 (4 پانچ/SRQ-CV-0553)
ردیف 15 تا 17 جدول پانچ:	تعداد هولد: 5 -	فعالیهای فیوچر (3 پانچ) - بازرسی داخلی مخازن کروی (2 پانچ)
ردیف 20 جدول پانچ:	تعداد هولد: 151 -	نصب تجهیزات ابزار دقیق پس از اجرای فنس (135 پانچ) - کسری تجهیز 530-081 PT (1 پانچ)
		تجهیز نیاز به نصب PROTECTOR دارد 530-021A,B,PG-530-040B,048A,B,088B,096B,PG-520-035 (12 پانچ)
		تگ تجهیز در مدارک نمیشد 530-511,LG-530-064,PG-520-064 (2 پانچ) - هولد کالیبراسیون تجهیز 520-076 TSV

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	95%	0.4%	0.0%
PUNCH LIST CLEARANCE	29%	1.2%	1.2%
COMMISSIONING	0%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE																					
ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
S35			29%	1%	1%	30%	100%	UOM	86	25	61	1	1	59	0	0	0	55	4	0	
1	بهد صنعت	اجرای برق	83%	17%	17%	100%	100%	NO.	6	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	NO	QC form	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3	NO	اجرای HVAC	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	8	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	
4	NO	اجرای ابزار دقیق	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	
5	NO	اجرای برق	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	21	0	21	0	0	21	0	0	0	21	0	0	
6	NO	اجرای رنگ	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	6	0	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	
7	NO	اجرای معماری	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	15	0	15	0	0	15	0	0	0	15	0	0	
8	ستاره تاراز	اجرای برق	92%	0%	0%	92%	0%	NO.	12	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	وندور	اجرای برق	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	

COMMISSIONING													
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	توضیحات
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			
	S35	-	-	-	-	-	UOM	-	-	-	-	-	
1	EARTH IN SERVICE	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0	
2	POWER TRANSFORMER	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0	
3	HV,LV SWITCH BORD /MCC	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0	
4	AC UPS ENERGIZING- CHARGE/DE CHARGE	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0	
5	LIGHTING & SMALL POWER ON	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0	
	ITR35	-	-	-	-	-	UOM	-	-	-	-	-	
1	CLEAN EARTH IN SERVICE	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0	
2	VENDOR ATENDANCE (NEDA)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0	
3	PANEL ENERGIZING	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0	
4	ITR IN SERVICE	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0	

CONCERNS

ردیف های 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 : تعداد هولد 55 - : پس از تعیین متولی انجام میشود (55 پانچ)
ردیف 9 جدول پانچ: تعداد هولد : 4 - در انتظار حضور وندور جهت تعویض پیچ و مهره رنگ زده ترانس(3 پانچ)- در انتظار حضور وندور جهت نصب فیدر اضافه (1 پانچ)
توضیحات 1 : تعداد کسری یراق آلات درب 3 عدد میباشد (SRQ-CV-0607)

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	89%	0.1%	0.0%
PUNCH LIST CLEARANCE	13%	25.0%	8.3%
COMMISSIONING	0%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

PUNCH LIST CLEARANCE																					
ردیف	اقدام کننده	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	TOTAL HOLD	HoldEng	HoldOther	HoldMat	HoldSubC	HoldVendor	HoldTools	
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده										
S55			13%	25%	8%	21%	33%	UOM	24	3	21	6	2	15	0	0	0	15	0	0	
1	آویشن	QC form	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	4	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	
2	NO	اجرای معماری	0%	0%	0%	0%	0%	NO.	11	0	11	0	0	11	0	0	0	11	0	0	
3	صفرزاده	اجرای رنگ	0%	100%	0%	0%	0%	NO.	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	صفرزاده	اجرای معماری	25%	75%	50%	75%	67%	NO.	4	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	
5	سوری	اجرای معماری	50%	50%	0%	50%	0%	NO.	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

CONCERNS																
ردیف 1 جدول پانچ: تعداد هولد : 4 - پیمانکار ندارد (4 پانچ)																
ردیف 2 جدول پانچ: تعداد هولد : 11 - پس از تعیین متولی انجام میشود (11 پانچ)																
توضیحات 1 : تعداد کسری یراق آلات درب 2 عدد میباشد (SRQ-CV-0607)																

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	78%	6.8%	2.8%
PUNCH LIST CLEARANCE	0%	0.00%	0.00%
COMMISSIONING	0%	0.00%	0.00%
STARTUP	0%	0.00%	0.00%

CIVIL

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	توضیحات	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	سیویل	78%	7%	3%	81%	77%	-	-										
1	اجرای دیچ WWT	66%	25%	25%	91%	100%	-	حجم کل: 1000 متر / انجام شده تا ماه قبل: 620 متر / پلن ماه: 250 متر										
2	دیوار بتنی WWT	75%	25%	0%	75%	0%	-	تکمیل دیوار در تراز بالا										
3	بلوک چینی و پیوینگ کف ساب 65	40%	60%	60%	100%	100%	-	انجام شد										
4	فنس کشی WWT	0%	100%	40%	40%	40%	-											
5	پیوینگ WWT	70%	25%	25%	95%	100%	-	انجام شد										
6	سنگ چینی غرب پلیرک WWT	83%	0%	0%	83%	NO PLAN	-											
7	اجرای سقف و کف کاذب	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از تامین متریال										
8	گراول پیوینگ WWT	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از تکمیل پایپینگ و برق آبران زلال										
9	سابورت (پیوینگ)	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از اجرای پیوینگ										

PIPING AG

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	پایپینگ	77%	17%	4%	81%	25%	-															
1	فیت آب و جوش	94%	6%	2%	96%	40%	ID	3,800	3,418	382	382	153										
2	تست	0%	100%	40%	40%	40%	IM	2,685	0	2,685	2,685	1,071										
3	رینستیت	0%	50%	0%	0%	0%	IM	2,685	0	2,685	1,343	0										

ELECTRICAL

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	اجرای برق	-	-	-	-	43%	-	-	-	-	-	-										
1	اجرای سابورت	80%	20%	20%	100%	100%	KG	1,597	1,200	397	397	397										
2	اجرای سینی	38%	62%	15%	53%	14%	ML	249	94	155	155	21										
3	اجرای کاندولیت	0%	100%	0%	0%	0%	ML	603	0	603	603	0										
4	نصب چراغ روشنایی	100%	0.0%	0%	100%	DONE	PCS	24	24	0	0	0										
5	اجرای کابل روشنایی	0%	100%	83%	83%	83%	ML	605	0	605	605	500										
6	اجرای کابل پاور	60%	40%	40%	100%	100%	ML	6,967	3,260	3,707	3,707	3,707										
7	نصب JB	100%	0%	0%	100%	DONE	PCS	13	13	0	0	0										
8	نصب LCS	100%	0.0%	0%	100%	DONE	PCS	37	37	0	0	0										
9	نصب LV SWITCHGEAR PANEL	0%	100%	0%	0%	0%	PCS	4	0	4	4	0										
10	نصب PANEL HEATER	0%	100%	100%	100%	100%	PCS	1	0	1	1	1										
11	اجرای کابل ارت	0%	100%	0%	0%	0%	PCS	320	0	320	320	0										
12	اجرای گنند	0%	100%	0%	0%	0%	PCS	152	0	152	152	0										
13	اجرای کانکشن	0%	100%	0%	0%	0%	PCS	152	0	152	152	0										
14	اجرای کابل ارت (بهبه صنعت)	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	PCS	-	-	-	-	-										

INSTRUMENT

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ابزار دقیق	-	-	-	-	25%	-	-	-	-	-	-										
1	اجرای سابورت	73%	27%	17%	90%	64%	KG	600	437	163	163	105										
2	اجرای سینی	57%	43%	0%	57%	0%	ML	95	54	41	41	0										
3	اجرای کاندولیت	0%	100%	0%	0%	0%	ML	520	0	520	520	0										
4	نصب تجهیزات	0%	100%	0%	0%	0%	PCS	71	0	71	71	0										
5	نصب JB	21%	79%	57%	79%	82%	ML	14	3	11	11	9										
6	اجرای تیوب	0%	100%	0%	0%	0%	ML	165	0	165	165	0										
8	اجرای کابل ارت	0%	100%	0%	0%	0%	PCS	110	0	110	110	0										
9	اجرای کابل ابزار دقیق	0%	100%	65%	65%	65%	PCS	1,767	0	1,767	1,767	1,140										
7	نصب PANEL	0%	100%	0%	0%	0%	PCS	1	0	1	1	0										
10	اجرای گنند	0%	100%	0%	0%	0%	PCS	122	0	122	122	0										
11	اجرای کانکشن	0%	100%	0%	0%	0%	PCS	168	0	168	168	0										

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	42%	28.04%	21.6%
PUNCH LIST CLEARANCE	0%	0.00%	0.00%
COMMISSIONING	0%	0.00%	0.00%
STARTUP	0%	0.00%	0.00%

CIVIL

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	توضیحات	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	سیویل	88%	11%	5%	92%	47%	-											
1	حفر چاه	63%	37%	17%	80%	45%	-	در انتظار تعمیر مجدد دستگاه ویر										
2	بلوک چینی و پیوینگ کف ساب	0%	100%	100%	100%	100%	-											
3	فنس کشی محدوده آب شیرین کن	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از تکمیل حفاری چاه										
4	اجرای سقف و کف کاذب	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از تامین متریال										

PIPING AG

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پن ماه	انجام شده ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	فیت آب و جوش	0%	18%	0%	0%	0%	-															
1	فیت آب و جوش	0%	30%	0%	0%	0%	ID	4,000	0	4,000	1,200	0										
2	تست	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	IM	5,000	0	5,000	0	0										
3	رینستیت	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	IM	5,000	0	5,000	0	0										

PAINT & INSULATION

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پن ماه	انجام شده ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	اجرای رنگ و عایق	0%	0%	0%	0%	0%	-															
1	اجرای رنگ	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	0	0	0	0	0										
2	اجرای عایق	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	0	0	0	0	0										

MECHANICAL

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پن ماه	انجام شده ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	مکانیکال	3%	72%	57%	60%	80%	-	-	-	-	-	-										
1	نصب تجهیزات آب شیرین کن	0%	89%	72%	72%	80%	-	0	0	0	0	0										
2	اجرای لوله کشی و تاسیسات ساختمان	15%	0%	0%	15%	NO PLAN	-	0	0	0	0	0										

ELECTRICAL

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پن ماه	انجام شده ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	اجرای برق و ابزار دقیق	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-										

CONCERNS

EXPORT LINE / RO LINE

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	23%	1.6%	0.7%
PUNCH LIST CLEARANCE	0%	0.0%	0.0%
COMMISSIONING	0%	0.0%	0.0%
STARTUP	0%	0.0%	0.0%

CIVIL																		
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	توضیحات	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون	0%			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	سیویل	20%	0%	0%	20%	0%	-											
1	S5 - PB 02 -	0%	0%	0%	0%	0%	-	پس از اخذ مجوز										
2	S6 - CULVER 04	0%	0%	0%	0%	0%	-	پس از اخذ مجوز										
3	S7-SLEEPER-CUL 04 TO CUL 05	0%	0%	0%	0%	0%	-	پس از اخذ مجوز										
4	S8 - CULVERT 05	0%	0%	0%	0%	0%	-	پس از اخذ مجوز										
5	S9 - CULVERT 06	0%	0%	0%	0%	0%	-	پس از اخذ مجوز										
6	S10-CULVER 06 TO JETTY	0%	0%	0%	0%	0%	-	پس از اخذ مجوز										

PIPING AG																						
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق 41%	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه انجام شده ماه	انجام شده ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	فیت آب و جوش	43%	10%	4%	47%	41%	ID	18,497	7,962	10,535	1,790	728										
1	خط نفتا (30 اینچ)	27%	0%	0%	27%	NO PLAN	ID	6,315	2,525	3,790	0	0										
2	خط نفتا (28 اینچ)	28%	0%	0%	28%	NO PLAN	ID	5,493	2,441	3,052	0	0										
3	خط برگشتی (8 اینچ)	34%	1%	1%	35%	44%	ID	2,884	1,207	1,677	45	20										
4	خط آب شیرین کن (6 اینچ)	53%	37%	18%	71%	38%	ID	1,654	725	929	780	300										
5	خط آب شیرین کن (8 اینچ)	49%	45%	20%	68%	42%	ID	2,151	1,064	1,087	965	408										
	هیدروتست	23%	0%	0%	23%	0%	IM	121,738	27,643	94,095	0	0										
6	خط نفتا (30 اینچ)	32%	0%	0%	32%	NO PLAN	ID	47,984	11,481	36,503	0	0										
7	خط نفتا (28 اینچ)	33%	0%	0%	33%	NO PLAN	ID	42,586	11,040	31,546	0	0										
8	خط برگشتی (8 اینچ)	34%	0%	0%	34%	NO PLAN	ID	12,629	3,307	9,322	0	0										
9	خط آب شیرین کن (6 اینچ)	43%	0%	0%	43%	NO PLAN	IM	8,035	753	7,282	0	0										
10	خط آب شیرین کن (8 اینچ)	40%	0%	0%	40%	NO PLAN	IM	10,504	1,062	9,442	0	0										
	رینستیت	22%	1%	0%	22%	0%	IM	121,738	26,890	36,503	753	0										
11	خط نفتا (30 اینچ)	32%	0%	0%	32%	NO PLAN	ID	47,984	11,481	36,503	0	0										
12	خط نفتا (28 اینچ)	33%	0%	0%	33%	NO PLAN	ID	42,586	11,040	31,546	0	0										
13	خط برگشتی (8 اینچ)	34%	0%	0%	34%	NO PLAN	ID	12,629	3,307	9,322	0	0										
14	خط آب شیرین کن (6 اینچ)	0%	9%	0%	0%	0%	IM	8,035	0	8,035	753	0										
15	خط آب شیرین کن (8 اینچ)	10%	0%	0%	10%	NO PLAN	IM	10,504	1,062	9,442	0	0										

EQUIPMENT																						
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون	۰%		حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	تجهیزات خط صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

ELECTRICAL																						
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون	0 %		حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	اجرای برق و ابزار دقیق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

CONCERNS													
طبق دستور مدیریت مقرر شد گزارش گمانه های اجرا شده در محدوده مترینگ اسکله صادراتی از پیمانکار مربوطه (آزمایشگاه اداره راه) اخذ گردد													
کسری لوله برای خط صادرات : سایز 30" (576.5 متر) - سایز 28" (679.5 متر) - سایز 8" (691.7 متر) - (SRQ-PI-0255-AG)													
کسری لوله آب شیرین کن: سایز 6" (240.3 متر) - سایز 8" (238.1 متر) - (E-REQ-PI-066)													
کسری 2 عدد GATE VALVE 300# د (SRQ-GEN-009B-VALVE)													
توضیحات 1 :													
توضیحات 2 :													
توضیحات 3 :													
توضیحات 4 :													

DESCRIPTION	LAST MONTH %	PLAN THIS MONTH %	ACTUAL THIS MONTH %
CONSTRUCTION	9%	2.40%	1.57%
PUNCH LIST CLEARANCE	0%	0.00%	0.00%
COMMISSIONING	0%	0.00%	0.00%
STARTUP	0%	0.00%	0.00%

PIPING UG

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق 48%	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404											
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	فیت آپ و جوش	48%	36.1%	29%	77%	80%	ID	9,311	4,488	4,823	3,359	2,702												
1	فیت آپ و جوش	48%	36%	29%	77%	80%	ID	9,311	4,488	4,823	3,359	2,702												
	تست	4%	89%	0%	4%	0%	IM	17,649	709	16,940	15,740	0												
2	تست	4%	89%	0%	4%	0%	IM	17,649	709	16,940	15,740	0												
	رینستیت	0%	50%	0%	0%	0%	IM	17,649	0	17,649	8,825	0												
3	رینستیت	0%	50%	0%	0%	0%	IM	17,649	0	17,649	8,825	0												

PIPING AG

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404											
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	فیت آپ و جوش	0%	0%	0%	0%	0%	ID	0	0	0	0	0												
1	فیت آپ و جوش	0%	0%	0%	0%	0%	ID	0	0	0	0	0												
	تست	0%	0%	0%	0%	0%	IM	0	0	0	0	0												
2	تست	0%	0%	0%	0%	0%	IM	0	0	0	0	0												
	رینستیت	0%	0%	0%	0%	0%	ID	0	0	0	0	0												
3	رینستیت	0%	0%	0%	0%	0%	ID	0	0	0	0	0												

CATHODIC

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق %	واحد	تا پایان ماه گذشته			انجام شده ماه	پلن ماه	1404										
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	اجرای کاتودیک و ارت UG	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0											
1	اجرای کاتودیک	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0											
2	اجرای کابل ارت UG	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0											

CIVIL

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق %	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404											
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	سیویل	62%	0%	0%	62%	0%	-	0	0	0	0	0												
1	اجرای ترنج	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0												
2	اجرای دیچ	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0												
2	اجرای فونداسیون	61%	0%	0%	61%	0%	-	0	0	0	0	0												
3	اجرای داکت بانک	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0												

STRUCTURE

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	استراکچر	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

MECHANICAL

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	مکانیکال	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

ELECTRICAL

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	اجرای برق و ابزار دقیق	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

CIVIL & OTHER ACTIVITY

CIVIL																		
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق 63%	واحد	توضیحات	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	سیویل	-	-	-	-	63%	-											
1	دیج پیرامونی INT	96%	3%	2%	98%	85%	-	امتداد ورودی ایستگاه گاز - شمال ساختمان حراست - دیج پشت دفاتر اداری - دیج جلوی انبار متریال										
2	دیج پیرامونی TNK	98%	2%	0%	98%	0%	-	تکمیل دیج های باقیمانده										
3	گراول پیوینگ INT	65%	5%	0%	65%	8%	-	گراول ریزی واحد INT										
4	گراول پیوینگ TNK	11%	20%	9%	20%	45%	-	گراول ریزی واحد TNK										
5	سنگ چینی شرق فلر	45%	45%	45%	90%	100%	-	سنگ چینی شرق فلر										
6	دیوار حائل ساختمان حراست	85%	15%	15%	100%	100%	-	تکمیل بخش جنوبی دیوار										
7	کلین اوت های کل سایت	87%	13%	0%	87%	0%	-	تعداد کل : 41 / انجام شده ماه قبل : 15										
8	فونداسیون های پیش نیاز الکتریکال	94%	3%	1%	95%	30%	-	اجرای 15 عدد فونداسیون در کل سایت										
9	گراول / پیوینگ شرق ساب 35	0%	100%	0%	0%	0%	-											
10	اجرای ساپورت شمال اسلیر B	0%	100%	100%	100%	100%	-											
11	ساخت اسلب	90%	5%	4%	94%	90%	-											
12	اجرای دیج WWT	66%	25%	25%	91%	100%	-	حجم کل: 1000 متر / انجام شده تا ماه قبل: 620 متر / پلن ماه: 250 متر										
13	دیوار بتنی WWT	75%	25%	0%	75%	0%	-	تکمیل دیوار در تراز بالا										
14	بلوک چینی و پیوینگ کف ساب 65	40%	60%	60%	100%	100%	-	انجام شد										
15	فنس کشی WWT	0%	100%	40%	40%	40%	-	در حال ساخت و نصب پایه و اجرای توری فنس										
16	پیوینگ WWT	70%	25%	25%	95%	100%	-	انجام شد										
17	حفر چاه	63%	37%	17%	80%	45%	-	در انتظار تعمیر مجدد دستگاه ویر										
18	بلوک چینی و پیوینگ کف ساب	0%	100%	100%	100%	100%	-	انجام شد										
19	کانیو	90%	0%	0%	90%	NO PLAN	-	بدلیل عدم تکمیل کابل کشی های شمال TNK قابل پلن نمیشد										
20	سقف و کف کاذب ساختمان آزمایشگاه	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از تامین متریال										
21	سقف و کف کاذب ساختمان نگهبانی	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از تامین متریال										
22	رنگ ساختمان نگهبانی	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از تامین متریال										
23	پایه رو اطراف ساختمان نگهبانی	70%	0%	0%	70%	NO PLAN	-	پس از تکمیل دیوار										
24	فونداسیون دیزل ژنراتور ساب 35	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	نقشه AFC نشده است										
25	فونداسیون دیزل ژنراتور ساب 55	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	نقشه AFC نشده است										
26	فونداسیون دیزل ژنراتور ساب 65	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	نقشه AFC نشده است										
27	آسفالت کل سایت	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-											
28	سنگ چینی غرب پایپرک WWT	83%	0%	0%	83%	NO PLAN	-											
29	اجرای سقف و کف کاذب	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از تامین متریال										
30	گراول پیوینگ WWT	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از تکمیل پایپینگ و برق آسان زلال										
31	ساپورت (پیوینگ)	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از اجرای پیوینگ										
32	فنس کشی محدوده آب شیرین کن	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-	پس از تکمیل حفاری چاه										
33	اجرای سقف و کف کاذب	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	-											

PAINT

ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق 100%	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	لترینگ	71%	15%	15%	86%	100%	NO	17,000	12,044	4,956	2,507	2,507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

SAFETY																						
ردیف	فعالیت	پیشرفت				تحقق 100%	واحد	تا پایان ماه گذشته			انجام شده ماه	پلن ماه	1404									
		تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	اجرای لوله آب آتشنشانی در انبار کالا	0%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-										
2	نصب HOSE REEL در انبار کالا	0%	100%	100%	100%	100%	NO.	2	0	2	2	2										

ELECTRICAL

ردیف	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 100%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1404			
				تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	1	2	3	4
مجموع			Control Cable	100%	0%	0%	100%	100%	ML	111,718	111,642	76	38	38				
20	EL	UTL	Control Cable	100%	0%	0%	100%	100%	ML	17,185	17,109	76	38	38				
مجموع			LV Cable	100%	0%	0%	100%	0%	ML	124,590	123,995	595	0	0				
21	EL	S35	LV Cable	98%	0%	0%	98%	0%	ML	9,219	9,071	148	0	0				
22	EL	S55	LV Cable	88%	0%	0%	88%	0%	ML	3,589	3,142	447	0	0				
مجموع			MV + HV Cable	100%	0%	0%	100%	0%	ML	24,887	24,887	0	0	0				
مجموع			Lighting Cable	98%	0%	0%	98%	0%	ML	87,087	85,070	2,017	0	0				
25	EL	TNK	Lighting Cable	96%	0%	0%	96%	0%	ML	22,851	21,883	969	0	0				
26	EL	INT	Lighting Cable	95%	0%	0%	95%	0%	ML	20,695	19,647	1,049	0	0				
مجموع			Heat Tracing Cabling	27%	0%	0%	27%	0%	ML	9,178	2,442	6,736	0	0				
27	EL	LPG	Heat Tracing Cabling	24%	0%	0%	24%	0%	ML	3,748	912	2,836	0	0				
28	EL	TNK	Heat Tracing Cabling	0%	0%	0%	0%	0%	ML	1,320	0	1,320	0	0				
29	EL	INT	Heat Tracing Cabling	37%	0%	0%	37%	0%	ML	3,955	1,455	2,500	0	0				
30	EL	SWS	Heat Tracing Cabling	48%	0%	0%	48%	0%	ML	155	75	80	0	0				
مجموع			Earthing Cable	83%	0%	0%	83%	100%	ML	9,467	7,859	1,607	39	39				
31	EL	S55	Earthing Cable	22%	0%	0%	22%	0%	ML	515	112	403	0	0				
32	EL	C35	Earthing Cable	83%	0%	0%	83%	0%	ML	118	98	20	0	0				
33	EL	CDU	Earthing Cable	81%	1%	1%	82%	100%	ML	1,600	1,294	306	11	11				
34	EL	LPG	Earthing Cable	99%	0%	0%	99%	0%	ML	1,230	1,214	16	0	0				
35	EL	TNK	Earthing Cable	37%	0%	0%	37%	0%	ML	600	220	380	0	0				
36	EL	INT	Earthing Cable	79%	1%	1%	81%	100%	ML	2,350	1,868	482	28	28				
مجموع			Installation Supports	97%	0%	0%	97%	100%	KG	65,703	63,876	1,827	148	148				
56	EL	TNK	Installation Supports	87%	0%	0%	87%	100%	KG	13,000	11,342	1,658	31	31				
57	EL	INT	Installation Supports	98%	0%	1%	99%	100%	KG	6,000	5,872	128	76	76				
62	EL	S35	Installation Supports	100%	0%	0%	100%	100%	KG	11,478	11,438	41	41	41				
مجموع			Installation of Conduit	99%	0%	0%	99%	100%	ML	25,738	25,484	254	35	35				
37	EL	TNK	Conduit	96%	0%	0%	96%	100%	ML	5,150	4,948	202	7	7				
38	EL	INT	Conduit	99%	1%	1%	99%	100%	ML	3,350	3,308	42	19	19				
47	EL	UTL	Conduit	90%	0%	0%	90%	100%	ML	4,399	4,389	10	10	10				
مجموع			Installation Tray, ladder	99%	1%	1%	99%	100%	ML	9,697	9,588	109	60	60				
73	EL	S35	Primary Tray, ladder	97%	3%	3%	100%	100%	ML	311	302	9	9	9				
39	EL	UTL	Primary Tray, ladder	82%	18%	18%	100%	100%	ML	432	381	51	51	51				
40	EL	TNK	Secondary Tray	95%	0%	0%	95%	0%	ML	1,000	951	49	0	0				
مجموع			Covers OF Tray, ladder	50%	1%	1%	51%	100%	ML	8,805	4,381	4,424	105	105				
93	EL	LPG	Covers Primary Tray, ladder	49%	0%	0%	49%	0%	ML	268	132	137	0	0				
94	EL	TNK	Covers Primary Tray, ladder	0%	0%	0%	0%	0%	ML	1,704	0	1,704	0	0				
95	EL	INT	Covers Primary Tray, ladder	54%	0%	0%	54%	0%	ML	3,195	1,716	1,479	0	0				
97	EL	UTL	Covers Primary Tray, ladder	46%	28%	28%	74%	100%	ML	318	213	105	105	105				
102	EL	TNK	Covers Secondary Tray	0%	0%	0%	0%	0%	ML	1,000	0	1,000	0	0				
مجموع			Lighting Poles	98%	0%	0%	98%	0%	No	1,379	1,349	30	0	0				
41	EL	TNK	Lighting Pole Of Flourescent	98%	0%	0%	98%	0%	No	307	302	5	0	0				
42	EL	TNK	Lighting Pole Of Street	96%	0%	0%	96%	0%	No	45	43	2	0	0				
43	EL	INT	Lighting Pole Of Street	86%	0%	0%	86%	0%	No	167	144	23	0	0				
مجموع			Fixture Lighting	98%	0%	0%	98%	0%	No	2,451	2,402	49	0	0				
44	EL	TNK	Fixture Of Street Lighting	96%	0%	0%	96%	0%	No	214	206	8	0	0				
45	EL	INT	Fixture Of Street Lighting	88%	0%	0%	88%	0%	No	240	212	28	0	0				
46	EL	TNK	Fixture Of Flourescent	97%	0%	0%	97%	0%	No	383	370	13	0	0				
مجموع			JB Installation	96%	0%	0%	96%	0%	No	940	904	36	0	0				
47	EL	TNK	JB Of Street Lighting	98%	0%	0%	98%	0%	No	180	176	4	0	0				
48	EL	INT	JB Of Street Lighting	87%	0%	0%	87%	0%	No	201	175	26	0	0				
49	EL	TNK	JB Of Flourescent Fixture	95%	0%	0%	95%	0%	No	126	120	6	0	0				
مجموع			Lighting Socket	100%	0%	0%	100%	0%	No	66	66	0	0	0				
مجموع			Gland Installation	94%	0%	0%	94%	100%	No	8,640	8,084	556	42	42				
50	EL	S35	Power Gland	88%	0%	0%	88%	0%	No	464	408	56	0	0				
51	EL	S55	Power Gland	29%	0%	0%	29%	0%	No	164	47	117	0	0				
52	EL	LPG	Power Gland	98%	0%	0%	98%	0%	No	97	95	2	0	0				
53	EL	TNK	Power Gland	77%	0%	0%	77%	0%	No	300	232	68	0	0				
54	EL	INT	Power Gland	59%	0%	0%	59%	0%	No	17	10	7	0	0				
55	EL	UTL	Power Gland	93%	0%	1%	93%	100%	No	284	263	21	2	2				
56	EL	FLS	Power Gland	92%	0%	0%	92%	0%	No	36	33	3	0	0				
57	EL	SWS	Power Gland	94%	0%	0%	94%	0%	No	33	31	2	0	0				

ELECTRICAL

به دلیل عدم تخصیص حد نصاب نیروهای تعیین شده توسط پیمانکار ستاره تاراز تا کنون ،
اکشن پلن ماهیانه از خرداد ماه بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی منظور خواهد شد
طی زمان باقیمانده تا پایان اردیبهشت تنها فعالیتهای در حال انجام پیمانکار منعکس میگردد

ELECTRICAL

ردیف	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 100%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1404			
				تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	1	2	3	4
59	EL	LPG	Lighting Gland	100%	0%	0%	100%	0%	No	970	966	4	0	0				
60	EL	UTL	Lighting Gland	95%	4%	4%	100%	100%	No	850	810	40	37	37				
61	EL	INT	Lighting Gland	90%	0%	0%	90%	100%	No	1,514	1,367	147	3	3				
62	EL	TNK	Lighting Gland	95%	0%	0%	95%	0%	No	1,826	1,737	89	0	0				
مجموع			Termination	92%	1%	1%	92%	100%	Set	10,072	9,244	828	57	57				
63	EL	S35	Termination Of Power	94%	0%	0%	94%	100%	Set	1,013	949	64	1	1				
64	EL	S55	Termination Of Power	11%	4%	4%	15%	100%	Set	380	42	338	14	14				
65	EL	LPG	Termination Of Power	98%	0%	0%	98%	0%	Set	176	173	3	0	0				
66	EL	TNK	Termination Of Power	82%	0%	0%	82%	0%	Set	406	333	73	0	0				
67	EL	INT	Termination Of Power	77%	0%	0%	77%	0%	Set	30	23	7	0	0				
68	EL	FWS	Termination Of Power	99%	0%	0%	99%	0%	Set	94	93	1	0	0				
69	EL	UTL	Termination Of Power	84%	0%	1%	85%	100%	Set	355	298	57	2	2				
70	EL	FLS	Termination Of Power	93%	0%	0%	93%	0%	Set	44	41	3	0	0				
71	EL	SWS	Termination Of Power	97%	0%	0%	97%	0%	Set	62	60	2	0	0				
73	EL	LPG	Termination Of Lighting	100%	0%	0%	100%	0%	Set	970	966	4	0	0				
74	EL	UTL	Termination Of Lighting	95%	4%	4%	100%	100%	Set	850	810	40	37	37				
75	EL	INT	Termination Of Lighting	90%	0%	0%	90%	100%	Set	1,514	1,367	147	3	3				
76	EL	TNK	Termination Of Lighting	95%	0%	0%	95%	0%	Set	1,826	1,737	89	0	0				
مجموع			Installation of Generator	0%	0%	0%	0%	0%	No	2	0	2	0	0				
191	EL	S35	Installation of Generator	0%	0%	0%	0%	0%	No	1	0	1	0	0				
192	EL	S55	Installation of Generator	0%	0%	0%	0%	0%	No	1	0	1	0	0				
مجموع			Local Control Station	100%	0%	0%	100%	0%	No	176	176	0	0	0				
مجموع			Panels	96%	0%	0%	96%	0%	No.	320	306	14	0	0				
77	EL	LPG	Electrical Panel	86%	0%	0%	86%	0%	No.	7	6	1	0	0				
78	EL	TNK	Electrical Panel	69%	0%	0%	69%	0%	No.	26	18	8	0	0				
79	EL	INT	Electrical Panel	77%	0%	0%	77%	0%	No.	13	10	3	0	0				
80	EL	UTL	Electrical Panel	88%	0%	0%	88%	0%	No.	16	14	2	0	0				
مجموع			Motor Free Run	0%	2%	2%	2%	100%	No	198	0	198	4	4				

INSTRUMENT

به دلیل عدم تخصیص حد نصاب نیروهای تعیین شده توسط پیمانکار ستاره تاراز تا کنون ،
اکشن پلن ماهیانه از خرداد ماه بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی منظور خواهد شد
طی زمان باقیمانده تا پایان اردیبهشت تنها فعالیتهای در حال انجام پیمانکار منعکس میگردد

INSTRUMENT

#	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 100%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1404			
				تجمی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	1	2	3	4
مجموع			Calibration	79%	6%	6%	85%	100%	No	4,041	3,188	853	233	233				
1	IN	CDU	Calibration	84%	2%	2%	86%	100%	No	1,094	917	177	26	26				
2	IN	LPG	Calibration	86%	3%	3%	88%	100%	No	743	637	106	18	18				
3	IN	FWS	Calibration	93%	2%	2%	95%	0%	No	43	40	3	0	0				
4	IN	UTL	Calibration	76%	15%	15%	91%	100%	No	1,261	958	303	175	175				
5	IN	FLS	Calibration	88%	3%	3%	90%	100%	No	73	64	9	2	2				
6	IN	SWS	Calibration	82%	0%	0%	82%	100%	No	231	189	42	1	1				
7	IN	TNK	Calibration	64%	2%	2%	66%	100%	No	596	383	213	11	11				
مجموع			Main Cabling	94%	3%	3%	97%	100%	ML	199,173	187,769	11,404	6,099	6,099				
9	IN	TNK	Main Cabling	96%	0%	0%	96%	0%	ML	56,484	54,304	2,180	0	0				
10	IN	UTL	Main Cabling	100%	0%	0%	100%	0%	ML	45,186	44,966	220	0	0				
10	IN	C35	Main Cabling	63%	25%	25%	88%	100%	ML	24,223	15,219	9,004	6,099	6,099				
مجموع			Secondary Cabling	65%	1%	1%	66%	100%	ML	127,221	82,407	44,814	1,121	1,121				
11	IN	CDU	Secondary Cabling	99%	0%	0%	99%	0%	ML	31,127	30,877	250	0	0				
12	IN	LPG	Secondary Cabling	87%	4%	4%	91%	100%	ML	20,910	18,088	2,822	932	932				
13	IN	TNK	Secondary Cabling	1%	0%	0%	1%	0%	ML	41,740	552	41,188	0	0				
14	IN	UTL	Secondary Cabling	98%	2%	2%	100%	100%	ML	24,032	23,478	554	189	189				
مجموع			Internal Cabling	57%	0%	0%	57%	0%	ML	6,871	3,941	2,930	0	0				
17	IN	S35	Internal Cabling	68%	0%	0%	68%	0%	ML	685	465	220	0	0				
15	IN	C35	Internal Cabling	56%	0%	0%	56%	0%	ML	6,185	3,475	2,710	0	0				
مجموع			Earthing Cable Pulling	86%	3%	3%	89%	100%	ML	18,873	16,222	2,650	640	640				
16	IN	S55	Earthing Cable Pulling	0%	0%	0%	0%	0%	ML	600	0	600	0	0				
18	IN	CDU	Earthing Cable Pulling	92%	8%	8%	100%	100%	ML	4,289	3,963	326	326	326				
19	IN	LPG	Earthing Cable Pulling	92%	8%	8%	100%	100%	ML	3,212	2,967	245	245	245				
20	IN	TNK	Earthing Cable Pulling	4%	0%	0%	4%	0%	ML	1,500	67	1,433	0	0				
21	IN	UTL	Earthing Cable Pulling	99%	1%	1%	100%	100%	ML	5,335	5,323	12	62	62				
22	IN	FLS	Earthing Cable Pulling	94%	1%	1%	95%	100%	ML	600	566	35	7	7				
مجموع			Installation Supports	84%	1%	1%	85%	100%	KG	77,813	65,161	12,652	922	922				
36	IN	CDU	Installation Supports	94%	3%	3%	97%	100%	KG	18,000	16,881	1,119	316	316				
37	IN	LPG	Installation Supports	79%	2%	2%	80%	100%	KG	15,000	11,820	3,180	96	96				
38	IN	TNK	Installation Supports	29%	0%	0%	29%	100%	KG	10,000	2,897	7,103	46	46				
39	IN	INT	Installation Supports	97%	3%	3%	100%	100%	KG	474	462	12	12	12				
41	IN	UTL	Installation Supports	99%	1%	1%	100%	100%	KG	20,258	20,048	209	433	433				
42	IN	FLS	Installation Supports	99%	1%	1%	100%	100%	KG	2,384	2,366	18	18	18				
43	IN	SWS	Installation Supports	80%	0%	0%	80%	0%	KG	5,000	3,988	1,012	0	0				
مجموع			Installation of Conduit	57%	0%	0%	58%	100%	ML	8,806	5,057	3,749	42	42				
23	IN	CDU	Installation of Conduit	61%	0%	0%	61%	0%	ML	2,350	1,431	919	0	0				
24	IN	LPG	Installation of Conduit	90%	0%	0%	90%	100%	ML	1,037	931	106	3	3				
25	IN	TNK	Installation of Conduit	9%	0%	0%	9%	0%	ML	2,916	270	2,646	0	0				
26	IN	UTL	Installation of Conduit	95%	5%	5%	100%	100%	ML	1,600	1,521	79	39	39				
مجموع			Installation Tray, ladder	81%	1%	1%	81%	100%	ML	15,606	12,617	2,988	97	97				
27	IN	CDU	Secondary Tray	92%	2%	2%	94%	100%	ML	3,800	3,479	321	85	85				
28	IN	TNK	Secondary Tray	28%	0%	0%	28%	100%	ML	3,500	963	2,538	2	2				
29	IN	UTL	Secondary Tray	95%	2%	2%	97%	100%	ML	2,400	2,270	130	10	10				
مجموع			Covers Tray, ladder	17%	1%	1%	17%	100%	ML	14,734	2,479	12,255	86	86				
70	IN	TNK	Covers Primary Tray, ladder	0%	0%	0%	0%	0%	ML	995	0	995	0	0				
75	IN	INT	Covers Primary Tray, ladder	3%	0%	0%	3%	0%	ML	270	9	261	0	0				
76	IN	CDU	Covers Secondary Tray	0%	0%	0%	0%	0%	ML	3,800	18	3,782	0	0				
77	IN	LPG	Covers Secondary Tray	0%	0%	0%	0%	0%	ML	2,328	6	2,322	0	0				
78	IN	TNK	Covers Secondary Tray	0%	0%	0%	0%	0%	ML	3,500	0	3,500	0	0				
80	IN	UTL	Covers Secondary Tray	45%	11%	11%	57%	100%	ML	2,400	1,083	1,317	86	86				
81	IN	FLS	Covers Secondary Tray	54%	0%	0%	54%	0%	ML	171	93	78	0	0				
مجموع			Devices	67%	2%	2%	69%	100%	No	3,306	2,208	1,098	57	57				
30	IN	CDU	FIELD INSTRUMENTS	81%	1%	1%	82%	100%	No	823	668	155	8	8				
31	IN	LPG	FIELD INSTRUMENTS	85%	1%	1%	85%	0%	No	501	428	73	0	0				
32	IN	TNK	FIELD INSTRUMENTS	1%	3%	3%	3%	100%	No	289	2	287	8	8				
34	IN	UTL	FIELD INSTRUMENTS	80%	6%	6%	86%	100%	No	765	615	150	36	36				
35	IN	FLS	FIELD INSTRUMENTS	76%	3%	3%	79%	100%	No	63	48	15	2	2				
36	IN	SWS	FIELD INSTRUMENTS	76%	1%	1%	77%	100%	No	179	136	43	1	1				
37	IN	CDU	Inatallation F&G Detectors	86%	0%	0%	86%	0%	No	166	143	23	0	0				
38	IN	LPG	Inatallation F&G Detectors	17%	2%	2%	19%	100%	No	113	19	94	2	2				

INSTRUMENT

به دلیل عدم تخصیص حد نصاب نیروهای تعیین شده توسط پیمانکار ستاره تارازتا کنون ،
اکشن پلن ماهیانه از خرداد ماه بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی منظور خواهد شد
طی زمان باقیمانده تا پایان اردیبهشت تنها فعالیتهای در حال انجام پیمانکار منعکس میگردد


INSTRUMENT																		
#	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 100%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1404			
				تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	1	2	3	4
39	IN	TNK	Inatallation F&G Detectors	0%	0%	0%	0%	0%	No	236	0	236	0	0				
40	IN	UTL	Inatallation F&G Detectors	98%	0%	0%	98%	0%	No	41	40	1	0	0				
41	IN	SWS	Inatallation F&G Detectors	76%	0%	0%	76%	0%	No	25	19	6	0	0				
42	IN	UTL	Installation Analyzer	48%	0%	0%	48%	0%	No	27	13	14	0	0				
43	IN	SWS	Installation Analyzer	0%	0%	0%	0%	0%	No	1	0	1	0	0				
مجموع			Gland Installation	54%	1%	1%	55%	100%	No	7,109	3,826	3,283	100	100				
44	IN	CDU	Gland Of Cable Main	94%	0%	0%	94%	0%	No	99	93	6	0	0				
45	IN	LPG	Gland Of Cable Main	95%	0%	0%	95%	0%	No	96	91	5	0	0				
46	IN	TNK	Gland Of Cable Main	0%	0%	0%	0%	0%	No	174	0	174	0	0				
47	IN	UTL	Gland Of Cable Main	94%	0%	0%	94%	0%	No	235	222	13	0	0				
48	IN	FLS	Gland Of Cable Main	82%	0%	0%	82%	0%	No	17	14	3	0	0				
49	IN	SWS	Gland Of Cable Main	96%	0%	0%	96%	0%	No	25	24	1	0	0				
50	IN	CDU	Gland Of Cable Secondary	61%	5%	5%	66%	100%	No	1,456	896	560	69	69				
51	IN	LPG	Gland Of Cable Secondary	44%	0%	0%	44%	0%	No	1,296	572	724	0	0				
52	IN	TNK	Gland Of Cable Secondary	0%	0%	0%	0%	0%	No	1,392	0	1,392	0	0				
53	IN	FWS	Gland Of Cable Secondary	99%	0%	0%	99%	0%	No	80	79	1	0	0				
54	IN	UTL	Gland Of Cable Secondary	83%	4%	4%	87%	100%	No	1,810	1,503	307	26	26				
55	IN	FLS	Gland Of Cable Secondary	82%	0%	0%	82%	0%	No	112	92	20	0	0				
56	IN	SWS	Gland Of Cable Secondary	63%	12%	12%	76%	100%	No	296	219	77	5	5				
مجموع			Termination	48%	1%	1%	49%	100%	Set	8,039	3,882	4,157	64	64				
57	IN	S35	Termination	0%	0%	0%	0%	0%	Set	18	0	18	0	0				
58	IN	C35	Termination	0%	0%	0%	0%	0%	Set	210	0	210	0	0				
59	IN	CDU	Termination Cable Main	94%	0%	0%	94%	0%	Set	208	196	12	0	0				
60	IN	LPG	Termination Cable Main	95%	0%	0%	95%	0%	Set	208	197	11	0	0				
61	IN	TNK	Termination Cable Main	0%	0%	0%	0%	0%	Set	324	0	324	0	0				
62	IN	FWS	Termination Cable Main	98%	0%	0%	98%	0%	Set	44	43	1	0	0				
63	IN	UTL	Termination Cable Main	77%	0%	0%	77%	0%	Set	472	365	107	0	0				
64	IN	FLS	Termination Cable Main	58%	0%	0%	58%	0%	Set	36	21	15	0	0				
65	IN	SWS	Termination Cable Main	98%	0%	0%	98%	0%	Set	50	49	1	0	0				
66	IN	CDU	Termination Cable Secondary	45%	3%	3%	48%	100%	Set	1,456	657	799	37	37				
67	IN	LPG	Termination Cable Secondary	41%	0%	0%	41%	0%	Set	1,296	532	764	0	0				
68	IN	TNK	Termination Cable Secondary	0%	0%	0%	0%	0%	Set	1,408	0	1,408	0	0				
69	IN	FWS	Termination Cable Secondary	99%	0%	0%	99%	0%	Set	80	79	1	0	0				
70	IN	UTL	Termination Cable Secondary	80%	5%	5%	85%	100%	Set	1,820	1,460	360	27	27				
71	IN	FLS	Termination Cable Secondary	72%	0%	0%	72%	0%	Set	112	81	31	0	0				
72	IN	SWS	Termination Cable Secondary	68%	0%	0%	68%	0%	Set	296	201	95	0	0				
مجموع			Instrument Panel	80%	0%	0%	80%	0%	No	102	82	20	0	0				
73	IN	S35	Instrument Panel	97%	3%	3%	100%	0%	No	37	36	1	0	0				
74	IN	S55	Instrument Panel	77%	7%	7%	83%	0%	No	30	23	7	0	0				
75	IN	C35	Instrument Panel	66%	3%	3%	69%	0%	No	35	23	12	0	0				
مجموع			Junction Box	79%	4%	4%	83%	100%	No	496	393	103	18	18				
76	IN	CDU	Junction Box	76%	16%	16%	92%	100%	No	99	75	24	10	10				
78	IN	TNK	Junction Box	37%	12%	12%	50%	100%	No	135	60	75	7	7				
143	IN	FWS	Junction Box	83%	17%	17%	100%	100%	No	6	5	1	1	1				
79	IN	UTL	Junction Box	98%	0%	0%	98%	0%	No	136	133	3	0	0				
مجموع			Tubing	68%	0%	0%	68%	100%	ML	7,598	5,139	2,459	10	10				
80	IN	CDU	Tubing	72%	0%	0%	72%	0%	ML	2,404	1,734	670	0	0				
81	IN	LPG	Tubing	41%	0%	0%	41%	0%	ML	1,553	633	920	0	0				
82	IN	TNK	Tubing	0%	0%	0%	0%	0%	ML	548	0	548	0	0				
83	IN	UTL	Tubing	94%	1%	1%	95%	100%	ML	2,631	2,478	152	10	10				
84	IN	FLS	Tubing	0%	0%	0%	0%	0%	ML	119	0	119	0	0				
85	IN	SWS	Tubing	84%	0%	0%	84%	0%	ML	311	262	50	0	0				
مجموع			Air Pipe	52%	1%	1%	52%	100%	ML	5,965	3,079	2,886	32	32				
86	IN	CDU	Air Pipe	0%	0%	0%	0%	100%	ML	1,450	1,377	73	14	14				
87	IN	LPG	Air Pipe	0%	0%	0%	0%	0%	ML	2,500	120	2,380	0	0				
88	IN	TNK	Air Pipe	0%	0%	0%	0%	0%	ML	350	0	350	0	0				
107	IN	UTL	Air Pipe	0%	0%	0%	0%	100%	ML	1,219	1,136	83	18	18				
مجموع			Loop Test	0%	0%	0%	0%	0%	No	2,327	0	2,327	0	0				

PIPING AG


ردیف	UNIT	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			پن ماه	انجام شده ماه	1404									
			تجمعی تا ماه قبل	پن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون	41%		حجم کل	انجام شده	باقیمانده			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		فیت آب و جوش	97%	1%	0%	97%	41%	ID	367,817	355,577	12,240	2,172	881										
1	WWT	فیتاب و جوش	94%	6%	2%	96%	40%	ID	3,800	3,418	382	382	153										
2	EXP	خط نفتا (30 اینچ)	27%	0%	0%	27%	NO PLAN	ID	6,315	2,525	3,790	0	0										
3	EXP	خط نفتا (28 اینچ)	28%	0%	0%	28%	NO PLAN	ID	5,493	2,441	3,052	0	0										
4	EXP	خط برگشتی (8 اینچ)	34%	1%	1%	35%	44%	ID	2,884	1,207	1,677	45	20										
5	ROU	خط آب شیرین کن (6 اینچ)	53%	37%	18%	71%	38%	ID	1,654	725	929	780	300										
6	ROU	خط آب شیرین کن (8 اینچ)	49%	45%	20%	68%	42%	ID	2,151	1,064	1,087	965	408										
		هیدرونتست	87%	0.4%	0%	87%	40%	IM	762,989	665,742	97,247	2,685	1,071										
7	WWT	هیدرونتست	0%	100%	40%	40%	40%	IM	2,685	0	2,685	2,685	1,071										
8	EXP	خط نفتا (30 اینچ)	32%	0%	0%	32%	NO PLAN	IM	47,984	11,481	36,503	0	0										
9	EXP	خط نفتا (28 اینچ)	33%	0%	0%	33%	NO PLAN	IM	42,586	11,040	31,546	0	0										
10	EXP	خط برگشتی (8 اینچ)	34%	0%	0%	34%	NO PLAN	IM	12,629	3,307	9,322	0	0										
11	ROL	خط آب شیرین کن (6 اینچ)	43%	0%	0%	43%	NO PLAN	IM	8,035	753	7,282	0	0										
12	ROL	خط آب شیرین کن (8 اینچ)	40%	0%	0%	40%	NO PLAN	IM	10,504	1,062	9,442	0	0										
		رینستیت	87%	0.3%	0%	87%	0%	IM	762,989	663,582	36,503	2,096	0										
13	WWT	رینستیت	0%	50%	0%	0%	0%	IM	2,685	0	2,685	1,343	0										
14	EXP	خط نفتا (30 اینچ)	32%	0%	0%	32%	NO PLAN	IM	47,984	11,481	36,503	0	0										
15	EXP	خط نفتا (28 اینچ)	33%	0%	0%	33%	NO PLAN	IM	42,586	11,040	31,546	0	0										
16	EXP	خط برگشتی (8 اینچ)	34%	0%	0%	34%	NO PLAN	IM	12,629	3,307	9,322	0	0										
17	ROL	خط آب شیرین کن (6 اینچ)	0%	9%	0%	0%	0%	IM	8,035	0	8,035	753	0										
18	ROL	خط آب شیرین کن (8 اینچ)	10%	0%	0%	10%	NO PLAN	IM	10,504	1,062	9,442	0	0										

ردیف	یونیت	فعالیت	دیسپلین	پیشرفت				تحقق پلن ماه	تا پایان ماه گذشته				این ماه				1404			
				تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون		حجم کل	بروگرس + 1 انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	بروگرس + 1 انجام شده ماه	پلن ماه	بروگرس + 1 انجام شده ماه	1	2	3	4	
ICAPS TASKS			-	33%	2%	1%	34%	59%	41,552	14,918	+ 2,328	26,634	946	508	+ 4					
FWS				46%	2%	2%	48%	67%	990	456	+ 124	534	33	22	+ 0					
GPRS				88%	9%	6%	94%	69%	542	477	+ 14	65	51	35	+ 0					
CWS				28%	9%	2%	30%	20%	775	215	+ 53	560	70	14	+ 1					
CAS				35%	6%	3%	38%	47%	521	181	+ 34	340	32	15	+ 0					
NIS				56%	2%	0%	56%	0%	459	256	+ 56	203	9	0	+ 0					
WSU				32%	2%	1%	33%	50%	1,243	397	+ 90	846	26	13	+ 0					
FGS				45%	6%	2%	47%	30%	757	338	+ 33	419	53	16	+ 0					
PGU				0%	0%	0%	0%	0%	11	0	+ 0	11	0	0	+ 0					
S-35				46%	2%	2%	47%	95%	3,727	1,696	+ 396	2,031	65	62	+ 0					
C-35				7%	3%	2%	9%	55%	1,029	74	+ 3	955	31	17	+ 0					
FLS				40%	2%	1%	41%	46%	787	318	+ 27	469	13	6	+ 0					
S-55				20%	0%	0%	20%	50%	2,186	445	+ 169	1,741	2	1	+ 0					
SPU				33%	2%	2%	35%	62%	3,736	1,242	+ 134	2,494	109	68	+ 0					
TNK				21%	1%	0%	22%	22%	6,208	1,316	+ 154	4,892	88	19	+ 0					
SWS				41%	2%	1%	42%	49%	1,727	700	+ 126	1,027	35	17	+ 0					
CDU				37%	1%	1%	38%	57%	7,866	2,913	+ 395	4,953	93	53	+ 3					
CDS				24%	2%	2%	26%	86%	577	139	+ 33	438	14	12	+ 0					
LPGT				36%	2%	1%	37%	55%	5,798	2,105	+ 275	3,693	109	60	+ 0					
ADMIN				63%	9%	4%	67%	42%	304	193	+ 3	111	26	11	+ 0					
IBD				0%	0%	0%	0%	0%	0	0	+ 0	0	0	0	+ 0					
WORKSHOP				0%	0%	0%	0%	0%	22	0	+ 0	22	0	0	+ 0					
GENERAL				0%	0%	0%	0%	0%	211	0	+ 0	211	0	0	+ 0					
INT				79%	3%	3%	82%	100%	1,725	1,371	+ 207	354	47	47	+ 0					
WWT				0%	0%	0%	0%	0%	17	0	+ 0	17	0	0	+ 0					
WAREHOUSE				0%	0%	0%	0%	0%	39	0	+ 0	39	0	0	+ 0					
TNK GATEHOUSE				0%	0%	0%	0%	0%	9	0	+ 0	9	0	0	+ 0					
TEL BUILDING				41%	18%	14%	55%	75%	22	9	+ 0	13	4	3	+ 0					
ROU				0%	0%	0%	0%	0%	29	0	+ 0	29	0	0	+ 0					
LOADING ARM				0%	0%	0%	0%	0%	15	0	+ 0	15	0	0	+ 0					
LAB				43%	27%	14%	57%	52%	107	46	+ 2	61	29	15	+ 0					
CLINIC				33%	24%	0%	33%	0%	21	7	+ 0	14	5	0	+ 0					
FIRESTATION				36%	3%	3%	39%	100%	67	24	+ 0	43	2	2	+ 0					
GATE BUILDING				0%	0%	0%	0%	0%	25	0	+ 0	25	0	0	+ 0					

رند ICAPS ماهیانه



وضعیت کلی ICAPS به تفکیک دیسپلین



وضعیت پن اردیبهشت ماه ICAPS به تفکیک دیسپلین

