

پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

اکشن پلن بهمن ماه ۱۴۰۳



عملیات حفاری چاه آب شیرین کن



پیمانکار اصلی

شرکت سپهر مولد



کارفرما

شرکت آدیش جنوبی

شماره گزارش: ۱۲۷

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۱/۲۶


تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۱/۲۶

شماره صفحه	عنوان
2	پیشرفت پروژه در یک نگاه
3	نیروی انسانی پیمانکاران (مستقیم و غیر مستقیم)
4	اکشن پلن - 'وضعیت پیشرفت اکشن پلن ماهیانه در یک نگاه
5	اکشن پلن - 'جدول و برنامه رفع پانچ
6	اکشن پلن - 'گزارش ICAPS
7	اکشن پلن - 'جدول و برنامه راه اندازی (BOXUP)
8	اکشن پلن - 'جدول و برنامه راه اندازی (FINAL ALIGNMENT)
	اکشن پلن - 'برنامه زمانبندی فعالیت های باقیمانده و اکشن پلن ماهیانه CONSTRUCTION
9	مکانیکال
10	سیویل و معماری فاز 1
12	سیویل فاز 2 (NHT)
13	استراکچر فلزی
14	ایمنی و آشنشانی
15	بایپینگ UG
16	بایپینگ AG
17	رنگ، عایق و فایرپروف
18	برق
21	ابزار دقیق

محاسبات پیشرفت فاز یک

منحنی پیشرفت / پیشرفت به تفکیک یونیت ها / پیشرفت به تفکیک دیسیپلین ها

- منحنی پیشرفت - فاز یک


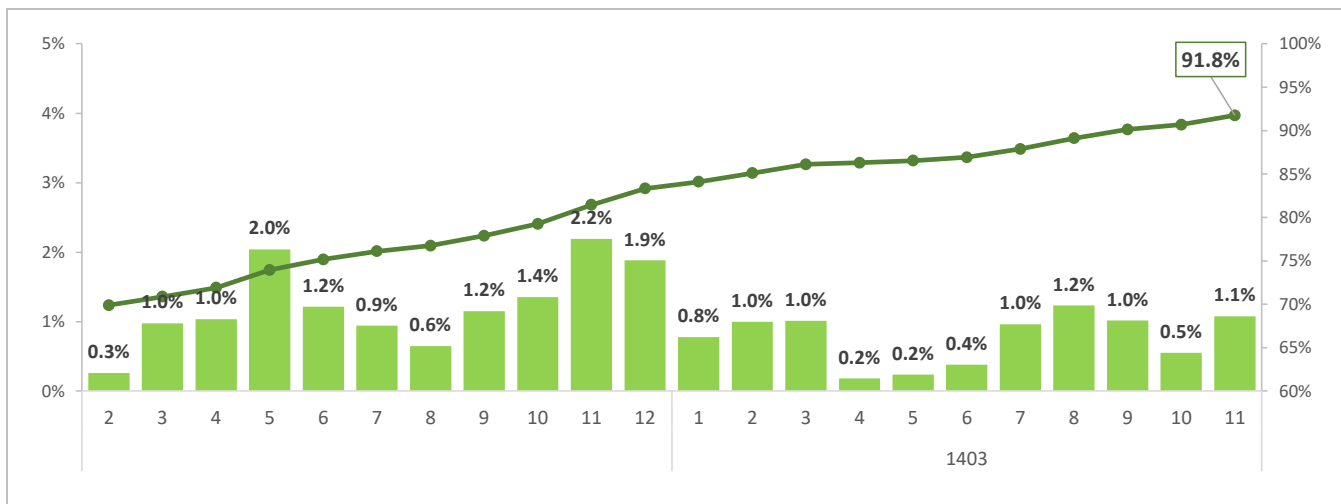


- پیشرفت فاز 1 - به تفکیک یونیت ها

یونیت	توضیحات	درصد وزنی	پیشرفت
CDU	CONDENSATE DISTILLATION	10.3%	98%
LPG	LIQUIFY PETROLEUM GAS	6.9%	96%
TNK	TANK FARM	26.0%	97%
INT	INTERCONNECTING	14.6%	90%
FWS	FIRE WATER	2.1%	97%
UTL	UTILITY	7.7%	99%
WWT	WASTE WATER TREATMENT	0.9%	74%
FLS	FLARE SYSTEM	2.6%	97%
SWS	SOUR WATER STRIPPER	2.3%	96%
PGU	POWER GENERATOR	1.7%	98%
GPR	GAS PRODUCTION	0.9%	94%
ROU	DESALINATION	1.1%	30.7%
EXP	EXPORT LINE	2.1%	20.5%
FLU	FEED LINE	0.4%	85.8%
S35	SUBSTATION 35	2.3%	95%
S55	SUBSTATION 55	0.9%	88%
NIB	NON INDUSTRIAL BLD	4.8%	98%
OIB	OTHER BUILDING	1.8%	90%
PCM	PRECOMMISSIONING	1.0%	31%
COM	COMMISSIONING	1.0%	8%
PLF	PUNCH LIST FIXING	0.2%	76%
SP/MO	SITE PREPARATION	8.2%	100%

- پیشرفت فاز 1 - به تفکیک دیسیپلین ها

دیسیپلین	توضیحات	درصد وزنی	پیشرفت
CV / AR	CIVIL	28.4%	92%
ST	STRUCTURE	4.4%	99%
ME	MECHANICAL	5.5%	92%
EL	ELECTRICAL	6%	87%
IN	INSTRUMENT	4%	76%
HV	HVAC	0.4%	95%
SA	SAFETY	0.5%	60%
TE	TELECOM	0.7%	8%
PI-UG	PIPING UG	3.6%	100%
PI-AG	PIPING AG	23%	96%
PA	PAINT	2.8%	94%
TNK	TANK	9.8%	100%
SP/MO	SITE PREPARATION	8.2%	100%
COM	PRECOM & COM.	2.2%	23.9%

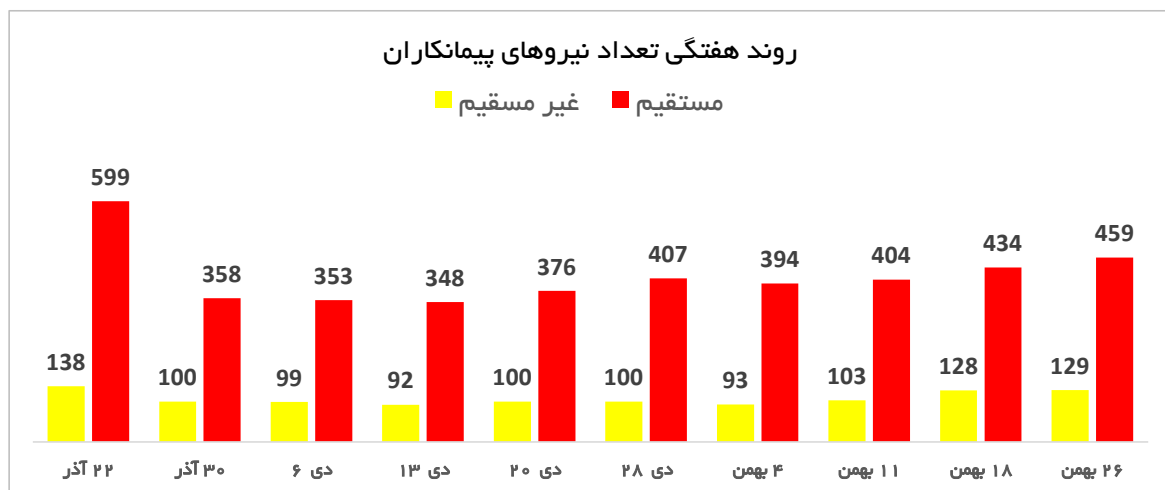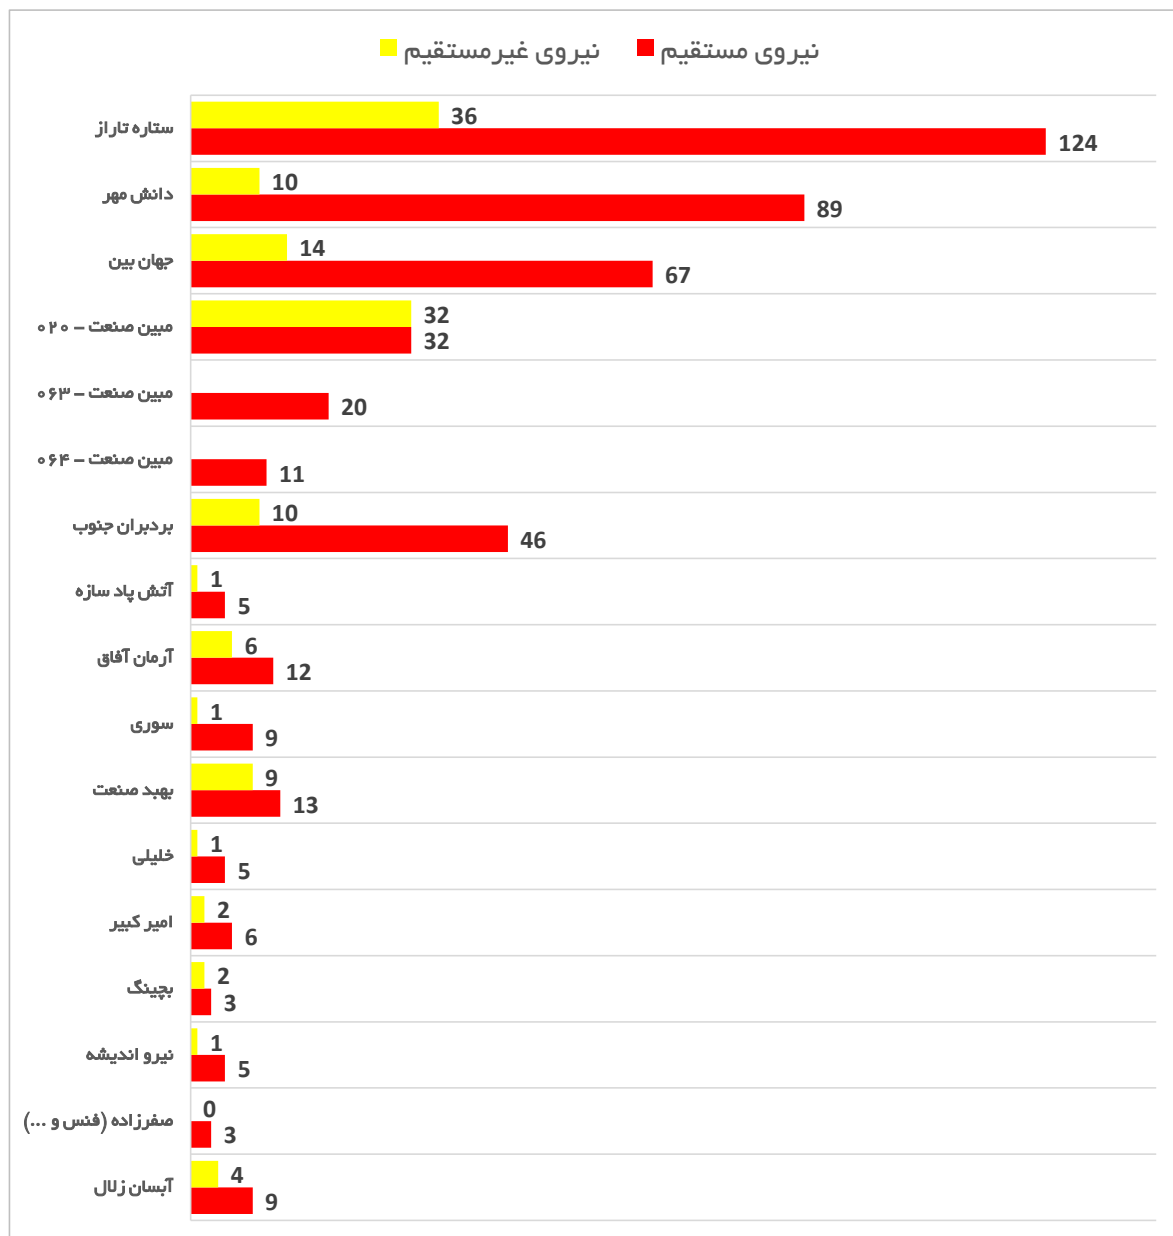

اکشن پلن فاز 1 - بهمن ماه 1403


وضعیت کلی

#	دیسپلین	درصد وزنی	پیشرفت جمعی تا پایان ماه قبل	پیشرفت برنامه ای این ماه	پیشرفت واقعی این ماه	انحراف این ماه از پلن قطعی	درصد تحقق این ماه از پلن قطعی	مقایسه پیشرفت برنامه و واقعی
		۱۰۰%	۹۱%	۱۰۵%	۱۰۱%	۰.۳%	۷۶%	
۱	رفع پانچ	۰.۲%	۶۶%	۰.۰۲%	۰.۰۲%	۰.۰۰%	۸۹%	0.02% 0.02%
۲	ICAPS	۱.۰%	۲۶%	۰.۰۵%	۰.۰۵%	۰.۰۱%	۸۸%	0.05% 0.05%
۳	راه اندازی	۱.۰%	۷%	۰.۰۳%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	۶۴%	0.03% 0.01%
۴	مکانیک / مخازن / تاسیسات	۱۵.۸%	۹۷%	۰.۱۳%	۰.۰۳%	۰.۱۱%	۲۱%	0.13% 0.03%
۵	سیویل / معماری	۲۸.۴%	۹۲%	۰.۳۵%	۰.۲۹%	۰.۰۶%	۸۴%	0.35% 0.29%
۶	استراکچر فلزی	۴.۴%	۹۹%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۸۲%	0.00% 0.00%
۷	ایمنی	۰.۵%	۵۶%	۰.۰۲%	۰.۰۲%	۰.۰۰%	۹۲%	0.02% 0.02%
۸	پایپینگ AG	۲۳.۱%	۹۶%	۰.۱۰%	۰.۰۶%	۰.۰۴%	۶۲%	0.10% 0.06%
۹	رنگ / عایق / فایرپروف	۲.۸%	۹۴%	۰.۰۶%	۰.۰۳%	۰.۰۳%	۴۶%	0.06% 0.03%
۱۰	الکتریکی	۶.۳%	۸۴%	۰.۲۲%	۰.۱۷%	۰.۰۵%	۷۷%	0.22% 0.17%
۱۱	ابزار دقیق	۳.۶%	۶۴%	۰.۴۷%	۰.۴۳%	۰.۰۰%	۹۱%	0.47% 0.43%
۱۲	تلکام	۰.۷%	۸%	۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	پلن نشده است	0.00% 0.00%
۱۳	تجهیز کارگاه و آماده سازی بستر	۸.۲%	۱۰۰%	۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	پلن نشده است	0.00% 0.00%


رفع پانچ

ردیف	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق پلن ماه	واحد	تا پایان ماه گذشته			پلن ماه	انجام شده ماه	1403				1404		توضیحات
			تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده			9	10	11	12	1	2	
PUNCH LIST FIXING			67%	10%	9%	76%	89%	UOM	22,430	16,488	5,942	2,480	2,202							
FWS			100%	0.0%	0%	100%	NO PLAN	UOM	653	651	2	0	1							
FW-RING			98%	0%	0%	98%	0%	UOM	255	250	5	1	0							
GPRS			99%	0%	0%	99%	NO PLAN	UOM	402	370	32	0	0							
CWS			77%	14%	8%	85%	59%	UOM	553	402	151	74	44							
CAS			65%	33%	23%	87%	69%	UOM	576	371	205	188	130							
NIS			88%	10%	10%	97%	96%	UOM	647	501	146	57	55							
WSU			83%	10%	10%	93%	97%	UOM	367	288	79	36	35							
FGS			94%	2%	5%	99%	213%	UOM	362	324	38	8	17							
SPU			78%	12%	7%	85%	58%	UOM	1,928	1,469	459	222	128							
FLS			87%	7%	6%	94%	89%	UOM	785	686	99	54	48							
PGU			73%	0%	10%	83%	NO PLAN	UOM	384	234	150	0	31							
S-35			8%	4%	0%	8%	0%	UOM	78	6	72	3	0							
C35			100%	0%	0%	100%	NO PLAN	UOM	2	2	0	0	0							
S-55			0%	4%	0%	0%	0%	UOM	24	0	24	1	0							
TNK			66%	14%	10%	76%	72%	UOM	4,314	2,827	1,487	582	417							
SWS			74%	11%	9%	83%	86%	UOM	1,133	837	296	123	106							
CDU			74%	12%	14%	88%	117%	UOM	4,203	3,109	1,094	502	586							
CDS			60%	25%	18%	78%	73%	UOM	60	36	24	15	11							
LPG			68%	14%	15%	83%	105%	UOM	3,277	2,207	1,070	451	472							
LPT			58%	24%	19%	77%	77%	UOM	509	296	213	124	95							
NIB			54%	2%	8%	62%	467%	UOM	168	90	78	3	14							
IBD			100%	0%	0%	100%	NO PLAN	UOM	19	19	0	0	0							
W-SHOP			63%	0%	0%	63%	NO PLAN	UOM	32	20	12	0	0							
GENERAL			70%	30%	0%	70%	0%	UOM	10	7	3	3	0							
INT			95%	2%	0%	95%	13%	UOM	914	866	48	16	2							
UTL			93%	2%	1%	94%	70%	UOM	555	501	54	10	7							
MDH			92%	8%	4%	96%	50%	UOM	26	24	2	2	1							
NHT			100%	0%	0%	100%	NO PLAN	UOM	24	24	0	0	0							
UG			58%	2%	2%	60%	100%	UOM	107	62	45	2	2							
ONT			29%	10%	0%	29%	0%	UOM	31	9	22	3	0							
WWT			0%	0%	0%	0%	NO PLAN	UOM	32	0	32	0	0							


وضعیت کلی رفع پانچ به تفکیک پیمانکاران



رند رفع پانچ ماهیانه



وضعیت پلن بهمن ماه رفع پانچ به تفکیک پیمانکاران




رند رفع پانچ شرکت جهان بین به تفکیک PART-1 و PART-2 (در بخش پانچ های ISSUE شده توسط تیم راه اندازی)

PART-1	تعداد کل انجام شده	کل پارت 1	GPRS	CWS	CAS	NIS	WSU	FGS	SPU	UTL	FLS	PGU
			78	119	192	219	184	42	439	0	119	0
		1392	78	79	168	217	159	38	375	0	109	0
PART-2	تعداد کل انجام شده	کل پارت 2	CDU	LPG	LPT	CDS	SWS	TNK	INT			
			702	625	157	18	281	758	0			
		2541	609	506	86	11	173	464	0			


گزارش ICAPS

ردیف	یونیت	فعالیت	دیسپلین	پیشرفت				تحقق پلن ماه	تا پایان ماه گذشته				این ماه			1403				1404		
				تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون		حجم کل	انجام شده	پروگرس + 1	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده ماه	پروگرس + 1	9	10	11	12	1	2	
ICAPS TASKS			-	26%	5%	5%	31%	88%	41,770	11,709	+	2,395	30,061	2,314	2,031	+	28					
FWS				37%	16%	7%	44%	47%	995	369	+	132	626	155	73	+	3					
GPRS				64%	17%	0%	65%	2%	591	355	+	9	236	101	2	+	0					
CWS				16%	24%	7%	23%	34%	736	132	+	56	604	179	61	+	0					
CAS				27%	3%	4%	31%	153%	519	140	+	41	379	15	23	+	0					
NIS				41%	9%	13%	54%	153%	459	187	+	60	272	40	61	+	0					
WSU				27%	5%	3%	29%	59%	1,228	328	+	101	900	58	34	+	2					
FGS				39%	2%	2%	41%	80%	748	293	+	36	455	15	12	+	0					
PGU				0%	0%	0%	0%	0%	11	0	+	0	11	0	0	+	0					
S-35				28%	21%	13%	41%	64%	3,809	1,057	+	376	2,752	789	504	+	4					
C-35				0%	7%	0%	0%	0%	1,029	0	+	0	1,029	76	0	+	0					
FLS				31%	7%	7%	39%	108%	811	246	+	30	565	53	57	+	0					
S-55				3%	2%	16%	19%	670%	2,266	66	+	142	2,200	53	355	+	5					
SPU				26%	3%	3%	30%	99%	3,752	984	+	176	2,768	127	126	+	8					
TNK				18%	2%	2%	21%	166%	6,218	1,133	+	160	5,085	94	156	+	0					
SWS				33%	3%	8%	40%	231%	1,727	564	+	127	1,163	58	134	+	0					
CDU				32%	2%	3%	34%	157%	7,877	2,481	+	389	5,396	143	225	+	6					
CDS				12%	6%	7%	19%	124%	577	71	+	32	506	33	41	+	0					
LPGT				32%	1%	2%	35%	153%	5,813	1,885	+	266	3,928	85	130	+	0					
ADMIN				28%	36%	0%	28%	1%	304	85	+	7	219	109	1	+	0					
IBD				0%	0%	0%	0%	0%	0	0	+	0	0	0	0	+	0					
WORKSHOP				0%	0%	0%	0%	0%	22	0	+	0	22	0	0	+	0					
GENERAL				0%	0%	0%	0%	0%	211	0	+	0	211	0	0	+	0					
INT				76%	2%	2%	79%	92%	1,716	1,333	+	255	383	39	36	+	0					
WWT				0%	0%	0%	0%	0%	17	0	+	0	17	0	0	+	0					
WAREHOUSE				0%	0%	0%	0%	0%	39	0	+	0	39	0	0	+	0					
TNK GATEHOUSE				0%	0%	0%	0%	0%	9	0	+	0	9	0	0	+	0					
TEL BUILDING				0%	55%	0%	0%	0%	22	0	+	0	22	12	0	+	0					
ROU				0%	0%	0%	0%	0%	29	0	+	0	29	0	0	+	0					
LOADING ARM				0%	0%	0%	0%	0%	15	0	+	0	15	0	0	+	0					
LAB				0%	43%	0%	0%	0%	107	0	+	0	107	46	0	+	0					
CLINIC				0%	48%	0%	0%	0%	21	0	+	0	21	10	0	+	0					
FIRESTATION				0%	36%	0%	0%	0%	67	0	+	0	67	24	0	+	0					
GATE BUILDING				0%	0%	0%	0%	0%	25	0	+	0	25	0	0	+	0					


رند ICAPS ماهیانه



وضعیت کلی ICAPS به تفکیک دیسپلین



وضعیت پلن بهمن ICAPS به تفکیک دیسپلین



راه اندازی

ردیف	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 54%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403					1404	
			تجمعی ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	9	10	11	12	1	2		
مجموع		باکس آپ تجهیزات	35%	18%	9%	45%	54%	QTY	392	139	253	69	37							
1	FGS	باکس آپ تجهیزات واحد FGS	63%	38%	0%	63%	0%	QTY	8	5	3	3	0							
2	SPU	باکس آپ تجهیزات واحد SPU	73%	10%	0%	73%	0%	QTY	40	29	11	4	0							
3	CDU	باکس آپ تجهیزات واحد CDU	22%	40%	30%	52%	75%	QTY	60	13	47	24	18							
4	CDS	باکس آپ تجهیزات واحد CDS	0%	67%	22%	22%	33%	QTY	9	0	9	6	2							
5	LPG/T	باکس آپ تجهیزات واحد LPG	0%	55%	33%	33%	61%	QTY	42	0	42	23	14							
6	SWS	باکس آپ تجهیزات واحد SWS	0%	64%	21%	21%	33%	QTY	14	0	14	9	3							
7	FWS	باکس آپ تجهیزات واحد FWS	100%	0%	0%	100%	DONE	QTY	7	7	0	0	0							
8	CAS	باکس آپ تجهیزات واحد CAS	100%	0%	0%	100%	DONE	QTY	19	19	0	0	0							
9	WSU	باکس آپ تجهیزات واحد WSU	88%	0%	0%	88%	NO PLAN	QTY	17	15	2	0	0							
10	NIS	باکس آپ تجهیزات واحد NIS	97%	0%	0%	97%	NO PLAN	QTY	36	35	1	0	0							
11	FLS	باکس آپ تجهیزات واحد FLS	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	5	0	5	0	0							
12	CWS	باکس آپ تجهیزات واحد CWS	80%	0%	0%	80%	NO PLAN	QTY	10	8	2	0	0							
13	GPR	باکس آپ تجهیزات واحد GPR	80%	0%	0%	80%	NO PLAN	QTY	10	8	2	0	0							
14	PGU	باکس آپ تجهیزات واحد PGU	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	4	0	4	0	0							
15	ROU	باکس آپ تجهیزات واحد ROU	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	79	0	79	0	0							
16	TNK	باکس آپ تجهیزات واحد TNK	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	32	0	32	0	0							

در بخش باکس آپ : تعداد 68 تجهیز در پلن اصلی و تعداد 22 تجهیز در پلن رزرو(مشروط به برطرف شدن موانع) میباشد.
تا بروزرسانی مورخ 1403/11/26 از تعداد 22 تجهیز رزرو ، 1 تجهیز مربوط به یونیت CDU به پلن اصلی اضافه گردید.

_ در بخش باکس آپ پلن اصلی 19 عدد بدلائل ذیل انجام نشد:

4 عدد هولد تریم لاین

6 عدد هولد ابزار دقیق و عدم تکمیل لاین

3 عدد هولد TQ

2 عدد هولد فیلتر المنت

2 عدد هولد TP CLEARNCE

1 عدد هولد کسری نقشه

1 عدد هولد عدم انجام رینستیت

راه اندازی

ردیف	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 73%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403				1404	
			تجمعی ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	9	10	11	12	1	2
مجموع		فاینال الاینمنت تجهیزات	18%	29%	21%	39%	73%	QTY	142	26	116	41	30						
1	CDU	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد CDU	0%	86%	86%	86%	100%	QTY	28	0	28	24	24						
2	SWS	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد SWS	0%	100%	0%	0%	0%	QTY	8	0	8	8	0						
3	WSU	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد WSU	79%	7%	7%	86%	100%	QTY	14	11	3	1	1						
4	CWS	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد CWS	13%	38%	0%	13%	0%	QTY	8	1	7	3	0						
5	SPU	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد SPU	15%	38%	38%	54%	100%	QTY	13	2	11	5	5						
6	FLS	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد FLS	100%	0%	0%	100%	NO PLAN	QTY	4	4	0	0	0						
7	FGS	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد FGS	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	2	0	2	0	0						
8	CAS	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد CAS	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	2	0	2	0	0						
9	LPGT	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد LPGT	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	19	0	19	0	0						
10	CDS	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد CDS	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	6	0	6	0	0						
11	TNK	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد TNK	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	QTY	30	0	30	0	0						
12	FWS	فاینال الاینمنت تجهیزات واحد FWS	100%	0%	0%	100%	DONE	QTY	8	8	0	0	0						

در بخش فاینال الاینمنت: تعداد 31 تجهیز در پلن اصلی و تعداد 16 تجهیز در پلن رزرو(مشروط به برطرف شدن موانع) میباشد.
تا پروژرسانی مورخ 1403/11/26 از تعداد 16 تجهیز رزرو ، 10 تجهیز به پلن اصلی اضافه گردید.

4 ا ک ش ن پ ل ن م ا ه ی ا ن ه + ب ر ن ا م ه ب ن د ی ف ع ا ل ی ت ه ا ی ب ا ق ی م ا ن د ه از CONSTRUCTION

مکانیکال (تجهیزات / مخازن / HVAC / تاسیسات)

مکانیکال:										وزن از کل: 15.8%					وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبل: 15.3%					وزن پلن ماهیانه: 0.1%					وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.03%				
#	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	توضیحات	1403				1404														
				تجمعی ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تاکنون	21%			9	10	11	12	1	2													
مجموع			مکانیکال	97.0%	0.8%	0.2%	97.2%	21%																					
1	ME	RO	تجهیزات آبشیرین کن	0%	50%	0%	0%	0%		منوط به انتخاب و استقرار پیمانکار																			
2	ME	TNK	مخزن 15A- نصب GUIDE POLE	0%	100%	50%	50%	50%																					
3	ME	TNK	مخزن 15B- نصب GUIDE POLE	0%	100%	50%	50%	50%																					
4	ME	TNK	مخزن 07- نصب GUIDE POLE	0%	100%	80%	80%	80%		نصب انجام شد - پس از تحویل به QC پروژگرس 100 خواهد شد																			
5	ME	TNK	مخزن 05- نصب GUIDE POLE	0%	100%	0%	0%	0%		با توجه به TQ، میبایست ابتدا مخزن آبگیری گردد. در حال آبگیری																			
6	ME	TNK	مخزن 10- نصب FLAME ARRESTER	0%	100%	0%	0%	0%		تامین و نصب مجدد توسط پیمانکار جهان بین																			
7	ME	S-35	HVAC ساب 35	99.6%	0.4%	0.0%	99.6%	0%		فعالیت های مهم باقیمانده: نصب 5 عدد تجهیز و کانکشن 2 عدد اکراست فن و کانکشن کابل های باقیمانده پلن کنترلی																			
8	ME	S-55	HVAC ساب 55	97%	3%	0%	97%	0%		فعالیت های مهم باقیمانده: کانکشن پلن کنترلی + نصب تجهیزات و کانکشن																			
9	ME	NIB	راه اندازی پکیج فاضلاب NIB	0%	100%	100%	100%	100%																					
10	ME	WSH	راه اندازی پکیج فاضلاب ورکشاپ	0%	100%	100%	100%	100%																					
11	ME	PGU	راه اندازی پکیج فاضلاب نیروگاه	0%	100%	100%	100%	100%																					
12	ME	WHB	راه اندازی پکیج فاضلاب انبار	0%	100%	100%	100%	100%																					
13	ME	S-65	لوله کشی و تاسیسات ساب 65	30%	0%	0%	30%	NO PLAN		در انتظار تامین متریال و تعیین پیمانکار																			
14	ME	RO	لوله کشی و تاسیسات ساختمان آبشیرین کن	15%	0%	0%	15%	NO PLAN		در انتظار تامین متریال و تعیین پیمانکار																			
15	ME	PGU	تعمیرات موتورهای نیروگاه	98%	0%	0%	98%	NO PLAN		منوط به تامین جکت و سیلندر موتور C پلن ی گردد.																			
16	ME	TNK	PK-520-07	69%	0%	0%	69%	NO PLAN		منوط به تامین نات و بولت و گسگت و اسپول وندوری																			
17	ME	PGU	برق و تاسیسات نیروگاه	91%	5%	5%	96%	100%		نصب IG انجام شد																			
18	ME	LBR	لوله کشی، تاسیسات و تهویه	0%	0%	0%	0%	NO PLAN		پس از اجرای ساختمان های ساب 65 و آب شیرین کن و تامین متریال از طرف کارفرما																			
19	ME	GHB	لوله کشی، تاسیسات و تهویه	0%	0%	0%	0%	NO PLAN		پس از اجرای ساختمان های ساب 65 و آب شیرین کن و تامین متریال از طرف کارفرما																			
20	ME	ALL	نصب سمبل کانکشن	0%	0%	0%	0%	NO PLAN		منوط به تامین سمپ کانکشن																			
21	ME	UTL	راه اندازی بویلر	0%	0%	0%	0%	NO PLAN		منوط به انتخاب پیمانکار یا تیم تخصصی																			
22	ME	UTL	نصب سایلنسر SI-522-01	0%	0%	0%	0%	NO PLAN		کسری میباشد																			
23	ME	UTL	نصب سایلنسر SI-522-02	0%	0%	0%	0%	NO PLAN		کسری میباشد																			
24	ME	NIB	تکمیل نصب آسانسور	90%	0%	0%	90%	NO PLAN		رفع پانچ باقی مانده است																			
25	ME	NIB	راه اندازی HVAC ساختمان NIB	0%	0%	0%	0%	NO PLAN		منوط به استقرار وندور (شرکت تهویه)																			
26	ME	NIB	راه اندازی HVAC ساب 35	0%	0%	0%	0%	NO PLAN		منوط به استقرار وندور (شرکت تهویه)																			
27	ME	NIB	راه اندازی HVAC ساب 55	0%	0%	0%	0%	NO PLAN		منوط به استقرار وندور (شرکت تهویه)																			
28	ME	EXP	تجهیزات خط صادرات	0%	0%	0%	0%	NO PLAN																					

این ردیف ها پلن نشده اند

تکمیل دیماص

HVAC

GUIDE POLE

سیویل:												وزن ازل: 28.4%				وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبل: 26.0%				وزن پلن ماهیانه: 0.35%				وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.29%			
توضیحات	1403				1404				تحقق	پیشرفت				فعالیت	یونیت	دیسپلین	#										
	9	10	11	12	1	2	تجمعی تا کتون	انجام شده ماه		پلن ماه	تجمعی تا ماه قبل																
								84%	92.6%	1.03%	1.2%	92%	مجموع														
جهت برق 2 مگا وات - لزوم دریافت مجوز حفاری داخل سایت بندر پارس								0%	0%	0%	30%	0%	برق 2 مگا وات حفاری ترنج کابل 2 مگا وات	-	CV	1											
تکمیل ساخت و نصب فونداسیون های های پیش نیاز برق 44 عدد در واحد TNK - ل 34 عدد نصب شد								77%	94%	4%	5%	90%	فونداسیون های پیش نیاز الکتریکال	ALL	CV	2											
گراول ریزی واحد INT								100%	65%	20%	20%	45%	گراول پیوینگ INT	INT	CV	3											
گراول ریزی واحد TNK - محدوده اسلیورهای A,B								100%	8%	8%	8%	0%	گراول پیوینگ TNK	TNK	CV	4											
(کل: 109 عدد / ساخته شده تا ماه قبل: 97 عدد) (پلن ماه: 11 عدد / انجام شده ماه: 11)								100%	100%	10%	10%	90%	ساخت فونداسیون های HOSE BOX	ALL	CV	5											
(کل: 109 عدد / نصب شده تا ماه قبل: 35 عدد) (پلن ماه: 29 عدد / انجام شده ماه: 29)								100%	58%	26%	26%	32%	نصب فونداسیون های HOSE BOX	ALL	CV	6											
اجرای 11 عدد فونداسیون ساپورت پایپینگ								10%	10%	10%	100%	0%	فونداسیون های ساپورت پایپینگ	TNK	CV	7											
اتصال دیچ شرق جاده به غرب جاده - انجام شد								100%	100%	100%	100%	0%	اتصال دیچ بله ای شرق ناک اوت درام	INT	CV	8											
تکمیل دیچ داخل دایک وال مخازن LPG								100%	100%	100%	100%	0%	دیچ داخل دایک وال مخازن LPG	LPG	CV	9											
پیوینگ شرق CDU								100%	100%	100%	100%	0%	پیوینگ شرق CDU	CDU	CV	10											
پیوینگ غرب S35								100%	100%	100%	100%	0%	پیوینگ غرب S35	S35	CV	11											
اطراف ساختمان آزمایشگاه و غرب لودینگ آرم								100%	99%	2%	2%	98%	پیوینگ TNK	TNK	CV	12											
دیچ ارتباطی بین یونیت ها - تکمیل دیچ فلر - دیچ ورودی گیت حراست - دیچ شرق ساب 35- دیچ شمال ورکشاپ(شمال و جنوب جاده)								97%	96%	6%	6%	90%	دیچ پیرامونی INT	INT	CV	13											
تکمیل لودینگ آرم - ورودی یونیت TNK (شمال غرب 06) - جنوب اسلیور 1 - غرب ساب 55								93%	98%	3%	3%	95%	دیچ پیرامونی TNK	TNK	CV	14											
(حجم کل: 970 مترطول / برنامه: 300 مترطول - انجام شده: 350)								117%	36%	36%	31%	0%	اجرای دیچ WWT	WWT	CV	15											
کرب وال شمال FWS								90%	100%	2%	2%	98%	کرب وال شمال پروسس	ALL	CV	16											
کرب وال اطراف پمپ های ناک اوت درام								100%	100%	100%	100%	0%	کرب وال محدوده ناک اوت درام	FLS	CV	17											
اجرای فنس محدوده لودینگ آرم								100%	20%	20%	20%	0%	فنس کشی محدوده لودینگ آرم	TNK	CV	18											
اجرای کامل فنس محدوده استک - پیش ساخت پایه ها انجام شد - حفاری ضلع غربی انجام شد								35%	35%	35%	100%	0%	فنس دائمی محدوده استک فلر	FLS	CV	19											
پیوینگ شرق انبار متریال								100%	100%	100%	100%	0%	پیوینگ شرق انبار متریال	INT	CV	20											
کل: 11252 / انجام شده تا ماه قبل: 9060 پلن این ماه: 2192 / انجام شده این ماه: 250								14%	83%	3%	20%	80%	ساخت SLAB	ALL	CV	21											
تکمیل درب(کل: 3 / انجام شده: 0 عدد) تکمیل پنجره(کل: 1 عدد / انجام شده: 0 عدد)								10%	10%	10%	100%	0%	نصب درب و پنجره ساب 65	WWT	CV	22											
کل: 90 مترمربع / انجام شده: 63								NO PLAN	70%	0%	0%	70%	پیوینگ پیاده رو ساختمان S-65	WWT	CV	23											
پلاستر اداری (کل: 410 مترمربع / انجام شده: 410 مترمربع) گچ اداری (کل: 326 مترمربع / انجام شده: 326 مترمربع)								100%	100%	10%	10%	90%	پلاستر و گچ آب شیرین کن	ROU	CV	24											
سرامیک دیوار(کل: 283 مترمربع / انجام شده ماه قبل: 136 / انجام شده این ماه: 147) سرامیک کف(کل: 89 / انجام شده: 89)								100%	100%	64%	64%	36%	کاشی و سرامیک آب شیرین کن	ROU	CV	25											
(کل: 201 مترمربع / انجام شده: 201 مترمربع)								100%	100%	100%	100%	0%	پیاده رو ساختمان آب شیرین کن	ROU	CV	26											
تکمیل درب (کل: 14 عدد / انجام شده: 0 عدد) تکمیل پنجره (کل: 18 عدد / انجام شده: 0 عدد)								5%	5%	5%	100%	0%	نصب درب و پنجره آب شیرین کن	ROU	CV	27											
پلاستر (کل: 500 مترمربع / انجام شده: 500 مترمربع) گچکاری (کل: 500 مترمربع / انجام شده: 250 مترمربع)								0%	75%	0%	25%	75%	ساختمان نگهداری - معماری (پلاستر و نازک کاری)	GHB	CV	28											
اجرای موزاییک پشت بام (کل: 165 مترمربع / انجام شده: 165 مترمربع)								100%	100%	25%	25%	75%	ساختمان نگهداری - موزاییک پشت بام	GHB	CV	29											
اجرای نما (کل: 285 مترمربع / انجام شده: 285 مترمربع)								100%	100%	20%	20%	80%	ساختمان نگهداری - اجرای نما	GHB	CV	30											
کاشی و سرامیک (کل: 200 مترمربع / انجام شده: 160 مترمربع)								80%	80%	80%	100%	0%	ساختمان نگهداری - کاشی و سرامیک	GHB	CV	31											
رنگ (کل: 450 مترمربع / انجام شده: 0 مترمربع)								0%	0%	0%	100%	0%	ساختمان نگهداری - رنگ	GHB	CV	32											
(پیوینگ داخل: ماه قبل انجام شد) (پیاده رو: کل: 127 مترمربع / انجام شده: 0 مترمربع)								0%	70%	0%	30%	70%	ساختمان نگهداری - پیوینگ و پیاده رو	GHB	CV	33											
تکمیل درب (کل: 10 عدد / انجام شده: 0 عدد) تکمیل پنجره (کل: 5 عدد / انجام شده: 0 عدد)								10%	10%	10%	100%	0%	ساختمان نگهداری - نصب درب و پنجره	GHB	CV	34											
سقف کاذب: (کل: 177 مترمربع / انجام شده: 0 مترمربع) کف کاذب (کل: 166 متر / انجام شده: 0 مترمربع)								NO PLAN	0%	0%	0%	0%	ساختمان نگهداری - سقف کاذب و کف کاذب	GHB	CV	35											

سیویل:																									وزن از کل: 28.4%					وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبل:					وزن پلن ماهیانه:					وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.29%				
1404	2	1	12	11	10	9	توضیحات					تحقق	پیشرفت				فعالیت	یونیت	دیسپلین	#																								
							تجمعی تا کنون	انجام شده ماه	پلن ماه	تجمعی تا ماه قبل																																		
											84%	92.6%	1.03%	1.2%	92%	سیویل	مجموع																											
											0%	50%	0%	100%	50%	ساختمان آزمایشگاه - معماری (پلاستر و نازک کاری)	LRB	CV	36																									
											100%	100%	100%	100%	0%	ساختمان آزمایشگاه - کاشی و سرامیک	LRB	CV	37																									
											100%	100%	100%	100%	0%	ساختمان آزمایشگاه - موزاییک پشت بام	LRB	CV	38																									
											85%	97%	17%	20%	80%	ساختمان آزمایشگاه - پیوینگ و پیاده رو	LRB	CV	39																									
											25%	25%	25%	100%	0%	ساختمان آزمایشگاه - نصب درب و پنجره	LRB	CV	40																									
											17%	8%	8%	50%	0%	حفر چاه	ROU	CV	41																									
											14%	69%	5%	36%	64%	دیوار بتنی WWT	WWT	CV	42																									
											71%	21%	21%	30%	0%	سنگ چینی فلر	FLS	CV	43																									
											60%	30%	30%	50%	0%	دیوار حائل ساختمان حراست	INT	CV	44																									
											100%	100%	100%	100%	0%	اجرای ترنج کابل شرقی جاده ناک اوت درام	INT	CV	45																									
											100%	100%	50%	50%	50%	داکت بانک شمال ساختمان حراست	INT	CV	46																									

	#	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق	توضیحات	1403				1404	
					تجمعی تا ماه قبل	پن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون	91%		9	10	11	12	1	2
پن بهمن ماه	1	CV	NHT	PK-502-02	50%	50%	50%	100%	100%							
	2	CV	NHT	V-502-26	0%	100%	100%	100%	100%	تکمیل شد						
	3	CV	NHT	V-502-16	0%	100%	100%	100%	100%	تکمیل شد						
	4	CV	NHT	F-502-02 A/B	0%	100%	30%	30%	30%	مگر انجام شد در حال آرماتوربندی						
	5	CV	NHT	F-502-01 A/B	0%	100%	100%	100%	100%	تکمیل شد						
	6	CV	NHT	F-502-03	0%	100%	0%	0%	0%							
نقشه AFC ندارد	7	CV	NHT	ANALYZER	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	پس از اجرای پیوینگ						
	8	CV	NHT	P-502-02 A/B	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
فونداسیون های اجرا شده	9	CV	NHT	P-502-03 A/B	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	10	CV	NHT	P-502-08	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	11	CV	NHT	P-502-09	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	12	CV	NHT	V-502-13	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	13	CV	NHT	V-502-25	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	14	CV	NHT	E-502-01 A/B/C/D/E/F	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	15	CV	NHT	E-502-02	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	16	CV	NHT	E-502-10	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	17	CV	NHT	E-502-12	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	18	CV	NHT	PF-502-01/02 (V-502-12)	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	19	CV	NHT	FUEL SKID (H-502-01)	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	20	CV	NHT	FUEL SKID (H-502-02)	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	21	CV	NHT	FUEL SKID (H-502-03)	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	22	CV	NHT	VALVE PIT	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	23	CV	NHT	P-502-01 A/B	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	24	CV	NHT	PK-502-01	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	25	CV	NHT	P-502-04 A/B	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	26	CV	NHT	P-502-05 A/B	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	27	CV	NHT	P-502-06 A/B	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	28	CV	NHT	V-502-12	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	29	CV	NHT	V-502-17	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	30	CV	NHT	SH-502-01	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	31	CV	NHT	C-502-01 A/B	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						
	32	CV	NHT	E-502-04 A/B	100%	0%	0%	100%	DONE	در ماههای گذشته انجام شده است						

استراکچر فلزی: وزن از کل: 4.41% وزن تحقق یافته پایان ماه قبل: 4.37% وزن پلن ماهیانه: 0.0% وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.00%																
#		دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت			تحقق	توضیحات				1403		1404	
					تجمعی تا کنون	انجام شده ماه	پلن ماه	تجمعی تا ماه قبل					82%	9	10	11
مجموع			استراکچر	99.0%	0.1%	0.1%	99.1%	82%								
1	ST	TNK	ساندویچ پانل مترینگ	0%	100%	90%	90%	90%	اجرای ساندویچ پانل شلتر مترینگ							
2	ST	S-35	تکمیل ساندویچ پنل ساب 35	91%	9%	0%	91%	0%	پس از تکمیل ساب 55							
3	ST	S-55	تکمیل ساندویچ پنل ساب 55	88%	12%	7%	95%	60%	در حال انجام							

این ردیف ها پلن نشده اند	4	ST	EXP	استراکچر پایپ بریج 01 خط صادرات	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	منوط به ساخت و ارسال به سایت					
	5	ST	ALL	گرتینگ دیچ	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	منوط به تامین					
	6	ST	EXP	استراکچر پایپ بریج 02 خط صادرات	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	منوط به ساخت و ارسال به سایت					
	7	ST	NHT	استراکچر بریج یونیت NHT	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	پلن نشده است - منوط به تامین					
	8	ST	ALL	شلتر توربو اکسپندر	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	پلن نشده است					

ایمنی															وزن از کل: 0.4%				وزن تحقق یافته پایان ماه قبل: 0.3%				وزن پلن ماهیانه: 0.02%				وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.0%			
#		دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق		توضیحات	1403				1404														
					تجمعی تا کمون	انجام شده ماه	پلن ماه	تجمعی تا ماه قبل	92%	9		10	11	12	1	2														
مجموع			ایمنی	59.0%	5.1%	4.6%	63.6%	-																						
1	SA	FWS	نصب تجهیزات ایمنی واحد FWS	0%	4%	0%	0%	0%		نصب HOSE BOX - کل : 2 / انجام شده تا ماه قبل: 0 پلن ماه: 1 / انجام شده ماه:--																				
2	SA	SWS	نصب تجهیزات ایمنی واحد SWS	0%	11%	11%	11%	100%		نصب HOSE BOX - کل : 2 / انجام شده تا ماه قبل: 0 پلن ماه: 2 / انجام شده ماه: 2																				
3	SA	INT	نصب تجهیزات ایمنی واحد INT	36%	20%	16%	52%	82%		نصب HOSE BOX - کل : 39 / انجام شده تا ماه قبل 14 پلن ماه: 11 / انجام شده ماه: 9																				
4	SA	TNK	نصب تجهیزات ایمنی واحد TNK	0%	23%	23%	23%	100%		نصب HOSE BOX - کل : 38 / انجام شده تا ماه قبل: 0 پلن ماه: 24 / انجام شده ماه: 24																				

از مجموع 39 عدد HOSE BOX پلن شده این ماه 36 عدد نصب شد.

پایینگ UG:

#	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403				1404	
				تجمی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	9	10	11	12	1	2
مجموع			فیتاب و جوش	20%	26%	5%	25%	20%	ID	9,900	1,987	7,913	2,600	527						
1	UG	NHT	فیتاب و جوش - شاپ	20%	26%	5%	25%	20%	ID	9,900	1,987	7,913	2,600	0						
2	UG	NHT	فیتاب و جوش - فیلد								96			527						

پایپینگ AG:		وزن از کل: 23.1%				وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبل:				وزن پلن ماهیانه: 0.1%				وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.1%			
واحد		تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403		1404		فعالیت		پیشرفت		تحقق 62%		
		باقیمانده	انجام شده	حجم کل	انجام شده	پلن ماه	تجمعی تا کنون	انجام شده ماه	پلن ماه	تجمعی تا ماه قبل							
ID	16,037	349,975	366,012	1,185	3,362	NO PLAN	95.9%	0.3%	0.9%	95.6%	فیتاب و جوش	مجموع	35%				
ID	214	10,786	11,000	116	144	81%	99%	1%	1%	98%	فیتاب و جوش	1 AG SWS	81%				
ID	112	960	1,072	28	84	33%	98%	1%	2%	97%	از منیفولد تا HOT TAP	2 AG FLU	33%				
ID	1,465	2,335	3,800	110	0	NO PLAN	77%	3%	0%	74%	فیتاب و جوش	3 AG WWT	NO PLAN				
ID	4,675	1,745	6,420	277	300	92%	31%	4%	5%	27%	خط نفتا (30 اینچ)	4 AG EXP	92%				
ID	4,284	1,745	6,029	238	532	45%	33%	4%	9%	29%	خط دیزل (28 اینچ)	5 AG EXP	45%				
ID	1,503	829	2,332	0	168	0%	36%	0%	7%	36%	خط برگشتی (8 اینچ)	6 AG EXP	0%				
ID	1,062	438	1,500	0	902	0%	29%	0%	60%	29%	خط آب شیرین کن (6 اینچ)	7 AG RO	0%				
ID	1,504	496	2,000	416	1,232	34%	44%	19%	62%	25%	خط آب شیرین کن (8 اینچ)	8 AG RO	34%				
IM	53,212	671,295	724,507	398	463	86%	92.7%	0.1%	0.1%	92.7%	هیدروست	مجموع	86%				
IM	126	167,365	167,491	0	0	NO PLAN	100%	0%	0%	100%	هیدروست	9 AG TNK	NO PLAN				
IM	319	56,041	56,360	254	319	80%	100%	0%	1%	99%	هیدروست	10 AG UTL	80%				
IM	375	10,168	10,543	144	144	100%	98%	2%	2%	96%	هیدروست	11 AG SWS	100%				
IM	17,559	11,481	29,040	0	0	NO PLAN	40%	0%	0%	40%	خط صادرات (نفتا)	12 AG EXP	NO PLAN				
IM	16,064	11,040	27,104	0	0	NO PLAN	41%	0%	0%	41%	خط صادرات (دیزل)	13 AG EXP	NO PLAN				
IM	4,437	3,307	7,744	0	0	NO PLAN	43%	0%	0%	43%	خط صادرات (برگشتی)	14 AG EXP	NO PLAN				
IM	5,000	3,760	8,760	0	0	NO PLAN	43%	0%	0%	43%	آب شیرین کن (6 اینچ)	15 AG RO	NO PLAN				
IM	5,500	3,680	9,180	0	0	NO PLAN	40%	0%	0%	40%	آب شیرین کن (8 اینچ)	16 AG RO	NO PLAN				
IM	3,822	0	3,822	0	0	NO PLAN	0%	0%	0%	0%	هیدروست	17 AG WWT	NO PLAN				
IM	64,832	659,762	724,594	2,562	3,688	69%	91.4%	0.4%	0.5%	91.1%	رینستیمنت	مجموع	69%				
IM	3,266	164,225	167,491	2,562	2,917	88%	100%	2%	2%	98%	رینستیمنت	18 AG TNK	88%				
IM	850	55,510	56,360	0	523	0%	98%	0%	1%	98%	رینستیمنت	19 AG UTL	0%				
IM	517	10,026	10,543	0	248	0%	95%	0%	2%	95%	رینستیمنت	20 AG SWS	0%				
IM	17,559	11,481	29,040	0	0	NO PLAN	40%	0%	0%	40%	خط صادرات (نفتا)	21 AG EXP	NO PLAN				
IM	16,064	11,040	27,104	0	0	NO PLAN	41%	0%	0%	41%	خط صادرات (دیزل)	22 AG EXP	NO PLAN				
IM	4,437	3,307	7,744	0	0	NO PLAN	43%	0%	0%	43%	خط صادرات (برگشتی)	23 AG EXP	NO PLAN				
IM	8,760	0	8,760	0	0	NO PLAN	0%	0%	0%	0%	آب شیرین کن (6 اینچ)	24 AG RO	NO PLAN				
IM	9,180	0	9,180	0	0	NO PLAN	0%	0%	0%	0%	آب شیرین کن (8 اینچ)	25 AG RO	NO PLAN				
IM	3,822	0	3,822	0	0	NO PLAN	0%	0%	0%	0%	رینستیمنت	26 AG WWT	NO PLAN				

_ در بخش رینستیت واحد SWS: از "517 باقیمانده: 284 هولد بولت و گسکت، "144 هولد استرینر، "87 هولد فول کولپینگ و "2 هولد کنترل ولو میباشد.

رنگ و عایق																	وزن از کل: 2.8%						وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبل: 2.6%						وزن پلن ماهیانه: 0.1%						وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.0%					
#		دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 46%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403				1404																				
					تجمی تا کنون	انجام شده ماه	پلن ماه	تجمی تا ماه قبل			انجام شده	پلن ماه	انجام شده	9	10	11	12	1	2																					
مجموع				عایق تجهیزات	-	-	-	-	38%	M2	4,910	4,684	226	226	87																									
1	PA	UTL	عایق تجهیزات	83%	17%	0%	83%	0%	M2	796	657	139	139	0																										
2	PA	SWS	عایق تجهیزات	70%	30%	30%	100%	100%	M2	290	203	87	87	87																										
مجموع				عایق پایپینگ	94%	5%	0%	94%	5%	M2	28,634	26,862	1,772	1,394	74																									
3	PA	TNK	عایق پایپینگ	63%	37%	3%	66%	8%	M2	2,457	1,574	883	883	74																										
4	PA	INT	عایق پایپینگ	98%	2%	0%	98%	0%	M2	8,033	7,721	312	312	0																										
5	PA	UTL	عایق پایپینگ	93%	3%	0%	93%	0%	M2	3,841	3,442	399	199	0																										
6	PA	RO	عایق پایپینگ خطوط آب شیرین کن	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	M2	-	-	-	-	-																										
7	PA	EXP	عایق پایپینگ خط صادرات (نفثا)	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	M2	-	-	-	-	-																										
8	PA	EXP	عایق پایپینگ خط صادرات (دیزل)	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	M2	-	-	-	-	-																										
9	PA	EXP	عایق پایپینگ خط صادرات (برگشتی)	0%	0%	0%	0%	NO PLAN	M2	-	-	-	-	-																										
مجموع				فایرپروف	-	-	-	-	69%	M2	13,019	11,407	1,611	1,611	1,113																									
10	PA	LPG	فایرپروف	100%	0%	0%	100%	DONE	M2	3,600	3,600	0	0	0																										
11	PA	CDU	فایرپروف	86%	14%	7%	93%	46%	M2	6,700	5,772	928	928	430																										
12	PA	TNK	فایرپروف	62%	38%	38%	100%	100%	M2	1,790	1,107	683	683	683																										
مجموع				لترینگ	-	-	-	-	68%	No.	10,024	8,028	1,996	1,996	1,358																									
13	PA	ALL	لترینگ	80%	18%	12%	92%	68%	No.	10,024	8,028	1,996	1,996	1,358																										

0.2%			وزن تحقق یافته ماهیانه:			0.22%			وزن پلن ماهیانه:			5.3%			وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبل:			6.3%:			وزن از کل:			برق		
#	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 77%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403			1404								
				تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	9	10	11	12	1	2						
مجموع			اجرای کابل - برق 2MW	23.5%	76.5%	23.3%	46.8%	31%	ML	3,000	705	2,295	2,295	700												
1	EL	INT	اجرای کابل - برق 2MW	24%	77%	23%	47%	31%	ML	3,000	705	2,295	2,295	700												
مجموع			آماده سازی شبکه 11 کیلو ولت جهت انتقال از ساختمان نیروگاه به پست 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
2	EL	PGU	تکمیل شبکه ارت و تست میزان مقاومت	0%	100%	95%	95%	95%	-	-	-	-	-	-												
3	EL	PGU	نصب ترانس 11/33 کیلو ولت	0%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-												
4	EL	PGU	نصب باکس NGR	0%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-												
5	EL	PGU	نصب تابلو INCOMING	0%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-												
6	EL	PGU	اجرای سرکابل‌های 11 و 33 کیلو ولت و انجام تست HIPOT	0%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-												
7	EL	PGU	انجام تست کابل‌های کنترل و اجرای سریندی	0%	100%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-												
8	EL	PGU	انجام کلیه تست های مربوط به ترانس 11/33 کیلو ولت همراه با NGR و OIL BREAK DONE	0%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-												
9	EL	PGU	انجام کلیه تست های مربوط به INCOMING	0%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-												
10	EL	PGU	منبع تغذیه (110VDC - 18A)	0%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-												
11	EL	S35	تکمیل شبکه ارت و تست میزان مقاومت	0%	100%	98%	98%	98%	-	-	-	-	-	-												
12	EL	S35	اجرای سرکابل‌های 11 و 6 کیلو ولت و انجام تست HIPOT	0%	100%	70%	70%	70%	-	-	-	-	-	-												
13	EL	S35	انجام کلیه تست های مربوط به ترانسهای 11 و 6 کیلو ولت همراه با NGR و OIL BREAK DONE	50%	50%	50%	100%	100%	-	-	-	-	-	-												
14	EL	S35	انجام کلیه تست های مربوط به ترانسهای 0.4 و 6 کیلو ولت همراه با OIL BREAK DONE مرتبط به S35-01A,S35-02A,S35-04A	50%	50%	50%	100%	100%	-	-	-	-	-	-												
15	EL	S35	انجام کلیه تست های مربوط به تابلوهای 6 کیلو ولت و انجام صحت عملکرد	100%	0%	0%	100%	DONE	-	-	-	-	-	-												
16	EL	S35	انجام تست کابل‌های کنترل و اجرای سریندی و FUNCTION TEST در میدا و مقصد LV و HV	100%	0%	0%	100%	DONE	-	-	-	-	-	-												
17	EL	S35	انجام کلیه تست های مربوط به تابلوهای 0.4 کیلو ولت و انجام صحت عملکرد	100%	0%	0%	100%	DONE	-	-	-	-	-	-												
18	EL	S35	منبع تغذیه (110VDC - 20A)	0%	100%	0%	0%	0%	-	در انتظار تامین			-	-												
19	EL	S35	دسترسی به SETTING TABLE مربوط به PROTECTION RELAY های تابلوهای 0.4 و 6 کیلو ولت	0%	100%	0%	0%	0%	-	محقق نشده است			-	-												
مجموع			Control Cable	94.9%	5.1%	5.0%	99.8%	98%	ML	111,784	106,049	5,735	5,655	5,548												
20	EL	S35	Control Cable	100%	0%	0%	100%	100%	ML	39,737	39,513	224	144	144												
21	EL	S55	Control Cable	36.9%	63%	62%	99%	99%	ML	3,762	1,387	2,375	2,375	2,344												
22	EL	TNK	Control Cable	93.8%	6%	6%	100%	100%	ML	17,229	15,953	1,276	1,276	1,276												
23	EL	UTL	Control Cable	89%	11%	10%	100%	96%	ML	17,185	15,325	1,860	1,860	1,784												
مجموع			LV Cable	94.7%	4.4%	4.4%	99.0%	100%	ML	124,717	118,066	6,651	5,440	5,440												
24	EL	S35	LV Cable	98%	0%	0%	98%	0%	ML	9,219	9,071	148	0	0												
25	EL	S55	LV Cable	12%	73%	75%	87%	100%	ML	3,339	343	2,996	2,546	2,546												
26	EL	TNK	LV Cable	88%	11%	11%	99%	100%	ML	26,833	23,656	3,177	2,894	2,894												
27	EL	UTL	LV Cable	99%	0%	0%	99%	0%	ML	26,616	26,286	330	0	0												
مجموع			MV + HV Cable	98.2%	1.8%	0.4%	98.6%	24%	ML	24,842	24,397	445	445	106												
28	EL	S55	MV Cable	95%	5%	1%	96%	24%	ML	8,766	8,321	445	445	106												
مجموع			Lighting Cable	94.6%	2.6%	2.6%	97.2%	100%	ML	87,088	82,387	4,702	2,302	2,302												
29	EL	TNK	Lighting Cable	86%	8%	8%	95%	100%	ML	22,851	19,746	3,105	1,880	1,880												
30	EL	INT	Lighting Cable	92%	2%	2%	94%	100%	ML	20,695	19,099	1,597	422	422												
مجموع			Heat Tracing Cabling	26.6%	0.0%	0.0%	26.6%	0%	ML	9,178	2,442	6,736	0	0												
31	EL	LPG	Heat Tracing Cabling	24%	0%	0%	24%	0%	ML	3,748	912	2,836	0	0												
32	EL	TNK	Heat Tracing Cabling	0%	0%	0%	0%	0%	ML	1,320	0	1,320	0	0												
33	EL	INT	Heat Tracing Cabling	37%	0%	0%	37%	0%	ML	3,955	1,455	2,500	0	0												
34	EL	SWS	Heat Tracing Cabling	48%	0%	0%	48%	0%	ML	155	75	80	0	0												
مجموع			Earthing Cable	78.8%	4.4%	2.5%	81.4%	58%	ML	9,377	7,391	1,985	409	239												
35	EL	S35	Earthing Cable	96%	4%	4%	100%	100%	ML	1,017	944	74	74	74												
36	EL	S55	Earthing Cable	0.0%	0%	0%	0%	0%	ML	300	0	300	0	0												
37	EL	CDU	Earthing Cable	88.2%	2%	3%	91%	100%	ML	1,420	1,252	168	42	42												
38	EL	LPG	Earthing Cable	88.9%	2%	1%	90%	55%	ML	1,347	1,197	150	30	17												
39	EL	TNK	Earthing Cable	27.5%	0%	0%	27%	0%	ML	800	220	580	0	0												
40	EL	INT	Earthing Cable	74.2%	7%	0%	74%	0%	ML	2,350	1,744	606	156	0												
41	EL	UTL	Earthing Cable	96.7%	3%	3%	100%	100%	ML	1,130	1,030	100	100	100												
42	EL	FLS	Earthing Cable	100.0%	0%	0%	100%	100%	ML	438	431	7	7	7												

برق			وزن از کل: 6.3%		وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبل: 5.3%		وزن پلن ماهیانه: 0.22%		وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.2%											
#	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 77%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403				1404	
				تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	9	10	11	12	1	2
مجموع			Installation Supports	94.7%	2.4%	2.1%	96.8%	87%	KG	65,896	62,425	3,471	1,600	1,392						
مجموع			Installation of Conduit	97.6%	1.3%	1.1%	98.7%	85%	ML	25,729	25,109	620	346	295						
43	EL	CDU	Conduit	100%	0%	0%	100%	100%	ML	6,365	6,344	22	22	22						
44	EL	LPG	Conduit	100%	0%	0%	100%	100%	ML	3,964	3,958	5	5	5						
45	EL	TNK	Conduit	92%	4%	4%	96%	100%	ML	5,150	4,713	437	223	223						
46	EL	INT	Conduit	96%	2%	1%	97%	36%	ML	3,350	3,209	141	81	29						
47	EL	UTL	Conduit	100%	0%	0%	100%	100%	ML	4,389	4,374	16	16	16						
مجموع			Installation Tray, ladder	96.8%	1.5%	1.5%	98.2%	100%	ML	9,793	9,476	318	143	142						
48	EL	S55	Primary Tray, ladder	54.5%	45%	45%	100%	100%	ML	67	12	55	55	55						
49	EL	TNK	Primary Tray, ladder	100%	0%	0%	100%	100%	ML	1,727	1,719	8	8	8						
50	EL	UTL	Primary Tray, ladder	73%	0%	0%	73%	0%	ML	463	337	126	0	0						
51	EL	TNK	Secondary Tray	92%	1%	3%	95%	100%	ML	1,000	920	80	31	31						
52	EL	INT	Secondary Tray	61.2%	39%	39%	100%	100%	ML	85	47	37	37	37						
53	EL	UTL	Secondary Tray	94%	6%	5%	99%	88%	ML	95	89	6	6	5						
54	EL	FLS	Secondary Tray	84.2%	16%	16%	100%	100%	ML	19	16	3	3	3						
مجموع			Covers OF Tray, ladder	43.6%	5.7%	5.7%	49.3%	99%	ML	9,024	3,937	5,087	518	514						
مجموع			Lighting Poles	97.2%	0.6%	0.6%	97.8%	100%	No	1,379	1,340	39	8	8						
55	EL	TNK	Lighting Pole Of Flourescent	97%	2%	2%	98%	100%	No	307	297	10	5	5						
56	EL	TNK	Lighting Pole Of Street	93.3%	0%	0%	93%	0%	No	45	42	3	0	0						
57	EL	INT	Lighting Pole Of Street	84%	2%	2%	86%	100%	No	167	141	26	3	3						
مجموع			Fixture Lighting	96.8%	0.9%	0.9%	97.7%	100%	No	2,451	2,372	79	22	22						
58	EL	TNK	Fixture Of Street Lighting	93%	0%	0%	93%	0%	No	214	198	16	0	0						
59	EL	INT	Fixture Of Street Lighting	87%	1%	1%	88%	100%	No	240	209	31	3	3						
60	EL	TNK	Fixture Of Flourescent	95%	1%	1%	97%	100%	No	383	365	18	5	5						
61	EL	INT	Fixture Of Flourescent	96%	4%	4%	100%	100%	No	287	275	12	12	12						
62	EL	FLS	Fixture Of Flourescent	96%	4%	4%	100%	100%	No	54	52	2	2	2						
مجموع			JB Installation	94.8%	1.3%	1.2%	96.0%	92%	No	940	891	49	12	11						
63	EL	TNK	JB Of Street Lighting	97%	0%	0%	97%	0%	No	180	174	6	0	0						
64	EL	INT	JB Of Street Lighting	86%	1%	1%	87%	100%	No	201	172	29	3	3						
65	EL	TNK	JB Of Flourescent Fixture	93%	3%	2%	95%	75%	No	126	117	9	4	3						
66	EL	INT	JB Of Flourescent Fixture	86%	14%	14%	100%	100%	No	29	25	4	4	4						
67	EL	FLS	JB Of Flourescent Fixture	93%	7%	7%	100%	100%	No	15	14	1	1	1						
مجموع			Lighting Socket	98.5%	1.5%	1.5%	100.0%	100%	No	66	65	1	1	1						
68	EL	TNK	Lighting Socket	93%	7%	7%	100%	100%	No	14	13	1	1	1						
مجموع			Gland Installation	88.9%	4.0%	4.0%	92.8%	99%	No	8,654	7,690	964	347	345						
69	EL	S35	Power Gland	87%	1%	1%	88%	100%	No	466	404	62	4	4						
70	EL	S55	Power Gland	16.9%	2.4%	3.0%	19.9%	100%	No	166	28	138	5	5						
71	EL	LPG	Power Gland	96%	2%	2%	98%	100%	No	97	93	4	2	2						
72	EL	TNK	Power Gland	39.3%	34.3%	38.0%	77.3%	100%	No	300	118	182	114	114						
73	EL	INT	Power Gland	58.8%	0.0%	0.0%	58.8%	0%	No	17	10	7	0	0						
74	EL	UTL	Power Gland	80%	7%	9%	89%	91%	No	294	236	58	22	20						
75	EL	FLS	Power Gland	91.7%	0.0%	0.0%	91.7%	0%	No	36	33	3	0	0						
76	EL	SWS	Power Gland	94%	0%	0%	94%	0%	No	33	31	2	0	0						
77	EL	GPR	Power Gland	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0%	No	4	1	3	0	0						
78	EL	LPG	Lighting Gland	99%	1%	1%	100%	100%	No	970	959	11	7	7						
79	EL	UTL	Lighting Gland	95.2%	0.0%	0.1%	95.3%	100%	No	850	809	41	1	1						
80	EL	INT	Lighting Gland	87%	3%	3%	90%	100%	No	1,514	1,323	191	44	44						
81	EL	TNK	Lighting Gland	86%	8%	8%	94%	100%	No	1,826	1,564	262	148	148						
مجموع			Termination	85.9%	5.2%	5.1%	91.0%	98%	Set	10,084	8,665	1,419	527	515						
82	EL	S35	Termination Of Power	92%	2%	1%	93%	75%	Set	1,013	934	79	16	12						
83	EL	S55	Termination Of Power	3%	4%	5%	8%	100%	Set	384	12	372	18	18						
84	EL	C35	Termination Of Power	99%	1%	1%	100%	100%	Set	128	127	1	1	1						
85	EL	LPG	Termination Of Power	97%	2%	2%	98%	100%	Set	176	170	6	3	3						
86	EL	TNK	Termination Of Power	24%	56%	55%	80%	98%	Set	406	98	308	229	225						
87	EL	INT	Termination Of Power	77%	0%	0%	77%	0%	Set	30	23	7	0	0						
88	EL	FWS	Termination Of Power	99%	0%	0%	99%	0%	Set	94	93	1	0	0						
89	EL	UTL	Termination Of Power	74%	6%	7%	81%	82%	Set	363	269	94	22	18						
90	EL	FLS	Termination Of Power	84%	9%	9%	93%	100%	Set	44	37	7	4	4						
91	EL	SWS	Termination Of Power	97%	0%	0%	97%	0%	Set	62	60	2	0	0						
92	EL	GPR	Termination Of Power	25%	0%	0%	25%	0%	Set	4	1	3	0	0						

برق			وزن از کل: 6.3%				وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبل: 5.3%				وزن پلن ماهیانه: 0.22%				وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.2%					
#	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 77%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403				1404	
				تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	9	10	11	12	1	2
93	EL	S55	Termination Kit	43%	57%	57%	100%	100%	Set	28	12	16	16	16						
94	EL	TNK	Termination Kit	0%	100%	100%	100%	100%	Set	18	0	18	18	18						
95	EL	LPG	Termination Of Lighting	99%	1%	1%	100%	100%	Set	970	959	11	7	7						
96	EL	UTL	Termination Of Lighting	95%	0%	0%	95%	100%	Set	850	809	41	1	1						
97	EL	INT	Termination Of Lighting	87%	3%	3%	90%	100%	Set	1,514	1,323	191	44	44						
98	EL	TNK	Termination Of Lighting	86%	8%	8%	94%	100%	Set	1,826	1,564	262	148	148						
مجموع			Installation of Generator	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	No	3	0	3	0	0						
مجموع			Local Control Station	90.9%	9.1%	9.1%	100.0%	100%	No	176	160	16	16	16						
99	EL	UTL	Local Control Station	53%	47%	47%	100%	100%	No	34	18	16	16	16						
مجموع			Panels	95.3%	0.9%	0.9%	96.2%	100%	No.	319	304	15	3	3						
100	EL	S55	UPS,DC charger and Battries	50%	50%	50%	100%	100%	No.	4	2	2	2	2						
101	EL	LPG	Electrical Panel	86%	0%	0%	86%	0%	No.	7	6	1	0	0						
102	EL	TNK	Electrical Panel	71%	4%	4%	75%	100%	No.	24	17	7	1	1						
103	EL	INT	Electrical Panel	77%	0%	0%	77%	0%	No.	13	10	3	0	0						
104	EL	UTL	Electrical Panel	88%	0%	0%	88%	0%	No.	17	15	2	0	0						
مجموع			Motor Free Run	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	No	272	0	272	0	0						
مجموع			Other	75.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0%	-	400	300	100	0	0						
105	EL	ALL	Trans Cathodic & AC BOX	57%	43%	22%	79%	51%	ترانس (تعداد کل 29 عدد / انجام شده 26 عدد) AC BOX (تعداد کل 29 عدد / انجام شده 19 عدد)											
106	EL	WWT	SUPPORTS	41%	0%	0%	41%	0%	KG	1,150	470	680	0	0						
107	EL	WWT	PRIMARY TRAY, LADDER	38%	0%	0%	38%	0%	ML	249	94	155	0	0						
108	EL	WWT	CONDUIT	0%	0%	0%	0%	0%	ML	603		603	0	0						
109	EL	WWT	LIGHTING FIXTURE	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	24		24	0	0						
110	EL	WWT	CABLE LIGHTING	0%	0%	0%	0%	0%	ML	605		605	0	0						
111	EL	WWT	CABLE POWER	0%	0%	0%	0%	0%	ML	7,170		7,170	0	0						
112	EL	WWT	JUNCTION BOX	23%	0%	0%	23%	0%	PCS	13	3	10	0	0						
113	EL	WWT	LOCAL CONTROL STATION	61%	0%	0%	61%	0%	PCS	38	23	15	0	0						
114	EL	WWT	LV SWITCHGEAR PANEL	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	4	0	4	0	0						
115	EL	WWT	ELECTRICAL PANEL HEATER	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	1	0	1	0	0						
116	EL	WWT	CABLE EARTH	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	970	0	970	0	0						
117	EL	WWT	GLAND	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	152		152	0	0						
118	EL	WWT	TERMINATION	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	152		152	0	0						

ابزار دقیق																											وزن از کل: 3.6%						وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبل: 2.3%						وزن پلن ماهیانه: 0.47%						وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.4%					
#	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 91%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403				1404																															
				تجمی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	9	10	11	12	1	2																														
مجموع			Calibration	73.3%	11.7%	11.7%	85.0%	100%	No	3,708	2,717	991	434	434																																				
1	IN	CDU	Calibration	78%	5%	10%	88%	100%	No	1,021	795	226	101	101																																				
2	IN	LPG	Calibration	77%	4%	10%	88%	100%	No	727	563	164	74	74																																				
3	IN	FWS	Calibration	88%	10%	10%	98%	100%	No	41	36	5	4	4																																				
4	IN	UTL	Calibration	81%	6%	9%	90%	100%	No	1,048	854	194	91	91																																				
5	IN	FLS	Calibration	83%	4%	6%	89%	100%	No	72	60	12	4	4																																				
6	IN	SWS	Calibration	80%	2%	2%	82%	100%	No	226	181	45	5	5																																				
7	IN	TNK	Calibration	40%	24%	27%	67%	100%	No	573	228	345	155	155																																				
مجموع			Main Cabling	86.5%	12.1%	9.8%	96.3%	81%	ML	190,067	164,412	25,655	23,082	18,696																																				
8	IN	TNK	Main Cabling	82%	13%	13%	95%	100%	ML	56,870	46,870	10,000	7,427	7,427																																				
9	IN	UTL	Main Cabling	100%	0%	0%	100%	0%	ML	44,987	44,767	220	220	0																																				
10	IN	C35	Main Cabling	0%	100%	73%	73%	73%	ML	15,435	0	15,435	15,435	11,269																																				
مجموع			Secondary Cabling	61.0%	9.4%	9.1%	70.0%	96%	ML	105,626	64,393	41,233	9,945	9,570																																				
11	IN	CDU	Secondary Cabling	78%	22%	22%	100%	100%	ML	24,959	18,169	6,790	6,790	6,790																																				
12	IN	LPG	Secondary Cabling	80%	2%	2%	81%	100%	ML	19,664	15,669	3,995	300	300																																				
13	IN	TNK	Secondary Cabling	0%	1%	1%	1%	100%	ML	27,980	0	27,980	387	387																																				
14	IN	FWS	Secondary Cabling	98%	2%	2%	100%	100%	ML	1,472	1,372	100	100	100																																				
15	IN	UTL	Secondary Cabling	93%	7%	7%	100%	100%	ML	23,467	21,599	1,868	1,868	1,868																																				
16	IN	FLS	Secondary Cabling	72%	28%	7%	79%	25%	ML	1,796	1,296	500	500	125																																				
مجموع			Internal Cabling	0.0%	100.0%	60.5%	60.5%	60%	ML	6,516	1	6,515	6,515	3,940																																				
17	IN	S35	Internal Cabling	0%	100%	100%	100%	100%	ML	465	0	465	465	465																																				
18	IN	C35	Internal Cabling	0%	100%	57%	57%	57%	ML	6,050	0	6,050	6,050	3,475																																				
مجموع			Earthing Cable Pulling	48.5%	37.7%	37.3%	85.7%	99%	ML	17,232	8,350	8,882	6,489	6,420																																				
19	IN	S35	Earthing Cable Pulling	14%	74%	86%	100%	100%	ML	1,534	101	1,433	1,133	1,133																																				
20	IN	S55	Earthing Cable Pulling	0%	0%	0%	0%	0%	ML	600	0	600	0	0																																				
21	IN	C35	Earthing Cable Pulling	8%	35%	82%	90%	89%	ML	700	55	645	645	576																																				
22	IN	CDU	Earthing Cable Pulling	56%	44%	44%	100%	100%	ML	2,709	670	2,039	2,039	2,039																																				
23	IN	LPG	Earthing Cable Pulling	78%	13%	20%	98%	100%	ML	2,700	2,099	601	541	541																																				
24	IN	TNK	Earthing Cable Pulling	4%	0%	0%	4%	0%	ML	1,500	67	1,433	0	0																																				
25	IN	INT	Earthing Cable Pulling	44%	56%	56%	100%	100%	ML	216	44	172	172	172																																				
26	IN	FWS	Earthing Cable Pulling	66%	34%	34%	100%	100%	ML	318	197	121	121	121																																				
27	IN	UTL	Earthing Cable Pulling	90%	10%	10%	100%	100%	ML	5,184	3,562	1,622	1,622	1,622																																				
28		FLS	Earthing Cable Pulling	100%	0%	0%	100%	100%	ML	511	402	109	109	109																																				
29	IN	SWS	Earthing Cable Pulling	100%	0%	0%	100%	100%	ML	1,261	1,154	107	107	107																																				
مجموع			Installation Supports	70.2%	13.6%	11.3%	81.5%	83%	KG	76,091	53,422	22,669	10,367	8,615																																				
مجموع			Installation of Conduit	49.3%	18.8%	5.2%	54.5%	28%	ML	8,736	4,308	4,427	1,643	455																																				
30	IN	CDU	Installation of Conduit	41%	59%	9%	50%	16%	ML	2,350	954	1,396	1,396	220																																				
31	IN	LPG	Installation of Conduit	89%	0%	0%	89%	100%	ML	1,037	925	112	3	3																																				
32	IN	TNK	Installation of Conduit	8%	0%	0%	8%	0%	ML	2,916	241	2,675	0	0																																				
33	IN	UTL	Installation of Conduit	88%	12%	12%	100%	100%	ML	1,521	1,307	214	214	214																																				
34	IN	FLS	Installation of Conduit	95%	5%	1%	96%	17%	ML	300	286	14	14	3																																				
35	IN	SWS	Installation of Conduit	97%	3%	3%	100%	100%	ML	416	401	16	16	16																																				
مجموع			Installation Tray, ladder	76.2%	7.3%	3.8%	80.0%	51%	ML	15,474	11,795	3,679	1,129	581																																				
36	IN	S35	Primary Tray, ladder	80%	20%	20%	100%	100%	ML	60	48	12	12	12																																				
37	IN	S55	Primary Tray, ladder	0%	100%	100%	100%	100%	ML	33	0	33	33	33																																				
38	IN	TNK	Primary Tray, ladder	98%	2%	2%	100%	100%	ML	995	971	24	24	24																																				
39	IN	UTL	Primary Tray, ladder	90%	10%	10%	100%	100%	ML	179	161	18	18	18																																				
40	IN	INT	Primary Tray, ladder	97%	3%	3%	100%	100%	ML	270	261	9	9	9																																				
41	IN	CDU	Secondary Tray	79%	21%	7%	86%	32%	ML	3,800	2,991	809	809	260																																				
42	IN	TNK	Secondary Tray	27%	0%	0%	27%	0%	ML	3,500	957	2,544	0	0																																				
43	IN	UTL	Secondary Tray	93%	7%	7%	100%	100%	ML	2,262	2,043	219	219	219																																				
44	IN	FLS	Secondary Tray	100%	0%	0%	100%	100%	ML	171	165	6	6	6																																				
45	IN	SWS	Secondary Tray	99%	0%	0%	99%	0%	ML	900	893	7	0	0																																				
مجموع			Covers Tray, ladder	9.6%	15.7%	4.2%	13.7%	27%	ML	14,502	1,385	13,117	2,272	604																																				
مجموع			Devices	30.1%	30.4%	27.9%	58.0%	92%	No	3,328	1,002	2,326	1,011	928																																				
46	IN	CDU	FIELD INSTRUMENTS	35%	33%	41%	76%	100%	No	829	287	542	341	341																																				
47	IN	LPG	FIELD INSTRUMENTS	17%	39%	49%	66%	100%	No	508	86	422	247	247																																				
48	IN	TNK	FIELD INSTRUMENTS	0%	0%	0%	0%	0%	No	333	0	333	0	0																																				
49	IN	FWS	FIELD INSTRUMENTS	83%	11%	11%	94%	100%	No	35	29	6	4	4																																				

وزن از کل: 3.6%										وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبل: 2.3%										وزن پلن ماهیانه: 0.47%										وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.4%									
#		دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403				1404																			
					تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			91%	حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	9	10	11	12	1	2																	
50	IN	UTL	FIELD INSTRUMENTS	57%	15%	19%	76%	100%	No	754	443	311	131	131																									
51	IN	FLS	FIELD INSTRUMENTS	3%	0%	59%	62%	100%	No	63	2	61	37	37																									
52	IN	SWS	FIELD INSTRUMENTS	54%	18%	19%	73%	100%	No	177	96	81	33	33																									
53	IN	CDU	Inatallation F&G Detectors	0%	100%	52%	52%	52%	No	155	0	155	155	80																									
54	IN	LPG	Inatallation F&G Detectors	0%	0%	0%	0%	0%	No	106	0	106	0	0																									
55	IN	TNK	Inatallation F&G Detectors	0%	0%	0%	0%	0%	No	236	0	236	0	0																									
56	IN	UTL	Inatallation F&G Detectors	32%	68%	66%	98%	96%	No	41	13	28	28	27																									
57	IN	FLS	Inatallation F&G Detectors	57%	43%	43%	100%	100%	No	21	12	9	9	9																									
58	IN	SWS	Inatallation F&G Detectors	16%	84%	60%	76%	71%	No	25	4	21	21	15																									
59	IN	CDU	Installation Analyzer	80%	20%	20%	100%	100%	No	5	4	1	1	1																									
60	IN	UTL	Installation Analyzer	36%	18%	18%	55%	75%	No	22	9	13	4	3																									
61	IN	SWS	Installation Analyzer	0%	0%	0%	0%	0%	No	1	0	1	0	0																									
مجموع				43.2%	18.6%	13.1%	56.2%	70%	No	6,466	2,791	3,675	1,205	844																									
62	IN	CDU	Gland Of Cable Main	90%	2%	2%	92%	100%	No	99	89	10	2	2																									
63	IN	LPG	Gland Of Cable Main	95%	0%	0%	95%	0%	No	96	91	5	0	0																									
64	IN	TNK	Gland Of Cable Main	0%	0%	0%	0%	0%	No	159	0	159	0	0																									
65	IN	UTL	Gland Of Cable Main	89%	8%	6%	95%	83%	No	231	205	26	18	15																									
66	IN	FLS	Gland Of Cable Main	71%	29%	12%	82%	40%	No	17	12	5	5	2																									
67	IN	SWS	Gland Of Cable Main	96%	0%	0%	96%	0%	No	25	24	1	0	0																									
68	IN	CDU	Gland Of Cable Secondary	29%	48%	24%	54%	51%	No	1,400	411	989	670	341																									
69	IN	LPG	Gland Of Cable Secondary	43%	1%	1%	44%	100%	No	1,300	564	736	8	8																									
70	IN	TNK	Gland Of Cable Secondary	0%	0%	0%	0%	0%	No	1,140	0	1,140	0	0																									
71	IN	FWS	Gland Of Cable Secondary	95%	5%	5%	100%	100%	No	79	69	10	10	10																									
72	IN	UTL	Gland Of Cable Secondary	72%	26%	28%	100%	100%	No	1,507	1,032	475	443	443																									
73	IN	FLS	Gland Of Cable Secondary	48%	21%	21%	69%	100%	No	112	54	58	23	23																									
74	IN	SWS	Gland Of Cable Secondary	78%	9%	0%	78%	0%	No	280	219	61	26	0																									
مجموع				39.0%	21.5%	13.4%	52.4%	62%	Set	7,109	2,771	4,338	1,531	954																									
75	IN	C35	Termination	0%	100%	0%	0%	0%	Set	1	0	1	1	0																									
76	IN	CDU	Termination Cable Main	91%	1%	1%	92%	67%	Set	208	190	18	3	2																									
77	IN	LPG	Termination Cable Main	95%	0%	0%	95%	0%	Set	208	197	11	0	0																									
78	IN	TNK	Termination Cable Main	0%	0%	0%	0%	0%	Set	318	0	318	0	0																									
79	IN	FWS	Termination Cable Main	98%	0%	0%	98%	0%	Set	44	43	1	0	0																									
80	IN	UTL	Termination Cable Main	72%	12%	8%	80%	69%	Set	436	312	124	52	36																									
81	IN	FLS	Termination Cable Main	59%	41%	3%	62%	7%	Set	34	20	14	14	1																									
82	IN	SWS	Termination Cable Main	98%	0%	0%	98%	0%	Set	50	49	1	0	0																									
83	IN	CDU	Termination Cable Secondary	23%	55%	19%	41%	34%	Set	1,400	315	1,085	766	264																									
84	IN	LPG	Termination Cable Secondary	41%	0%	0%	41%	100%	Set	1,300	530	770	2	2																									
85	IN	TNK	Termination Cable Secondary	0%	0%	0%	0%	0%	Set	1,140	0	1,140	0	0																									
86	IN	FWS	Termination Cable Secondary	95%	5%	5%	100%	100%	Set	79	69	10	10	10																									
87	IN	UTL	Termination Cable Secondary	56%	38%	42%	98%	100%	Set	1,497	801	696	607	607																									
88	IN	FLS	Termination Cable Secondary	43%	23%	23%	66%	100%	Set	112	48	64	26	26																									
89	IN	SWS	Termination Cable Secondary	70%	18%	2%	72%	12%	Set	280	195	85	50	6																									
مجموع				78.4%	0.0%	0.0%	78.4%	0%	No	102	80	22	0	0																									
90	IN	S35	Instrument Panel	97%	0%	0%	97%	0%	No	37	36	1	0	0																									
91	IN	S55	Instrument Panel	77%	0%	0%	77%	0%	No	30	23	7	0	0																									
92	IN	C35	Instrument Panel	60%	0%	0%	60%	0%	No	35	21	14	0	0																									
مجموع				64.7%	14.0%	11.4%	76.2%	82%	No	516	334	182	72	59																									
93	IN	CDU	Junction Box	80%	14%	0%	80%	0%	No	94	75	19	13	0																									
94	IN	LPG	Junction Box	98%	0%	0%	98%	0%	No	88	86	2	0	0																									
95	IN	TNK	Junction Box	9%	29%	29%	37%	100%	No	161	14	147	46	46																									
96	IN	UTL	Junction Box	90%	9%	9%	99%	100%	No	134	121	13	12	12																									
97	IN	FLS	Junction Box	90%	10%	10%	100%	100%	No	10	9	1	1	1																									
مجموع				39.0%	34.7%	24.7%	63.7%	71%	ML	6,973	2,718	4,254	2,419	1,723																									
98	IN	CDU	Tubing	30%	52%	36%	66%	69%	ML	1,684	513	1,171	871	598																									
99	IN	LPG	Tubing	0%	0%	47%	47%	100%	ML	1,331	0	1,331	624	624																									
100	IN	TNK	Tubing	0%	0%	0%	0%	0%	ML	548	0	548	0	0																									
101	IN	UTL	Tubing	65%	28%	17%	82%	61%	ML	2,930	1,911	1,019	822	501																									
102	IN	FLS	Tubing	0%	48%	0%	0%	0%	ML	119	0	119	57	0																									
103	IN	SWS	Tubing	80%	14%	0%	80%	0%	ML	329	262	67	46	0																									
مجموع				30.6%	24.2%	15.6%	46.2%	64%	ML	6,232	1,909	4,323	1,510	969																									
104	IN	CDU	Air Pipe	0%	0%	0%	0%	58%	ML	1,800	506	1,294	1,294	753																									

X

ابزار دقیق																				
وزن از کل: 3.6%					وزن تحقق یافته تا پایان ماه قبیل: 2.3%					وزن پلن ماهیانه: 0.47%					وزن تحقق یافته ماهیانه: 0.4%					
#	دیسپلین	یونیت	فعالیت	پیشرفت				تحقق 91%	واحد	تا پایان ماه گذشته			این ماه		1403				1404	
				تجمعی تا ماه قبل	پلن ماه	انجام شده ماه	تجمعی تا کنون			حجم کل	انجام شده	باقیمانده	پلن ماه	انجام شده	9	10	11	12	1	2
105	IN	LPG	Air Pipe	0%	0%	0%	0%	100%	ML	2,500	0	2,500	37	37						
106	IN	TNK	Air Pipe	0%	0%	0%	0%	0%	ML	350	0	350	0	0						
107	IN	UTL	Air Pipe	0%	0%	0%	0%	100%	ML	1,136	1,086	50	50	50						
108	IN	FLS	Air Pipe	0%	0%	0%	0%	100%	ML	129	0	129	129	129						
مجموع			Loop Test	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	No	2,343	0	2,343	0	0						
مجموع			Other	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	-	200	0	200	0	0						
109	IN	WWT	SUPPORTS	27%	0%	0%	27%	0%	KG	300	80	220	0	0						
110	IN	WWT	PRIMARY TRAY, LADDER	37%	0%	0%	37%	0%	ML	95	35	60	0	0						
111	IN	WWT	CONDUIT	0%	0%	0%	0%	0%	ML	520	0	520	0	0						
112	IN	WWT	DEVICES	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	71	0	71	0	0						
113	IN	WWT	JUNCTION BOX INSTRUMENT	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	14	0	14	0	0						
114	IN	WWT	TUBING	0%	0%	0%	0%	0%	ML	165	0	165	0	0						
115	IN	WWT	PANEL INSTRUMENT	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	1	0	1	0	0						
116	IN	WWT	CABLE EARTH	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	2,450	0	2,450	0	0						
117	IN	WWT	CABLE INSTRUMENT	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	1,767	0	1,767	0	0						
118	IN	WWT	GLAND	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	112	0	112	0	0						
119	IN	WWT	TERMINATION	0%	0%	0%	0%	0%	PCS	168	0	168	0	0						
